



MINISTERIO
DE HACIENDA

GOBIERNO
DE COSTA RICA

Programas/Proyectos de Inversión financiados con recursos externos

Gobierno Central y Resto del Sector Público

Al 31 de marzo 2025

Dirección General de Gestión de Deuda Pública



Contenido

- I. Situación general de la Cartera de créditos de inversión pública
- II. Situación de la Cartera de créditos por Organismo Ejecutor
 - Cartera CONAVI
 - Cartera MOPT
 - Cartera AyA
 - Cartera SENARA
 - Cartera ICE
 - Cartera MH
 - Cartera MJP
 - Cartera COMEX
 - Cartera CNE

I. Situación general de la cartera de créditos de inversión pública

Cartera de créditos de inversión pública en ejecución



Monto de la cartera: US\$ 3.717,5 millones

Total de créditos: 19

Total de programas/proyectos: 18



Ejecutores más representativos: MOPT, CNE, AyA, SENARA, CONAVI.

Acreedores: BCIE, BID, BIRF, EXIMBANK, y JICA.



Características de la deuda:


- 13 créditos: Gobierno es Deudor.
- 6 créditos: Instituciones son deudoras (en 2 de ellos el Gobierno es Garante).



Plazo Promedio de Ejecución de la Cartera^{1/}: 96,2 meses


^{1/} Para efectos del cálculo del plazo promedio de ejecución de la cartera, se considera la fecha límite de desembolsos o su expectativa de conclusión según el avance vigente del programa/proyecto.

Participación de los acreedores y préstamos externos al I trimestre 2025

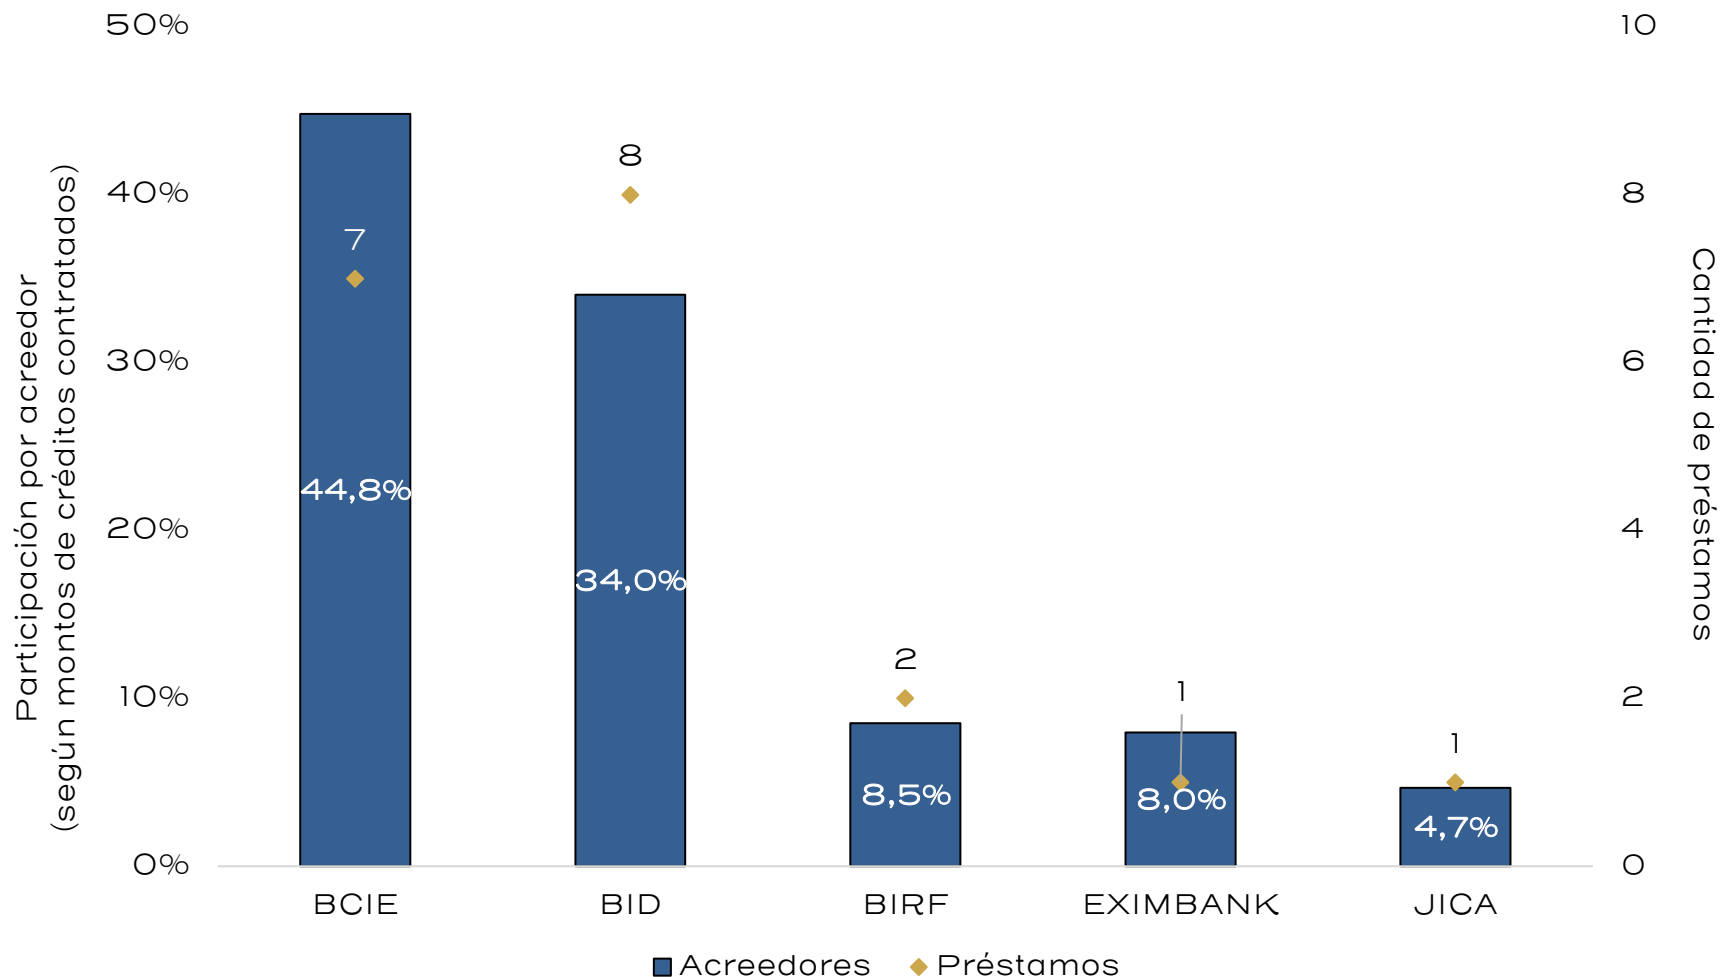

Fuente: DGGDP, MH.

Montos de Préstamos externos por entidad ejecutora al I trimestre 2025

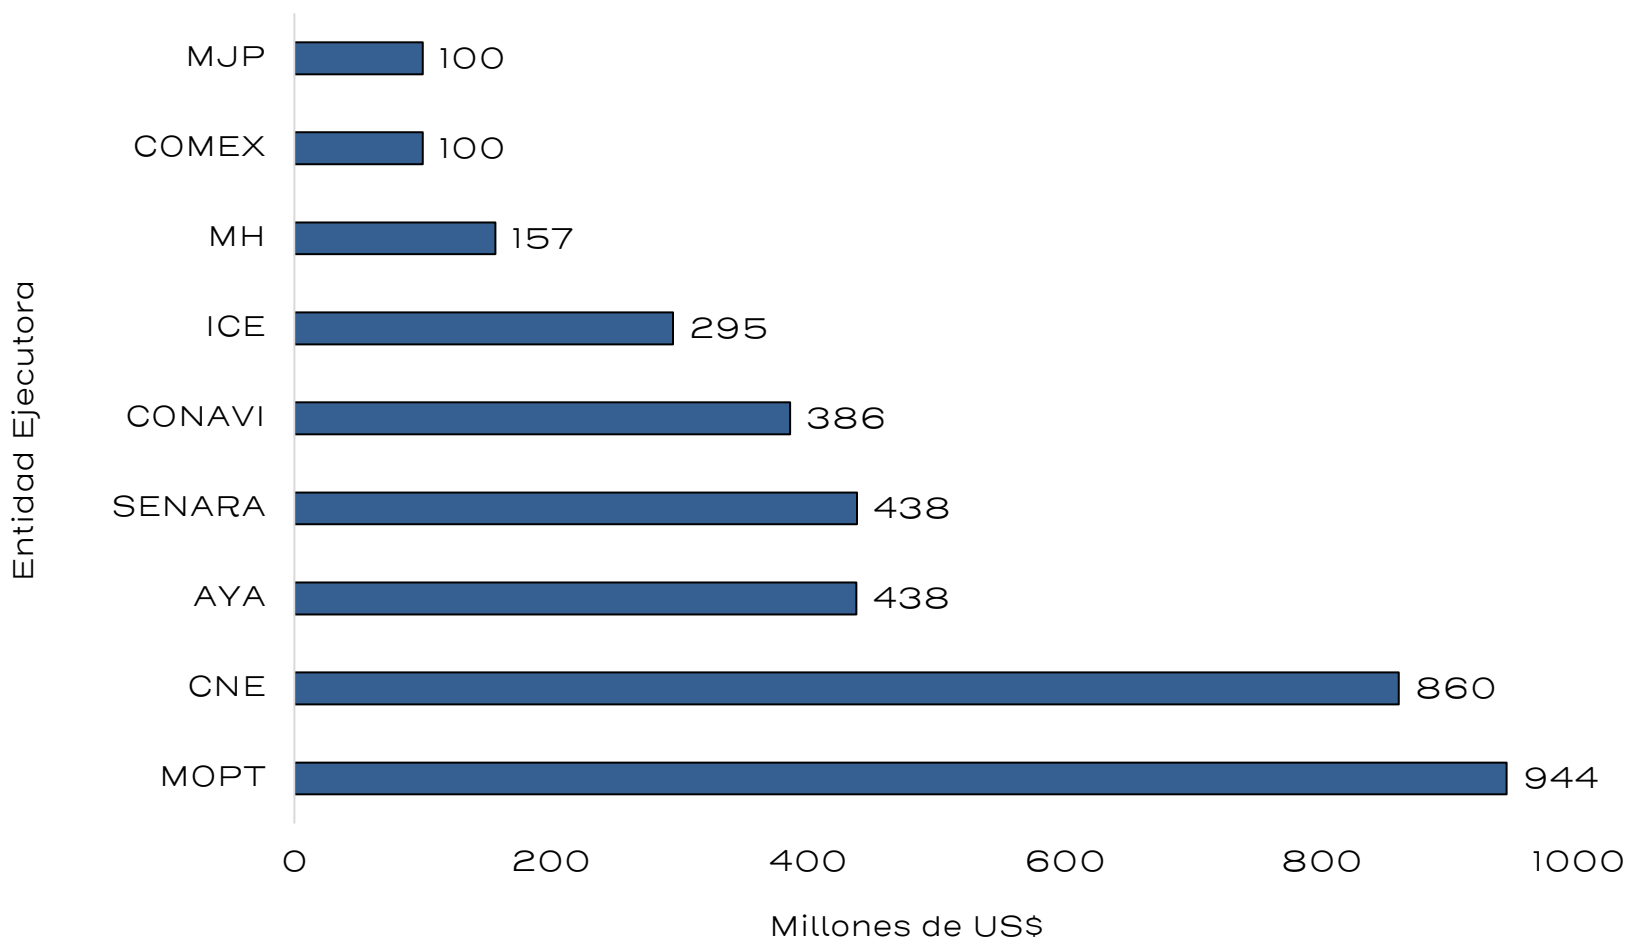

Fuente: DGGDP, MH.

Situación de los programas/proyectos de inversión pública


Entidad Ejecutora	Monto total del financiamiento de los programas/proyectos (US\$)	Monto pendiente por desembolsar (US\$)	Número de Programas / Proyectos	Número de préstamos	Desempeño del Programa/Proyecto ^{1/}		
							
MOPT	944 036 000,00	416 046 707,75	4	5		2	2
CNE ^{2/}	860 000 000,00	785 310 724,42	2	2		1	
AYA	395 691 200,29	328 448 700,80	3	3		3	
SENARA	425 000 000,00	419 299 285,50	1	1		1	
CONAVI	386 055 000,00	21 260 037,23	2	2		1	1
ICE	294 955 375,16	136 661 845,60	2	2		2	
MH	156 640 000,00	140 468 254,00	1	1	1		
COMEX	100 000 000,00	8 650 581,40	1	1	1		
MJP	100 000 000,00	55 076 383,24	1	1		1	
AYA/ SENARA	55 080 000,00	26 860 000,00	1	1	1		
Total	3 717 457 575,45	2 338 082 519,94	18	19	3	11	3

1/ Desempeño calculado con corte a diciembre 2024.

2/ El Crédito 9502-CR será ejecutado en caso de una declaratoria de emergencia nacional, por lo cual no le aplica medición de desempeño.

Fuente: DGGDP, MH.

Desembolsos programados respecto a los desembolsos realizados del 2020 al I trimestre 2025

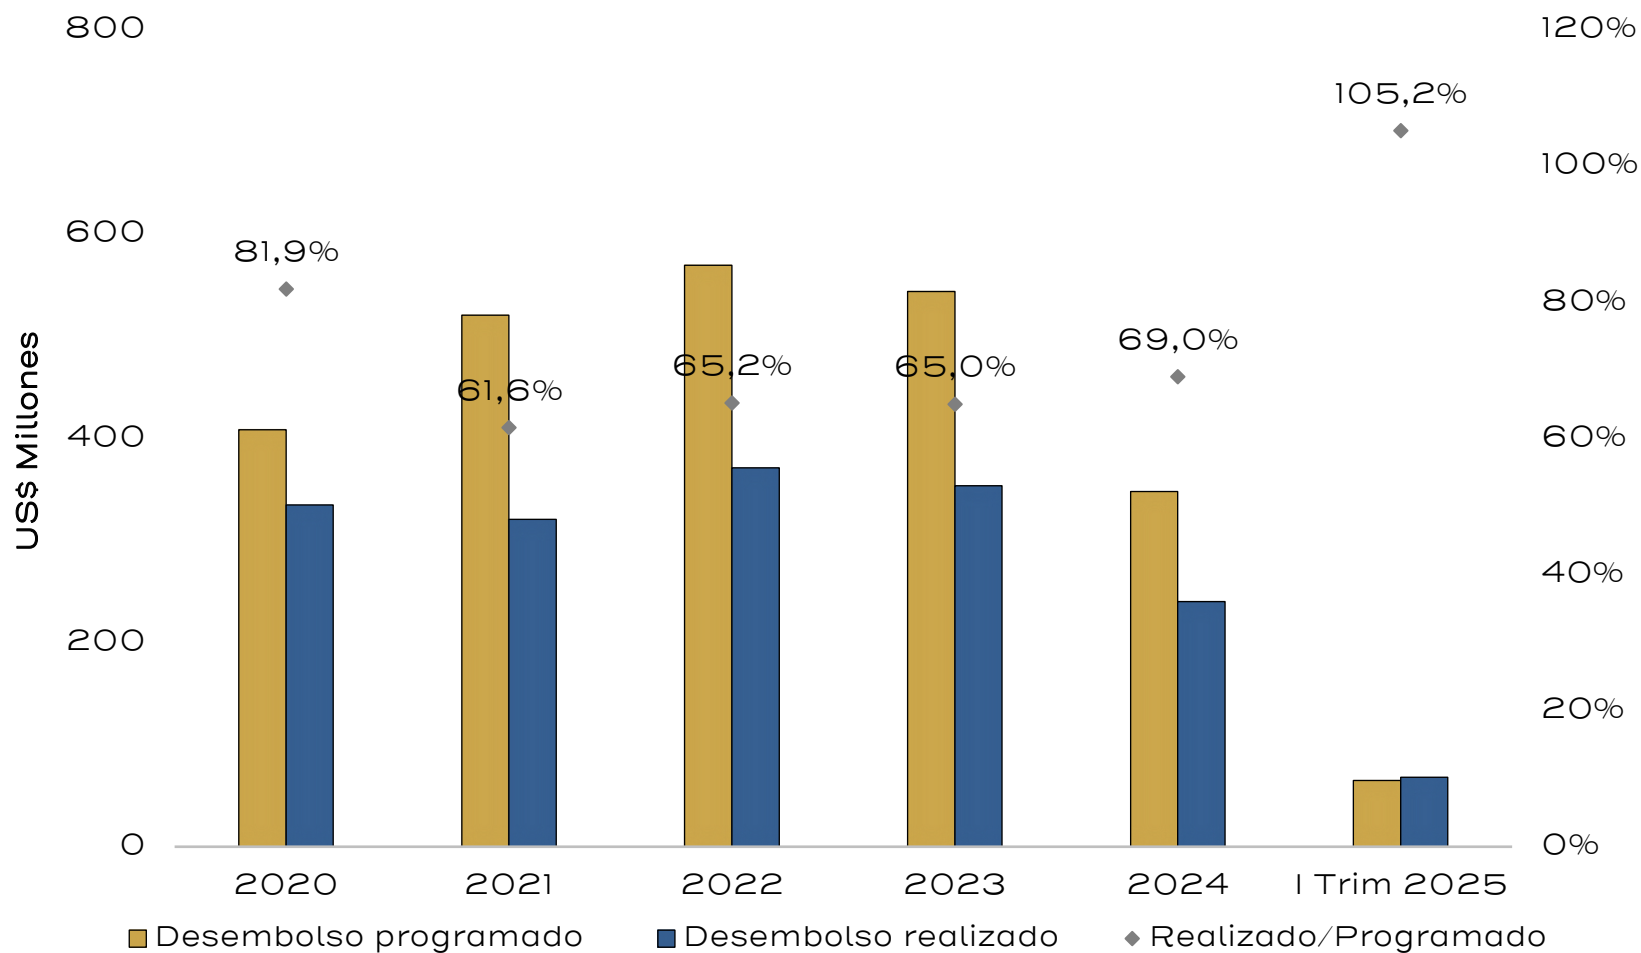

Fuente: DGGDP, MH.

II. Situación de la cartera de créditos por organismo ejecutor

1. Cartera [CONAVI](#)
2. Cartera [MOPT](#)
3. Cartera [AyA](#)
4. Cartera [SENARA](#)
5. Cartera [ICE](#)
6. Cartera [MH](#)
7. Cartera [MJP](#)
8. Cartera [COMEX](#)
9. Cartera [CNE](#)



Cartera de créditos del CONAVI

BCIE AM 2080

Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial.

EXIMBANK 1420202052013211015

Proyecto Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32.



Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial

US\$ 90,05 MILLONES

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 98,33% ^{1/}

Avance Físico: 100,00%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 29/04/2027**



Avances

- **Unidad Funcional V:** Finalizado en febrero 2025, con un 100% de avance físico. Se concluyeron las estructuras principales (tableros, vigas, paso inferior, losas, mezcla asfáltica), así como trabajos complementarios y de seguridad: subdrenajes, paisajismo, señalización vial, demarcación, iluminación y entrega de los marginales.
- **Rehabilitación del puente sobre el río El Virilla en la RN°32:** Finalizado en diciembre 2024, presenta un avance del 100%. Se concluyó la instalación de fibra de carbono (interna y externa), demolición y reconstrucción de elementos estructurales clave (vigas, diafragmas). También se ejecutaron obras en la ampliación de la Ruta Nacional 32, incluyendo aceras; además, la conformación de accesos norte y sur y obras de drenaje pluvial.

1/ Se está analizando por parte del Ejecutor rescindir US\$1,5 millones, situación se definirá hasta después de finalizar los pagos con el contratista.

Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32


US\$ 296,00 MILLONES

Monto del Préstamo
Comprador de Exportación

Avance Financiero: 93,32%

Avance Físico: 91,57%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 10/04/2025**



Investigación técnica y diseño: 100%

Construcciones con mayor avance (promedio):

- Vía/carretera (obras nuevas): 90,84%
 - Destacan: Drenajes, base, superficie, trabajos de protección ambiental, calles marginales, ciclovías, aceras, entre otros.
- 3 Cruces a nivel: 99,33%
- 33 Puentes vehiculares nuevos: 99,94%
 - 27 con avance de 100%
 - 6 con avance por encima de 99%
- Puentes peatonales nuevos: 92,85%
 - 10 con avance de 100%
 - 10 con avance promedio de 85,70%
- Rehabilitación de la vía existente: 95,22%

Otras actividades requeridas:

- Expropiaciones: 87%
 - 515 propiedades necesarias para construir de las cuales 475 están disponibles para trabajar.
- Relocalización de servicios: 98,99%



Avances

Cartera de créditos del MOPT

BID 3071/OC-CR y 3072/CH-CR
Programa de Infraestructura de Transporte

BID 4507/OC-CR
Programa Red Vial Cantonal II

BID 4864/OC-CR
Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones
Público-Privadas

BID 5823/OC-CR
Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana
Conectividad Resiliente



Programa de Infraestructura de Transporte

3071/OC-CR
US\$ 400,00 MILLONES

3072/CH-CR
US\$ 50,00 MILLONES

Monto de los Préstamos

Avance Financiero:
3071/OC-CR : 78,25%
3072/CH-CR: 60,00%

Avance Físico: 59,29%

Fecha Límite de Desembolsos:
12/11/2026



Avances

- Al corte se tiene un avance en las obras de seguridad de los tramos La Angostura, San Gerardo – Limonal y Barranca – San Gerardo, con un progreso del 99%, para cada uno, quedando pendiente la instalación de 8 luminarias que se completarán durante el período de defectos.
- Diseño y Construcción de la nueva carretera a San Carlos RN 35 (Punta Sur), el cual tiene un avance del 90,87% en gestión de expropiaciones y se espera concluir el proceso contratación del contratista de obra y debidamente adjudicada antes del cierre del I semestre 2025.

Programa Red Vial Cantonal II


US\$ 144,03 MILLONES

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 81,22%

Avance Físico: 89,00%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 20/09/2025**



Avances

- Se adquirieron las licencias del software PAVER, para la evaluación de la condición de los caminos. Se realizó reunión de pre-inicio con la empresa con la empresa Trabesa Limitada-Essency Consulting Europe, SLP, se dio la orden de inicio para el 12 de mayo del 2025, con fecha de finalización para el 19 de setiembre 2025.
- Se formalizó el contrato al Consorcio: GEA 21- GPC- YUSO para la realización de una Campaña Comunicacional de Movilidad Segura y Sostenible, se dio la orden de inicio el 15 de enero del presente año ^{1/}.
- Se encuentran en ejecución las obras de P6, P10, P11, P12, P13, P14, P22 y P32. En el caso de los puentes se encuentran en ejecución las obras de P16 y P27.
- Los paquetes P12 y 22 continúan como la ruta crítica, De acuerdo con el Programa de Ejecución Plurianual (PEP), su cierre, incluyendo el trámite del pago final, está previsto para abril de 2026.
- Se contrató un analista técnico-administrativo-financiero a partir del 28 febrero 2025, y se ha dado continuidad a la supervisión y administración de contratos, así como al seguimiento de procesos clave para garantizar la supervisión de obras y el control financiero.

^{1/} Se está tramitando la segunda prórroga solicitada por la UE, la nueva fecha de finalización sería el 24 de abril 2026.

Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas


US\$ 125,00 MILLONES

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 54,40%

Avance Físico: 62,50%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 29/09/2025**



Avances

- **Taras - La Lima (66,00%):** Se realizaron trabajos de limpieza, excavación y pavimentación con concreto asfáltico, además de instalar drenajes y cunetas. Se construyeron losas y se hicieron pruebas de carga en el paso elevado La Lima 1 y el paso inferior La Lima. También se colocaron barandas, barreras, pasarelas peatonales y dispositivos de control vial, junto con la reposición de servicios y canalización eléctrica subterránea.
- **OBIS:**^{1/} Los tramos de Grecia y San Ramón, se adjudicaron en abril y el Coyol y Naranjo están en proceso adjudicación.

^{1/} Se está valorando la opción de prorrogar el Programa a tres años más.

Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana

Conectividad Resiliente

US\$ 225,00 MILLONES

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 0,00%

Avance Físico: 4,35%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 10/01/2029**



Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido

- Orden de inicio (junio 2025).
- Contratación de Administración de contratos FIDIC en proceso adjudicación (mayo -2025).

Condiciones para uso de Recursos

- Ejecutar fondos provenientes del PIT antes de noviembre 2026.

Tramo Central RN-35 diseñado y construido

- Recepción de ofertas (abril-2025) – Adjudicación (noviembre -2025).



Avances

Cartera de créditos del AyA



BCIE 2129

Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM.

BCIE 2164

Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora, Puntarenas.

BCIE 2188-A

Programa Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC).

BCIE 2198

Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón.



Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM (RANC-EE)


US\$ 130,00 MILLONES

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 22,15%

Avance Físico: 49,36%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 12/08/2025 ^{1/}**



Avances

Durante el I trimestre se avanzó en la reducción de pérdidas, destacando la sustitución de 75,638 medidores domiciliarios, lo que representa un 44% de la meta de 120,000 para el año 2025.

Se realizaron intervenciones en siete zonas críticas del acueducto metropolitano, alcanzando un avance del 48% en el proceso de mejora del abastecimiento.

^{1/} El Organismo Ejecutor requerirá una segunda prórroga cuya finalización podría ser en el año 2028 o 2029.

Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario

Juanito Mora, Puntarenas.


US\$ 154,60 MILLONES

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 18,99%

Avance Físico: 38,70%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 30/10/2027**



Avances

- Ampliación del acueducto de San Pablo de Turrubares
 - Etapa I: Construida, obras finalizadas el 23 de agosto de 2024.
 - Etapa II: En proceso en el Juzgado Contencioso Administrativo, para la adquisición de terrenos, sin plazo definido para su conclusión. El proyecto continúa con un 88% a nivel de diseño.
- Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable, zona oeste de San José
 - Etapa I: Se realizó la adjudicación, firmeza del acto e inicio de la formalización contractual (inició 01 de abril, 2025, finaliza 31 de marzo, 2026).
 - Etapa III: Proyecto finalizado y con acta de recepción aprobada,
 - Etapa IV: En construcción, con un avance del 79.52%.
- Mejoras al sistema de acueducto de Pasito de Alajuela
 - Etapa I: Se alcanzó un 100% en contratación administrativa.
 - Etapa II: La ejecución de las obras bajo el esquema de licitación por demanda ha comenzado, alcanzando un avance del 23.51%.

Programa Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC)


US\$ 111,12 MILLONES

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 8,18%

Avance Físico: 13,78%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 28/04/2026**



Avances

- Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable de Limón.
 - I. *Búfalo Maxi Palí*: Se trabajó durante el trimestre en la documentación necesaria para solicitar los permisos ante el CFIA.
 - II. *Tanques y Redes* y III. *Aumento Producción*: Ambos proyectos se encuentran en etapa de diseño final y se espera que los mismos sean entregados en julio y en octubre respectivamente, A marzo, el avance es del 26% y del 39% en el orden dado por parte del consultor.
- Construcción del edificio Laboratorio Nacional de Aguas.
 - Por instrucción dada por la Gerencia General, se trabajó en un nuevo diseño referencial con ubicación en Sede Central, por lo que se readecuaron los TdR's arquitectónicos, civiles, estructurales y electromecánicos, se estima como máximo la publicación de la licitación en agosto del 2025.
- Mejoras al acueducto de Quepos y Manuel Antonio.
 - En etapa de diseño final y se está a la espera de la entrega de los diseños finales para mayo 2025. A marzo el avance es del 47% por parte del consultor.

Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón


US\$ 42,00 MILLONES

Monto del Préstamo que
ejecutará AyA

Avance Financiero^{1/}: 38,10%

Avance Físico^{1/}: 20,62%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 26/06/2026**



- **Infraestructura y equipamiento:**
 - El Sector 1 continúa en ejecución con actividades constructivas en las cuencas 05 y 13, registrando un avance físico del 0.51% durante el mes de marzo. Las labores realizadas incluyeron la instalación de tuberías, colocación de pozos, abordaje social, y la implementación de medidas ambientales y de seguridad ocupacional. Cabe señalar que el porcentaje acumulado de avance es bajo, ya que durante los meses de enero y febrero el contratista se encontraba en la fase de instalación de oficinas y conformación de cuadrillas para el inicio de las obras.
 - Durante el periodo del presente informe se obtuvieron las aprobaciones y permisos del CFIA para la Estación de Pre acondicionamiento (EPA).

Avances

- **Administración y supervisión:**
 - En cuanto a la supervisión de obras, tras obtener el Refrendo al Contrato, el 08 de enero de 2025 se emitió la orden de inicio con un plazo de ejecución de 30 meses, estableciendo como fecha de inicio el 13 de enero de 2025 y fecha de finalización el 13 de julio de 2027.

1/ Estos avances representan únicamente los incrementos marginales correspondientes al AyA.



Cartera de créditos del SENARA

BCIE 2198

Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón.

BCIE 2220

Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME).



Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón


US\$ 13,08 MILLONES

Monto del Préstamo que
ejecutará SENARA

Avance Financiero¹: 93,43%

Avance Físico¹: 46,00%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 26/06/2026**



Avances

- Continúa el avance de las obras en los cauces Chitá-Santa Fe, Quebrada Chocolate, Canal Santa Rosa (Westfalia) y los canales menores, adjudicadas al Consorcio BETA-MP MAREAS. A continuación, se detallan los avances registrados:
 - En este trimestre se concluyó la excavación del canal Santa Rosa, contemplan una longitud total de aproximadamente 4500 m.
 - Se iniciaron y finalizaron las obras en el Canal Colina, con una longitud de 700 m.
 - En enero se inició la intervención en el Río Limoncito (Chitá-Santa Fe), cauce donde se concentra la mayor intervención en obra, Se ha avanzada en las labores de demolición, desmonte y limpieza del área de trabajo.
 - Se tiene pendiente el inicio de la intervención de la Quebrada Chocolate.
- La supervisión para la obra del Río Limoncito, adjudicada a la empresa PEYCO el 28 de enero de 2025 e iniciada formalmente el 31 de enero, aporta una evaluación imparcial del programa, fortalece el control de calidad, detecta desviaciones y retrasos en la ejecución, supervisa aspectos ambientales y apoya en campo, especialmente ante la escasez de personal.
- Se obtuvo la no objeción para la licitación del Plan de Educación Ambiental y se dio inicio al proceso de contratación. La recepción de ofertas se programó para el 24 de marzo de 2025, y actualmente se encuentra en proceso de revisión. Se recibieron un total de dos ofertas.

1/ Estos avances representan únicamente los incrementos marginales correspondientes al Senara.

Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME)

US\$ 425,00 MILLONES

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 1,34%

Avance Físico: 7,56%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 14/02/2030**



Avances

- **Personal DIGEP.** Se realizaron 9 contrataciones más, completando así este trimestre la totalidad de las 17 plazas aprobadas por la STAP a PAACUME para este año (dando continuidad a 8 plazas contratadas en 2024).
- **Procesos de Adquisición.** Se obtuvo observaciones de la Dirección Jurídica del SENARA para el pliego de condiciones y los TdR del gestor documental; una vez resueltos, continuará el avance del proceso hasta su publicación, que se estima para el 27 de junio de 2025.
- **Adquisición de Terrenos^{1/}.** Se dio continuidad a los avalúos y las adquisiciones programadas, con lo cual el avance asciende a 66,00% en el Canal del Oeste. Para la Red de distribución de margen derecha, el avance permanece en 0,00% ya que este se acredita cuando los terrenos son adquiridos o están en posesión.

^{1/} Para el Sitio de Presa y Embalse el avance alcanzó el 100,00% durante el año 2024.



Cartera de créditos del ICE

BID 3589/OC-CR

Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad.

JICA CR-P5-2

Proyecto Geotérmico Borinquen I.



Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad


US\$ 121,30 MILLONES

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 96,10%

Avance Físico: 89,27%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 07/08/2025**



Avances

- **Generación:**

- ✓ En la actividad para la rehabilitación de la PH la Garita se finaliza con la instalación del SCADA, de acuerdo con cronograma planteado.

- **Transmisión:**

- ✓ Equipo de servidores para las subestaciones: Finalizó el proceso de instalación, en el cual se instalaron un total de 42 servidores.
- ✓ Plataforma y las licencias para el gestor de protecciones del Sistema de Transmisión (software): la instalación ha sido finalizada y el contrato ha concluido.
- ✓ Digitalización y Modernización Sistema Transmisión: Los equipos para la plataforma para monitoreo dinámico del sistema de transmisión se mantienen en el proceso de configuración. Se están programando pruebas locales con la participación de ICE-Telecomunicaciones, la instalación quedará finalizada en el tercer trimestre del presente año.

- **Distribución y comercialización:**

- ✓ Durante el trimestre se lleva un total de 47,700 luminarias LED instaladas.
- ✓ Medidores AMIS: Continúa el proceso de instalaciones. Se registran 84,800 medidores AMI instalados. Con la adenda que está en proceso de formalización se tiene programada la instalación de 12,600 medidores AMI adicionales aproximadamente.

Proyecto Geotérmico Borinquen I


US\$ 173,65 MILLONES

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 24,03%

Avance Físico: 45,40%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 27/09/2026**



○ Desarrollo de yacimiento geotérmico:

Se continúa con la perforación del pozo PGB-28. Debido a múltiples pérdidas de circulación, se realizan maniobras de conservación de zona, incluyendo la colocación de un tapón de cemento, la corrida y cementación de la tubería de revestimiento, y la instalación del carrete de expansión, árbol de válvulas y preventores. La operación del proyecto no se ve afectada, ya que esta es la última perforación del pozo geotérmico. Actualmente cuenta con un avance acumulado de 90,85%.



○ Sistemas de Recolección:

En este trimestre se continúa con la realización obras hidráulicas e impermeabilización en lagunas de reinyección, tratamiento de taludes, pasoductos, fabricación y montaje de cimientos de concreto y soportes metálicos para sistema tubería metálica, montaje de tuberías de campo, tubería de concreto, entre otros. Avance acumulado de 30,84%.

Avances

○ Obras ambientales:

- Se realizaron 12 monitoreos de mamíferos, 1 monitoreo de macroinvertebrados, 5 monitoreos de ratones, y se colocaron 15 dispositivos en lagunas de agua y pozos de arqueología para rescate de fauna.
- Se tramitaron los permisos de corta de árboles y permisos de obra en cauce para la obra sobre el Rio Blanco y sobre quebrada Agua Fría.
- Se iniciaron los trabajos del paso vehicular y peatonal sobre el Rio Blanco y se realizaron pruebas del pozo en la comunidad de El Cedro.
- Avance acumulado de 60,59%.



Cartera de créditos del MH

BIRF 9075-CR

Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario



Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario


US\$ 156,64 MILLONES

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 10,32%

Avance Físico: 27,15%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 31/07/2026 ^{1/}**



Contrataciones COTS:

- Adquisición Sistema Financiero y de Talento Humano (Av. Físico: 28,41%).
- Adquisición Sistema Tributario (Av. Físico: 25,17%).
- Adquisición de Sistema Aduanero (Av. Físico: 21,97%).

Contrataciones con avances más representativos:

- Sistema de Auditoría Interna (Av. Físico: 100%).
- Servicio de Digitalización y Gestor Documental en el Ministerio de Hacienda, según demanda (Av. Físico: 100%).

Otras contrataciones relevantes:

- Servicios de Nube e Interoperabilidad (Av. Físico: 28,66%).
- Infraestructura de redes y telecomunicaciones (Av. Físico: 5,00%).
- Servicios de Auditoría y Evaluaciones de Ciberseguridad (Av. Físico: 15,00%).
- Sistema de Actas, de Correspondencia, Seguimiento de Informes (Av. Físico: 3,00%).
- Herramientas de atención al ciudadano (Av. Físico: 2,60%).

^{1/} En proceso la formalización de una prórroga de 15 meses a la fecha de cierre del crédito.



Avances



Cartera de créditos del MJP

BID 4871/OC-CR

Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia



Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia

US\$ 100,00 MILLONES

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 44,92%

Avance Físico: 47,41%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 17/03/2026**



Delegaciones Policiales finalizadas:

- ✓ Siquirres
- ✓ Desamparados Sur
- ✓ Santa Ana
- ✓ Horquetas
- ✓ Puerto Viejo
- ✓ Puntarenas Norte



Centro Cívico por la Paz finalizado:

- ✓ Corredores

Centro de Mando y Control Policial: No Objeción del BID para la adjudicación del contrato (Diseño + Construcción).

Avances

Avances en la ejecución de otras actividades:

- ✓ Implementación de estrategias de prevención del delito, a través de:
- ✓ Fortalecimiento del Análisis Criminal de la Fuerza Pública.
- ✓ Diseño y despliegue del Protocolo de Análisis Espacial aplicado a la detección de zonas calientes en las Unidades de Análisis Criminal.
- ✓ Código de Conducta y Protocolo de Actuación de la Unidad de Asuntos Internos para la Recepción y Gestión de Denuncias Anónimas Internas.
- ✓ Política de Integridad y Anticorrupción del MSP.



Cartera de créditos de COMEX

BID 3488/OC-CR

Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica (PIF)



Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica


US\$ 100,00 MILLONES

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 91,35%

Avance Físico: 70,76%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 31/05/2025^{1/}**



Avances

- **Puesto Fronterizo Peñas Blancas.** El ritmo de ejecución alcanzó al cierre del trimestre un 73,90% de avance. Una vez resueltos pendientes del contratista, se emitirán los certificados de recepción de obra ya finalizada.
- **Puesto Fronterizo Sabalito.** El diseño de rehabilitación estructural del centro incrementó su avance a 58,86%.
- **Expansión de VUCE.** El avance de la consultoría de desarrollo de sus nuevas funcionalidades asciende a 48,00%.
- **Módulo de Gestión de Riesgos.** La consultoría de desarrollo de este, incrementa su avance al 15,00%.

1/ Al cierre del Informe, se tramitaba una solicitud que buscaba ampliar el plazo de desembolsos hasta el 31 de diciembre 2025.



Cartera de créditos de la CNE

BCIE 2317

Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI).

BIRF 9502-CR

Segundo Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO).



Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI)

US\$ 700,00 MILLONES

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 10,67%

Avance Físico: 17,18%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 17/06/2030**



Para el cierre del I trimestre se contó con un total de 6 proyectos finalizados. Durante los primeros tres meses del año, se excluyeron 35 proyectos del Programa (respaldados por acuerdo de la Junta Directiva de la CNE). Los recursos correspondientes se reasignaron a proyectos dentro de los mismos componentes de inversión.

Comisión Nacional de Emergencias: 181 proyectos / US\$161,71 millones.

Se excluyeron 22 proyectos.

Estado de los proyectos que permanecen en el Plan de Inversión:

- Sin avances: 23
- En proceso de contratación estudios preinversión: 53
- En elaboración de estudios preliminares: 22
- En contratación de diseños o diseños/construcción: 16
- En elaboración de diseños: 25
- En construcción de obras: 42
 - Obras preliminares: 3
 - Construcción: 33
 - Finalizados: 6



Avances

CONAVI: 165 proyectos / US\$347,39 millones.

Se excluyeron 11 proyectos.

Estado de los proyectos que permanecen en el Plan de Inversión:

- Sin avances: 2
- En proceso de contratación estudios preinversión: 154
- En elaboración de estudios preliminares: 0
- En contratación de diseños o diseños/construcción: 9
- En elaboración de diseños: 0
- En construcción de obras: 0
 - Obras preliminares: 0
 - Construcción: 0
 - Finalizados: 0



Avances

MEP: 47 proyectos / US\$135,62 millones.

Estado de los proyectos que permanecen en el Plan de Inversión:

- Sin avances: 1
- En proceso de contratación estudios preinversión: 15
- En elaboración de estudios preliminares: 0
- En contratación de diseños o diseños/construcción: 31
- En elaboración de diseños: 0
- En construcción de obras: 0
 - Obras preliminares: 0
 - Construcción: 0
 - Finalizados: 0

INCOFER: 72 proyectos / US\$50,56 millones.

Se excluyeron 2 proyectos.

Estado de los proyectos que permanecen en el Plan de Inversión:

- Sin avances: 1
- En proceso de contratación estudios preinversión: 66
- En elaboración de estudios preliminares: 0
- En contratación de diseños o diseños/construcción: 0
- En elaboración de diseños: 0
- En construcción de obras: 5
 - Obras preliminares: 0
 - Construcción: 5
 - Finalizados: 0



Avances

MIVAH: 2 proyectos / US\$4,72 millones.

Estado de los proyectos que permanecen en el Plan de Inversión:

- Sin avances: 1
- En proceso de contratación estudios preinversión: 0
- En elaboración de estudios preliminares: 0
- En contratación de diseños o diseños/construcción: 0
- En elaboración de diseños: 0
- En construcción de obras: 1
 - Obras preliminares: 0
 - Construcción: 0
 - Finalizados: 0

Segundo Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO)

US\$ 160,00 MILLONES

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 0,00%

Avance Físico: No aplica

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 24/03/2026**



Avances

- Este préstamo fue aprobado por la Asamblea Legislativa mediante la Ley N°10622, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°231 el 9 de diciembre de 2024. Al 31 de marzo no se han desembolsado recursos del crédito, por cuanto no ha sido declarado a la fecha ningún estado de emergencia que requiera del uso de estos fondos.
- La operación propuesta ofrece una línea de financiación contingente que permitirá al Gobierno desembolsar fondos de inmediato tras una declaración de emergencia, calificada como resultado de eventos naturales adversos, incluyendo emergencias de salud pública.
- El periodo de disponibilidad de los fondos de esta operación será de tres años y podrá prorrogarse en cuatro ocasiones, por un máximo de tres años cada vez, hasta un total de 15 años.
- Al tratarse de un instrumento de cobertura ex ante, es decir, que se contrata previo a que ocurra un desastre, es que en el contrato de préstamo no se especifican los proyectos que serían financiados con los recursos del préstamo, ni se incluyen categorías a financiar.



MINISTERIO
DE HACIENDA

GOBIERNO
DE COSTA RICA

Programas/Proyectos de Inversión financiados con recursos externos

Gobierno Central y Resto del Sector Público

Al 31 de marzo 2025

Dirección General de Gestión de Deuda Pública

