



MINISTERIO
DE HACIENDA

GOBIERNO
DE COSTA RICA

Programas/Proyectos de inversión financiados con recursos externos

Gobierno Central y Resto del Sector Público

Dirección General de Gestión de Deuda Pública

Al 31 de marzo 2026

Contenido

- I. Situación general de la Cartera de créditos de inversión pública
- II. Situación de la Cartera de créditos por Organismo Ejecutor
 - Cartera MOPT
 - Cartera AyA
 - Cartera SENARA
 - Cartera ICE
 - Cartera MH
 - Cartera MJP
 - Cartera CNE

I. Situación general de la cartera de créditos externos de inversión pública

Cartera de créditos externos de inversión pública en ejecución



Monto de la cartera: US\$ 3.069,76 millones

Total de créditos: 15

Total de programas/proyectos: 14



Ejecutores más representativos: MOPT, CNE, AyA y SENARA.

Acreedores: BCIE, BID, BIRF y JICA.



Características de la deuda:


- 11 créditos: Gobierno es Deudor.
- 4 créditos: Instituciones son deudoras (en 1 de ellos el Gobierno es Garante).



Plazo Promedio de Ejecución de la Cartera*: 106,99 meses


*Para efectos del cálculo del plazo promedio de ejecución de la cartera, se considera la fecha límite de desembolsos vigente o bien, su expectativa de conclusión según el avance del programa/proyecto.

Participación de los acreedores y préstamos externos al I trimestre 2026

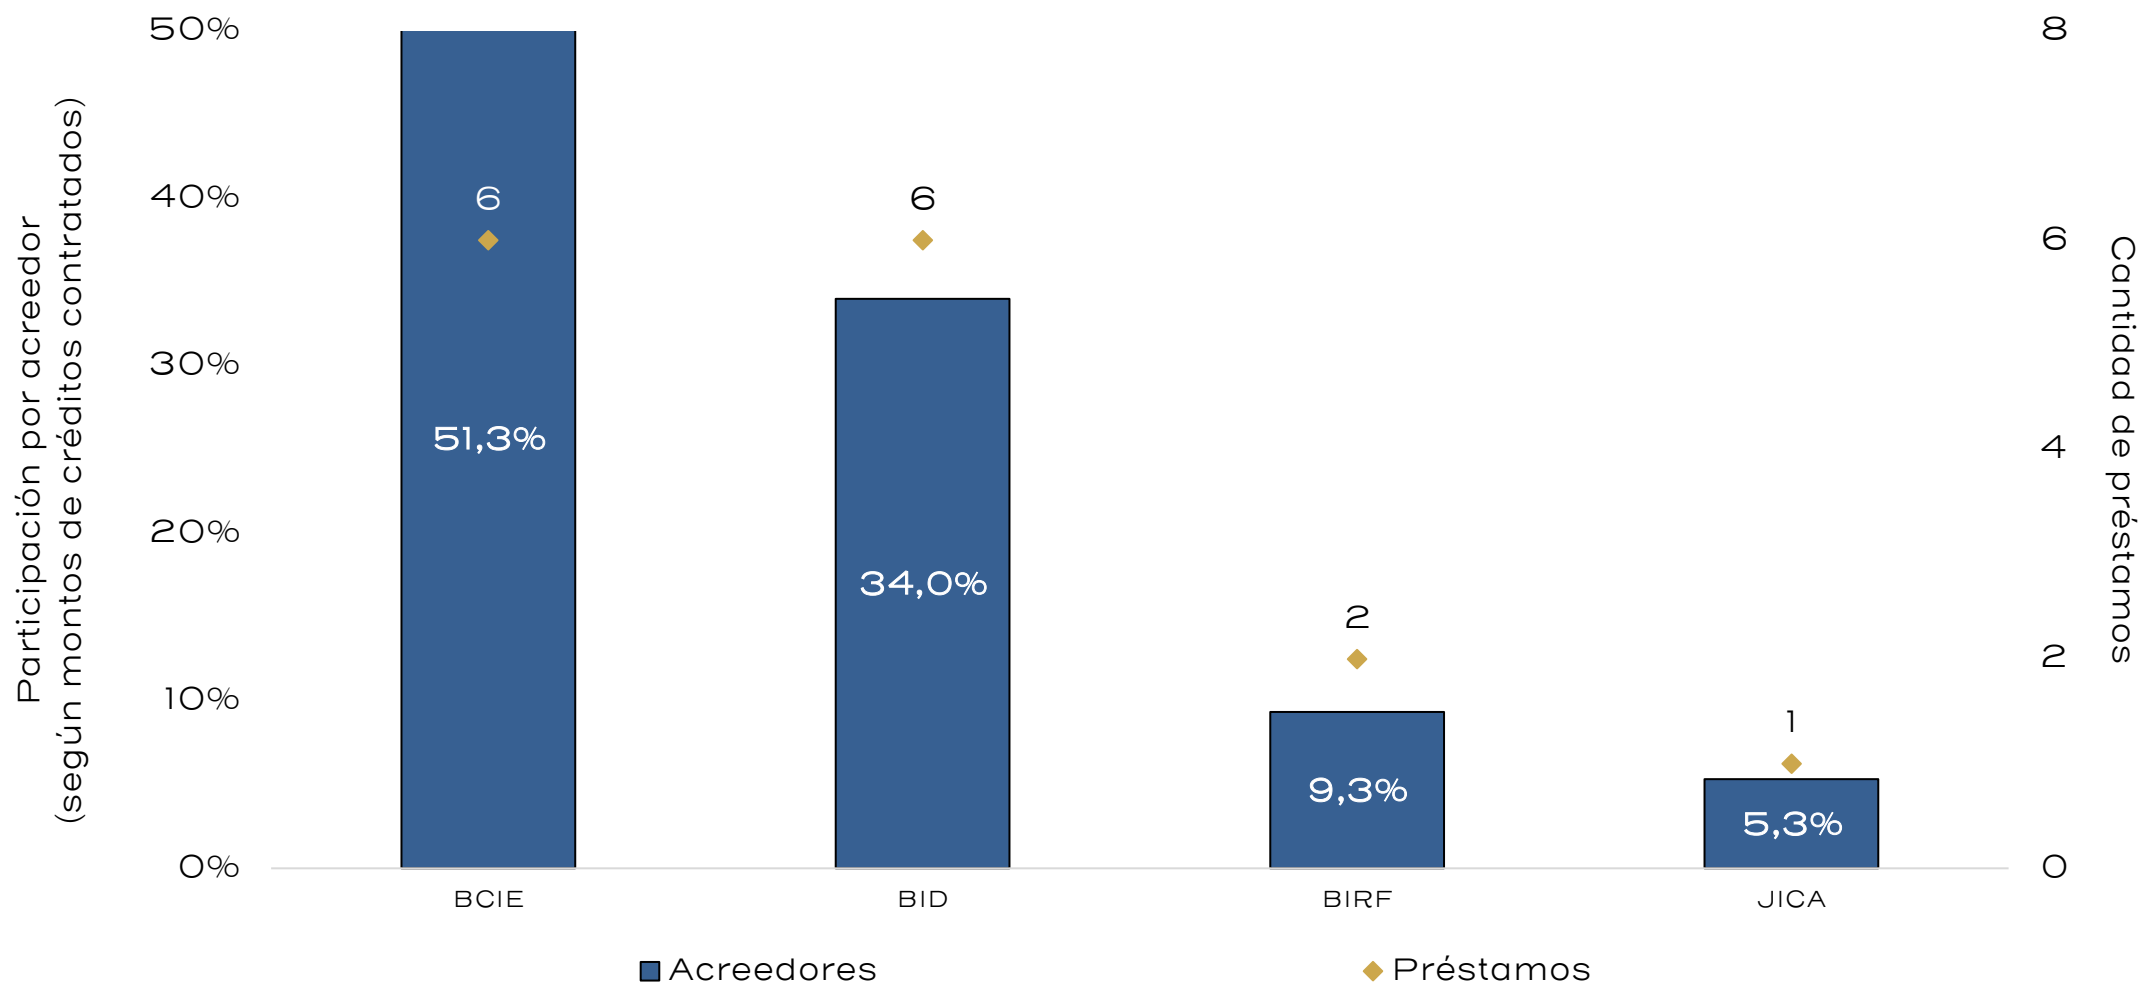

Fuente: DGGDP, MH.

Montos de préstamos externos por entidad ejecutora al I trimestre 2026

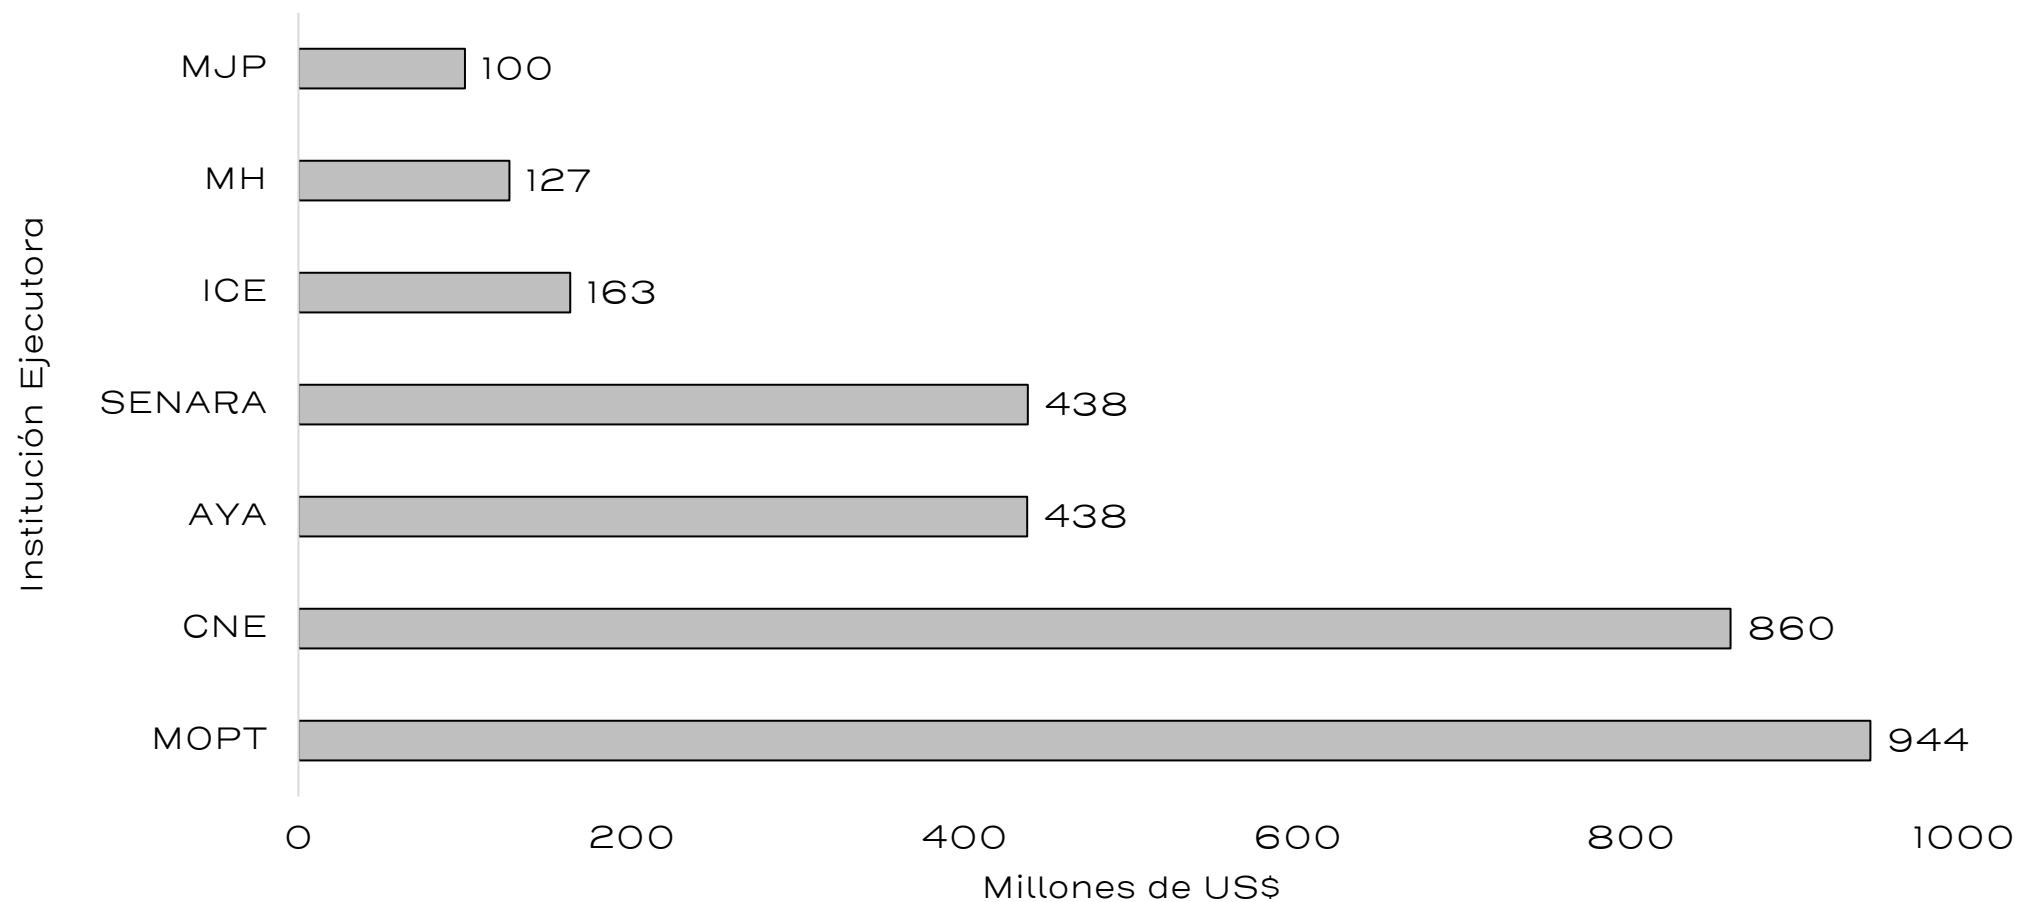

Fuente: DGGDP, MH.

Situación de los programas/proyectos de inversión pública


Entidad Ejecutora	Monto total del financiamiento de los programas/proyectos (US\$)	Monto pendiente por desembolsar (US\$)	Número de Programas / Proyectos	Número de préstamos	Desempeño del Programa/Proyecto 1/		
							
MOPT	\$ 944 036 000,00	\$ 366 198 832,26	4	5		3	1
CNE ^{2/}	\$ 860 000 000,00	\$ 652 435 889,12	2	2	1		
AYA	\$ 395 691 200,29	\$ 261 248 700,80	3	3		3	
SENARA	\$ 425 000 000,00	\$ 312 299 285,50	1	1		1	
ICE	\$ 163 311 341,50	\$ 121 343 816,53	1	1		1	
MH	\$ 126 640 000,00	\$ 100 559 365,84	1	1		1	
MJP	\$ 100 000 000,00	\$ 25 076 383,24	1	1		1	
AYA/ SENARA	\$ 55 080 000,00	\$ 18 460 000,00	1	1		1	
Total	\$ 3 069 758 541,79	\$ 1 857 622 273,29	14	15	1	11	1

1/ Desempeño calculado con corte a diciembre 2025.

2/ El Crédito 9502-CR será ejecutado en caso de una declaratoria de emergencia nacional, por lo cual no le aplica medición de desempeño. Para el caso del PIT, conformado por dos préstamos del MOPT, se aplica la metodología de evaluación del desempeño de manera conjunta,

Fuente: DGGDP, MH.

Desembolsos programados respecto a los desembolsos realizados del año 2022 al I trimestre 2026

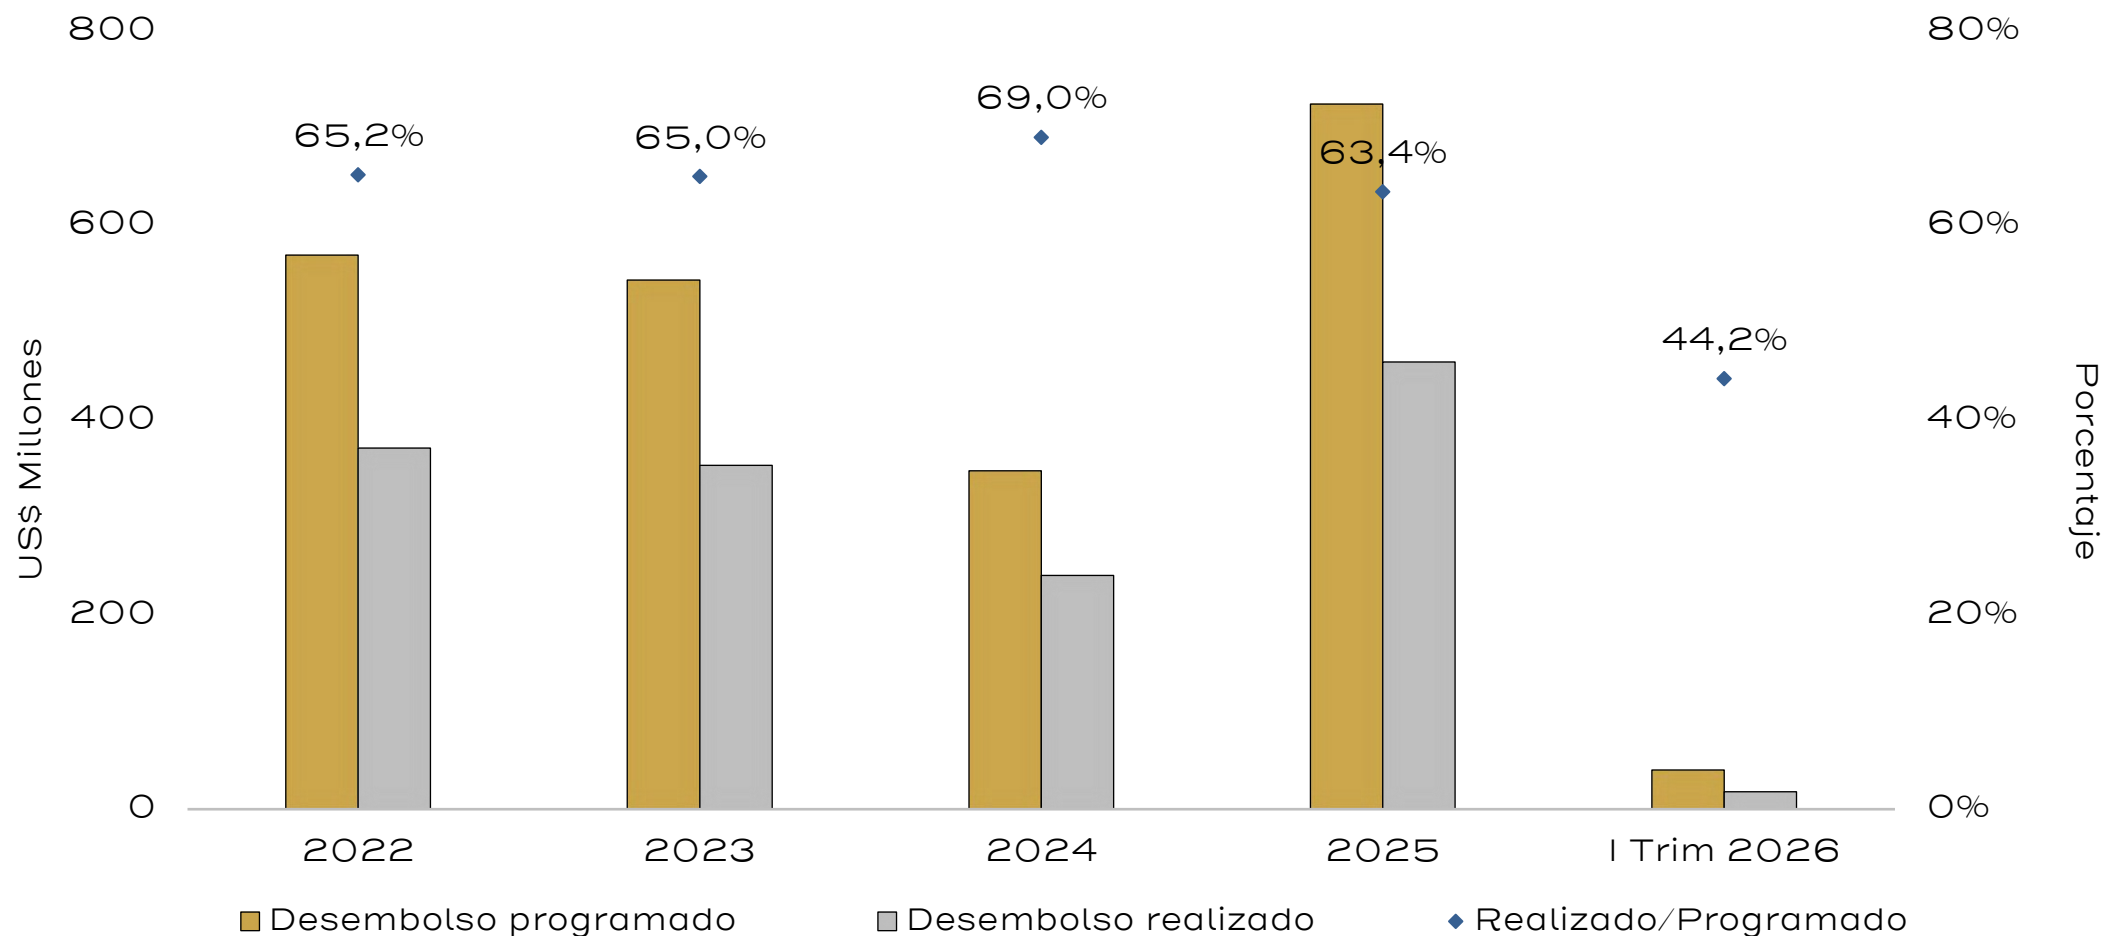

Fuente: DGGDP, MH.

Los datos del I trimestre (programado/realizado) solo contemplan ese periodo.

II. Situación de la cartera de créditos por organismo ejecutor

1. Cartera [MOPT](#)
2. Cartera [AyA](#)
3. Cartera [SENARA](#)
4. Cartera [ICE](#)
5. Cartera [MH](#)
6. Cartera [MJP](#)
7. Cartera [CNE](#)

Cartera de créditos del MOPT

BID 3071/OC-CR y 3072/CH-CR

Programa de Infraestructura de Transporte (PIT).

BID 4507/OC-CR

Programa Red Vial Cantonal II (PRVC II).

BID 4864/OC-CR

Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas (PIV APP).

BID 5823/OC-CR

Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana Conectividad Resiliente (PIV MU).



Programa de Infraestructura de Transporte (PIT)

3071/OC-CR
US\$ 400,00
MILLONES

3072/CH-CR
US\$ 50,00
MILLONES

Monto de los Préstamos


Avance Financiero:

3071/OC-CR : 79,50%

3072/CH-CR: 60,00%

Avance Físico: 65,93%

Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 12/11/2026



Avances

- **Limonal – Barranca – La Angostura:** Ejecución de actividades de compensación ambiental (plantación de material vegetativo), obras complementarias, limpieza y mantenimiento; avance físico 92 %.
- **Ampliación y rehabilitación Limonal – Cañas (RN 1):** Obras finalizadas; contratos en proceso de cierre y finiquito, con avance físico del 100 %.
- **Ruta Nacional 35 – San Carlos:** Punta Sur: en ejecución: ya el diseño está finalizado (100 %); orden de inicio otorgada en junio 2025. Punta Norte: en ejecución. Tramo Central: en proceso de licitación, en revisión final para recomendación de adjudicación y gestión de No Objeción del BID.
- **Administración y gestión del Programa:** Avances superiores al 90 % en supervisión, monitoreo, gestión socioambiental y auditorías financieras; continuidad de consultorías de apoyo.

Programa Red Vial Cantonal II (PRVC II)


**US\$ 144,03
MILLONES**

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 97,19%

Avance Físico: 99,00%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 24/04/2026**



Avances

- **Obras viales cantonales:** Se encuentran en proceso de cierre de contratos correspondientes a los paquetes P10, P11, P12, P13, P14, P22 y P32. Contratos P7, P9 y P26 concluidos.
- **Puentes:** Se completó la construcción o rehabilitación de los puentes de los paquetes P16, P19 y P20. Queda pendiente únicamente la recepción formal de dos puentes del paquete P20 y el cierre administrativo y financiero de los contratos.
- **Mantenimiento rutinario por estándares (MER):** Actividad concluida y cancelada en su totalidad.
- **Gestión del Programa:** Seguimiento a consultorías vigentes, auditoría externa presentada con No Objeción del BID y evaluación final en proceso.

Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas (PIV APP)


**US\$ 125,00
MILLONES**

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 65,20%

Avance Físico: 79,03%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 29/09/2027**



Avances

Taras – La Lima (RN-2)

- Paso inferior La Lima construido.
- Avance de expropiaciones: 97,18% (29 de 30 expedientes liberados). Obras con ejecución intensiva en pavimentos, drenajes, señalización e iluminación.
- Gestión socioambiental activa con contratos vigentes.
- Proyecto en fase final, con conclusión de obras mayores proyectada para el II semestre de 2026.

OBIS

- **San Ramón:** contrato formalizado y orden de inicio con entrada anticipada (enero 2026).
- **Grecia:** contrato formalizado y obras iniciadas (movimiento de tierra).
- **Naranjo:** en proceso de formalización; avance condicionado a la liberación de expropiaciones (14% liberado). Supervisión y gestión social y ambiental en ejecución.
- **Intercambio El Coyol (Lote 3)** Orden de inicio emitida (20/01/2026). Avances concentrados en diseño y estudios técnicos.

Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana Conectividad Resiliente (PIV-MU)


**US\$ 225,00
MILLONES**

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 3,71%

Avance Físico: 17,05%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 10/01/2029**



Avances

Punta Sur

Contrato en ejecución de diseño y obras preliminares.

Actividades: diseño concluido, movimientos de tierra iniciales, preparación de área y gestión de diseño integral.

Avance físico: 16 %.

Punta Norte

Contrato de iluminación vial y pasos aéreos en ejecución.

Actividades: Se encuentra en proceso de diseño de los sistemas de iluminación entre Ciudad Quesada y Florencia.

Avance físico: 85 %. Obras menores de seguridad vial en proceso de preparación de TDR.

Tramo Central

en proceso de licitación, en revisión final para recomendación de adjudicación y gestión de No Objeción del BID.

Constituye la ruta crítica del programa, con impacto directo sobre el plazo global.



Cartera de créditos del AyA

BCIE 2129

Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM (RANC-EE).

BCIE 2164

Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora, Puntarenas.

BCIE 2188-A

Programa Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC).

BCIE 2198

Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón.



Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM (RANC-EE)


**US\$ 130,00
MILLONES**

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 38,46%

Avance Físico: 64,83%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 12/08/2029**



Avances

Agua No Contabilizada: Se mantiene con una reducción acumulada de 3,4 % (meta del programa: 17 %).

Sustitución de medidores: 162.013 unidades instaladas, actividad concluida, con impacto positivo en la facturación.

Servicios de Ingeniería (reducción masiva de pérdidas): Contratos en ejecución, con catastros de usuarios e infraestructura en campo y avance inicial en modelación y sectorización hidráulica. Constituye uno de los componentes estratégicos del programa.

Sistema de Control de Pérdidas (SCP): registra un avance del 85 % y está en etapa de preparación para su lanzamiento institucional.

Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora, Puntarenas.


**US\$ 154,56
MILLONES**

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 43,58 %

Avance Físico: 54,17 %

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 30/10/2027**



Avances

- **Etapa de ejecución:** Los proyectos de San Ramón–Palmares, San Isidro de Pérez Zeledón y Pasito de Alajuela avanzan en su fase final de ejecución, con niveles físico superiores al 90%, evidenciando la consolidación de las obras de almacenamiento, sistemas electromecánicos y redes de distribución. El proyecto de Pérez Zeledón alcanza un 98.16% de avance físico, incorporando progresivamente pruebas operativas, interconexiones y puesta en marcha de componentes críticos.
- **Etapa de licitación:** Los proyectos Juanito Mora y Buenos Aires están en etapas avanzadas del proceso de licitación, con análisis de ofertas finalizados y procesos de adjudicación en curso o en revisión, (próximos a su formalización contractual). Los proyectos Artieda–Caldera y San Pablo de Turrubares avanzan en la actualización de presupuestos, certificaciones y análisis de razonabilidad de precios, así como la consolidación de insumos para publicar la licitación en SICOP.

Programa Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC)


**US\$ 111,12
MILLONES**

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 15,38 %

Avance Físico: 23,39 %

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 28/06/2029**



Avances

- **Etapas de ejecución:** La línea de conducción de Búfalo, que pertenece a la etapa I del proyecto “Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable de Limón”, alcanzó un avance de ejecución del 86% y tiene proyección de finalizar en el II trimestre del año,
- **Etapas de licitación:** De los 4 proyectos, Jacó y Guácimo ya se encuentran en análisis de ofertas con estimación de las recomendaciones de adjudicación en el II trimestre de 2026. El Laboratorio Nacional de Aguas avanza en su proceso de contratación administrativa, el 17 de abril era la fecha para la recepción de ofertas para el diseño y construcción; sin embargo, no se recibieron ofertas por lo que el proceso se da como infructuoso, se realizarán las gestiones para cerrar el proceso e iniciar uno nuevo. Además, para el proyecto de Quepos se realizaron los ajustes a los pliegos y se espera publicar esta contratación en el II trimestre de este año.
- **Etapas de diseño final:** Aprobación de los diseños finales del proyecto Limón Tanques y Redes. Por su parte, el proyecto Limón Producción ya alcanza un 85% de avance, con revisiones técnicas en curso y gestiones de permisos en proceso.

Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón


**US\$ 42,00
MILLONES**

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 38,80 %

Avance Físico: 36,94%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 26/06/2026**



Avances

- Durante este periodo, el Sector 1 del proyecto ha logrado un avance acumulado de construcción del 25.94%, con intervenciones en las cuencas 01, 02, 04, 05, 06, 07, 11 y 13, trabajos preliminares en el colector principal sobre la Ruta Nacional 32 y en la Estación de Pre-Acondicionamiento.

Las principales actividades constructivas desarrolladas incluyeron:

- Instalación de tuberías mediante zanja abierta.
- Colocación de pozos de registro.
- Instalación de previstas domiciliarias.
- Instalación de tuberías por perforación horizontal dirigida.
- Construcción de pozos de registro para labores de microtuneleo.
- Instalación de tuberías mediante microtuneleo.
- Pruebas de deflexión y de presión de aire en tubería sanitaria PVC.
- Pruebas de presión hidrostática en tuberías de impulsión.
- Restitución de carpeta asfáltica en calles intervenidas.
- Mejoramiento de suelos en Estaciones de Bombeo de aguas residuales.
- Instalación de pozos principales en estaciones de bombeo.
- Tramite de nuevas conexiones eléctricas para estaciones de bombeo.
- Remodelación de Estación de Pre-Acondicionamiento.

1/ Estos avances representan únicamente los incrementos marginales correspondientes al AyA.



Cartera de créditos del SENARA

BCIE 2198

Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón.

BCIE 2220

Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME).



Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón


**US\$ 13,08
MILLONES**

Monto del Préstamo

Avance Financiero¹: 83,00%

Avance Físico¹: 88,00%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 26/06/2026**



Avances

- Continúa el avance de las obras en los cauces Chitá-Santa Fe, Quebrada Chocolate, Canal Santa Rosa (Westfalia) y los canales menores, adjudicadas al Consorcio BETA-MP MAREAS. Los avances registrados son:
 - En el I trimestre -2026 se tramitó la adenda N.º 5 del contrato, la cual incluye modificaciones en las cantidades de obra originalmente contratadas, tales como ampliaciones, incrementos y reducciones de materiales y actividades.
 - Esta incluye modificaciones en las cantidades de obra originalmente contratadas, como ampliaciones, incrementos y reducciones de materiales y actividades, además de la inclusión de nuevas actividades no previstas inicialmente debido a ajustes técnicos necesarios durante la ejecución del proyecto.
 - Los esfuerzos logísticos permitieron completar la canalización principal y el hincado de tablestacas satisfactoriamente al cierre de 2025.
 - Se mantiene una supervisión estricta para el cierre de las obras de reparación de vías y se espera que en abril se esté cerrando el contrato.

1/ Estos avances representan únicamente los incrementos marginales correspondientes al Senara.

2/ Incluye la compra de estaciones meteorológicas, sensores de nivel de agua y otros dispositivos de medición necesarios para recopilar datos precisos y en tiempo real.

Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME)


**US\$ 425,00
MILLONES**

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 26,52%

Avance Físico: 11,86%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 14/02/2030**



Avances

- **Procesos de Adquisición.** A) Presa y Vertedor: el 23 de marzo se realizó la apertura de ofertas para dar inicio a la evaluación técnica y financiera. B) Obras de Conducción: se actualizó el estudio hidrológico, los modelos geológicos y geotécnicos. Se avanza la construcción del campamento principal (oficinas, talleres y bodegas), vías de acceso camino a sitio de presa y se construyó el vado. C) Canal Oeste: la Unidad Consultora presentó la primera versión del pliego de condiciones para su construcción y ampliación. D) Supervisión Específica: tras firma del contrato, la orden de inicio se notificó el 16 de marzo. E) Supervisión General: se realizó apertura de ofertas, para dar paso al proceso de evaluación de estas.
- **Plan de gestión socio-ambiental.** Se dieron avances en la elaboración del pliego de condiciones.
- **DIGEP.** Se contrataron 4 de las 5 plazas durante el I trimestre 2026 (auditor, hidrogeólogo, contador de costos y un administrativo).



Cartera de créditos del ICE

JICA CR-P5-2

Proyecto Geotérmico Borinquen I.




US\$ 163,17 MILLONES

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 50,83%

Avance Físico: 51,22%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 27/09/2026**



Proyecto Geotérmico Borinquen I

Avances

- o La empresa consultora West JEC en conjunto con el ICE analizaron las ofertas económicas de los participantes en la licitación del equipamiento electromecánico de la casa de máquinas y una vez concluido el Informe económico, se le solicitó a JICA la no objeción. A pesar de que ya no hay perforación de pozos, porque la actividad ya se concluyó, se mantiene la evaluación geocientífica del yacimiento y se realizaron pruebas de producción al pozo PGB-45.
- o Se realizaron obras de tratamiento de bermas, fabricación y montaje de cimientos de tubería metálica, montaje de tuberías de campo, tubería de concreto, obra civil y metalmecánica estaciones separadora, acceso a sitio de puentes tubo, mejoras en acueducto, entre otros.
- o Se realizaron diversas acciones en el componente ambiental, incluyendo monitoreos de fauna (mamíferos, aves, anfibios, reptiles, ratones, peces y macroinvertebrados),– 615 rescates de fauna en los frentes de trabajo y 12 monitoreos ambientales de ruido, gases y aguas superficiales.
- o En cuanto a intervenciones, se ejecutaron labores de corta de árboles y arbustos en distintas áreas del proyecto, incluyendo obras específicas como el Puente Salitral y la curva de Quebrada Tencha, así como la habilitación de accesos para puentes tubo. También se realizó inventario forestal.
- Se llevaron a cabo reuniones con actores clave, así como el mantenimiento de senderos, la gestión de residuos mediante gestores autorizados y visitas de seguimiento ambiental.



Cartera de créditos del MH

BIRF 9075-CR

Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario (PHD).



Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario (PHD)


**US\$ 126,64
MILLONES**

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 20,59%

Avance Físico: 52,79%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 30/10/2027**



Avances

Contrataciones COTS:

- Adquisición Sistema Financiero y de Talento Humano (Av. Físico: 44,54%).
- Adquisición Sistema Tributario (Av. Físico: 51,51%).
- Adquisición de Sistema Aduanero (Av. Físico: 32,83%).

Contrataciones con avances más representativos (Av. Físico: 100%)

- Sistema de Auditoría Interna.
- Servicio de Digitalización y Gestor Documental en el Ministerio de Hacienda, según demanda.
- Servicios de Consultoría para la definición e implementación de la arquitectura empresarial en el MH.

Otras contrataciones relevantes:

- Servicios de Nube e Interoperabilidad (Av. Físico: 56,18%).
- Servicios de Auditoría y Evaluaciones de Ciberseguridad (Av. Físico: 21,44%).



Cartera de créditos del MJP

BID 4871/OC-CR

Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia.



Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia


**US\$ 100,00
MILLONES**

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 74,92%

Avance Físico: 72,99%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 17/03/2027**



Avances

Delegaciones Policiales finalizadas:

- | | | |
|-------------|--------------------|--------------------|
| - Siquirres | - Desamparados Sur | - Santa Ana |
| - Horquetas | - Puerto viejo | - Puntarenas Norte |
| - Guácimo | - Hatillo | - Abangares |

Centros Cívicos por la Paz finalizados:

- | | |
|------------|--------------|
| - Limón | - Puntarenas |
| - Alajuela | - Corredores |

Centro de Mando y Control Policial:

En ejecución el contrato de construcción (avance físico constructivo: 35%).

Avances en la ejecución de otras actividades:

- Los Experimentos Aleatorios Controlados (EAC) implementados en Puntarenas y en los distritos del cantón central de San José evidenciaron efectos positivos en la reducción del daño delictivo en las zonas intervenidas, así como la presencia de difusión de beneficios sin desplazamiento del delito.
- Finalización del Sistema de Quejas y Denuncias, que ayuda con la legitimidad policial de la fuerza pública y la transparencia de la gestión policial.



Cartera de créditos de la CNE

BCIE 2317

Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI).

BIRF 9502-CR

Segundo Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO).



Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI)


**US\$ 700,00
MILLONES**

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 29,65%

Avance Físico: 33,40%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 17/06/2030**



Avances

- Al cierre del I trimestre se contó con un total de 456 proyectos vigentes en el Plan de Inversión del programa y 57 proyectos excluidos (18 de ellos fueron descartados por la Junta Directiva de la CNE en el I trimestre 2026).
- Se detalla el estado de ejecución de los proyectos, según la etapa reportada por la CNE:
 - El 34% se encuentra en diferentes procesos de contratación para estudios, diseños y/o construcción, según la estrategia de adquisiciones aplicada.
 - El 20% se encuentra en etapa de construcción (desde movimientos de tierra hasta ejecuciones más avanzadas).
 - El 18% está en elaboración de Diseños de obras.
 - El 14% está en elaboración de Estudios de preinversión.
 - El 10% está en *fase de cierre y finalización* de proyectos (20 proyectos se encuentran finalizados).
 - El 4% no ha iniciado ejecución.
- Actualmente se encuentran en proceso de exclusión 15 proyectos (incluidos dentro del 4% que no ha iniciado ejecución).
- La CNE replanteó la Metodología de seguimiento para el cálculo del avance físico de los proyectos, según tipología de contratación.

Segundo Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO)


**US\$ 160,00
MILLONES**

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 0,00%

Avance Físico: No aplica

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 24/03/2029**



Avances

- Al 31 de marzo no se han desembolsado recursos del crédito, por cuanto no ha sido declarado a la fecha ningún estado de emergencia que requiera del uso de estos fondos.
- Al tratarse de un instrumento de cobertura ex ante, es decir, que se contrata previo a que ocurra un desastre, es que en el contrato de préstamo no se especifican los proyectos que serían financiados con los recursos del préstamo, ni se incluyen categorías a financiar.
- En relación con el período de disponibilidad de los fondos de la operación, se realizaron las gestiones correspondientes ante el Banco Mundial para prorrogar la fecha de cierre del Contrato de Préstamo N°9502-CR. Dicha solicitud fue evaluada y aprobada, autorizándose así la extensión de la disponibilidad de los recursos hasta el año 2029.



MINISTERIO
DE HACIENDA

GOBIERNO
DE COSTA RICA

Programas/Proyectos de inversión financiados con recursos externos

Gobierno Central y Resto del Sector Público

Dirección General de Gestión de Deuda Pública

Al 31 de marzo 2026
