



MINISTERIO  
DE HACIENDA

GOBIERNO  
DE COSTA RICA

# **Programas/Proyectos de Inversión financiados con recursos externos**

## **Gobierno Central y Resto del Sector Público**

### **Al 30 de setiembre 2025**

Dirección General de Gestión de Deuda Pública



# Contenido

- I. Situación general de la Cartera de créditos de inversión pública
- II. Situación de la Cartera de créditos por Organismo Ejecutor
  - Cartera MOPT
  - Cartera AyA
  - Cartera SENARA
  - Cartera ICE
  - Cartera MH
  - Cartera MJP
  - Cartera COMEX
  - Cartera CNE

# I. Situación general de la cartera de créditos de inversión pública

# Cartera de créditos de inversión pública en ejecución



**Monto de la cartera:** US\$ 3.316,74 millones

**Total de créditos:** 17

**Total de programas/proyectos:** 16



**Ejecutores más representativos:** MOPT, CNE, AyA, SENARA, e ICE.

**Acreedores:** BCIE, BID, BIRF, y JICA.



**Características de la deuda:**


- 12 créditos: Gobierno es Deudor.
- 5 créditos: Instituciones son deudoras (en 2 de ellos el Gobierno es Garante).



**Plazo Promedio de Ejecución de la Cartera\*:** 104,78 meses


\*Para efectos del cálculo del plazo promedio de ejecución de la cartera, se considera la fecha límite de desembolsos vigente o bien, su expectativa de conclusión según el avance del programa/proyecto.

## Participación de los acreedores y préstamos externos al III trimestre 2025

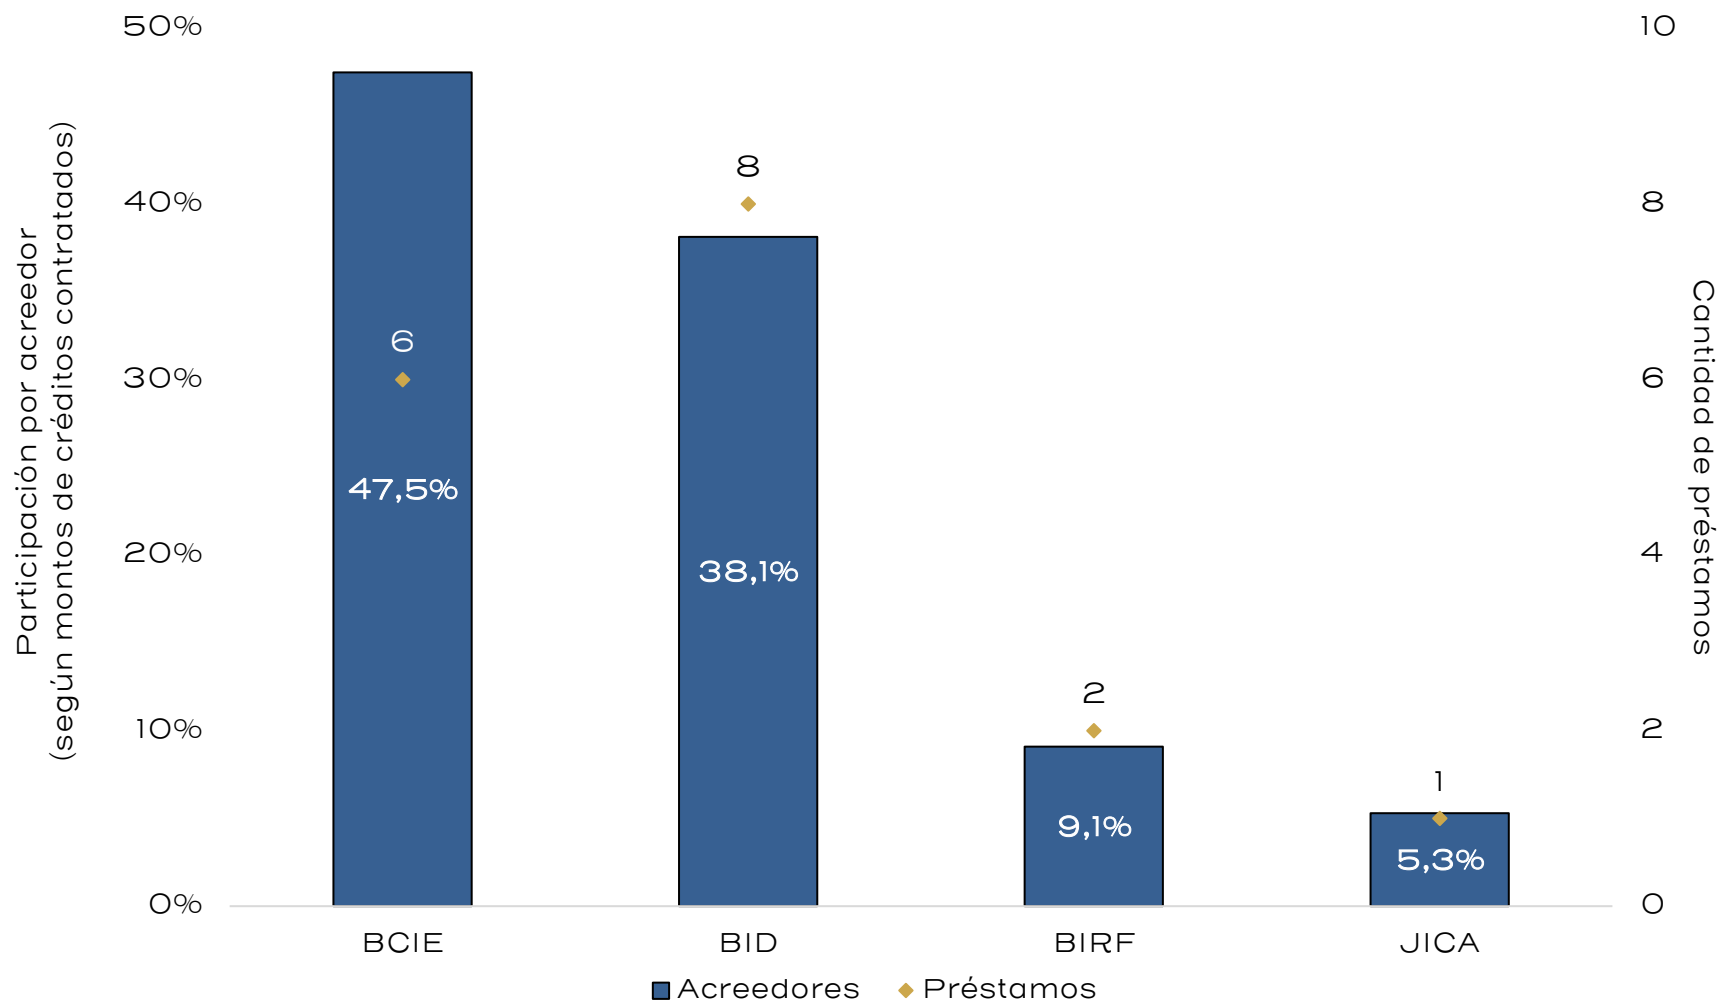




Fuente: DGGDP, MH.
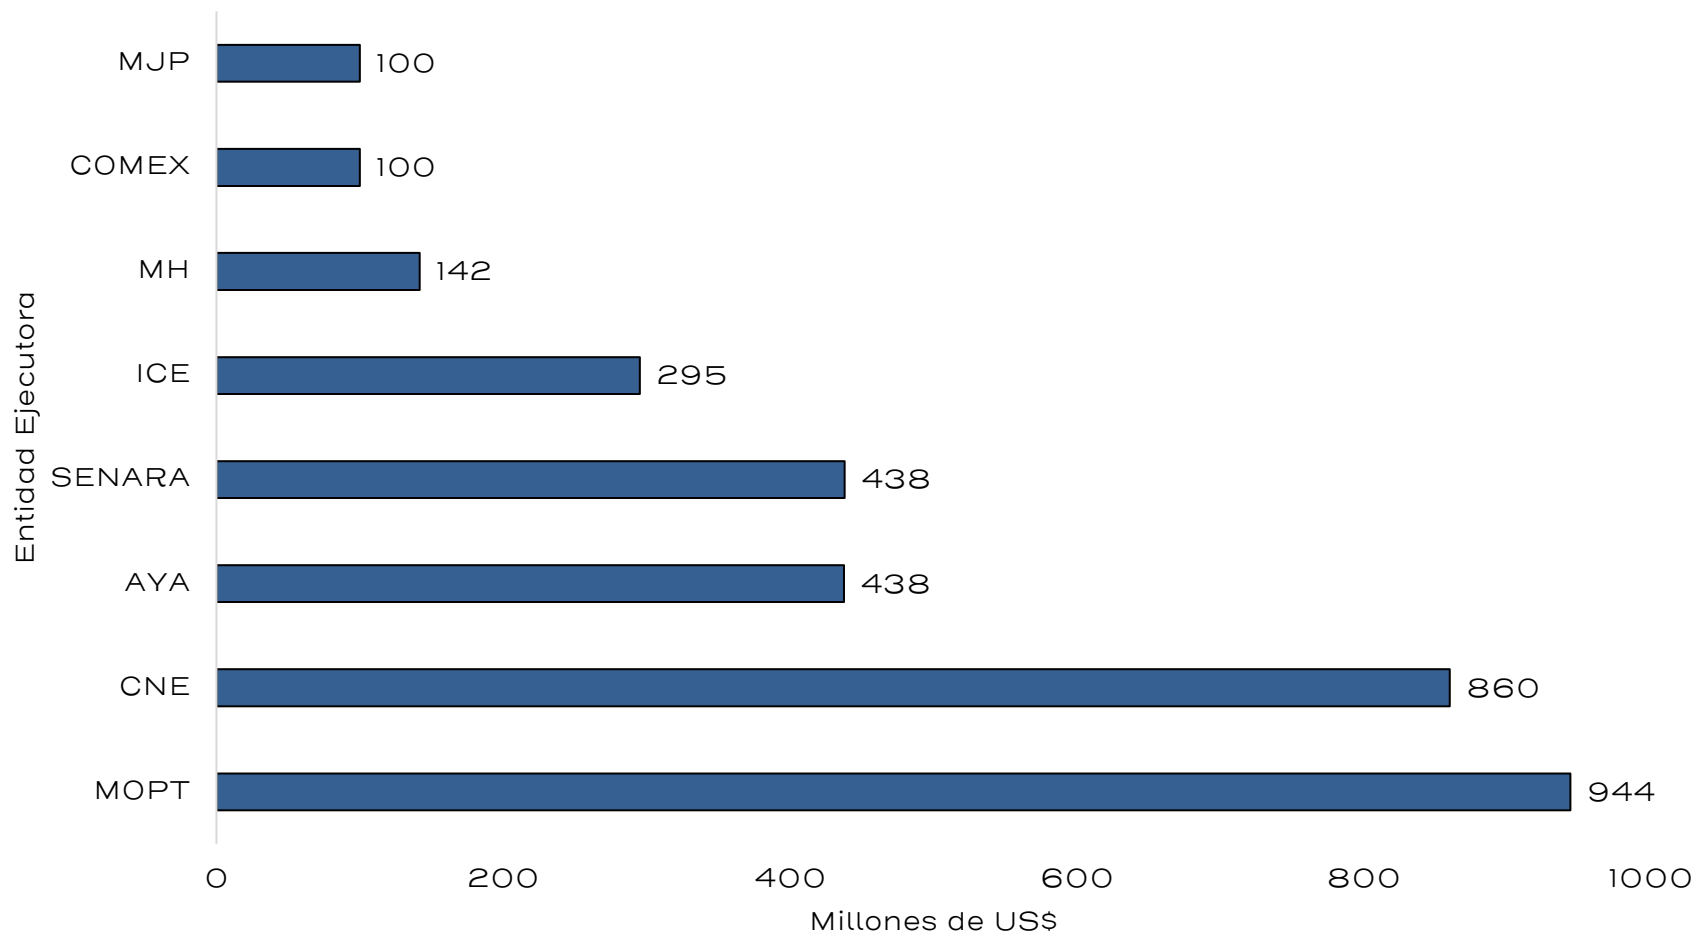
## Montos de Préstamos externos por entidad ejecutora al III trimestre 2025



Fuente: DGGDP, MH.

# Situación de los programas/proyectos de inversión pública


Entidad Ejecutora	Monto total del financiamiento de los programas/proyectos (US\$)	Monto pendiente por desembolsar (US\$)	Número de Programas/Proyectos	Número de préstamos	Desempeño del Programa/Proyecto <sup>1/</sup>		
							
MOPT	944 036 000,00	366 198 832,26	4	5		3	1
CNE <sup>2/</sup>	860 000 000,00	652 435 889,12	2	2	1		
AYA	395 691 200,29	275 248 700,80	3	3	1	2	
SENARA	425 000 000,00	312 299 285,50	1	1		1	
ICE	295 290 073,77	130 780 022,82	2	2		2	
MH	141 640 000,00	123 393 120,72	1	1		1	
COMEX	100 000 000,00	0,00	1	1		1	
MJP	100 000 000,00	35 076 383,24	1	1		1	
AYA/ SENARA	55 080 000,00	26 860 000,00	1	1		1	
<b>Total</b>	<b>3 316 737 274,05</b>	<b>1 922 292 233,77</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>

1/ Desempeño calculado con corte a junio 2025.

2/ El Crédito 9502-CR será ejecutado en caso de una declaratoria de emergencia nacional, por lo cual no le aplica medición de desempeño.

Fuente: DGGDP, MH.

# Desembolsos programados respecto a los desembolsos realizados del 2020 al III trimestre 2025

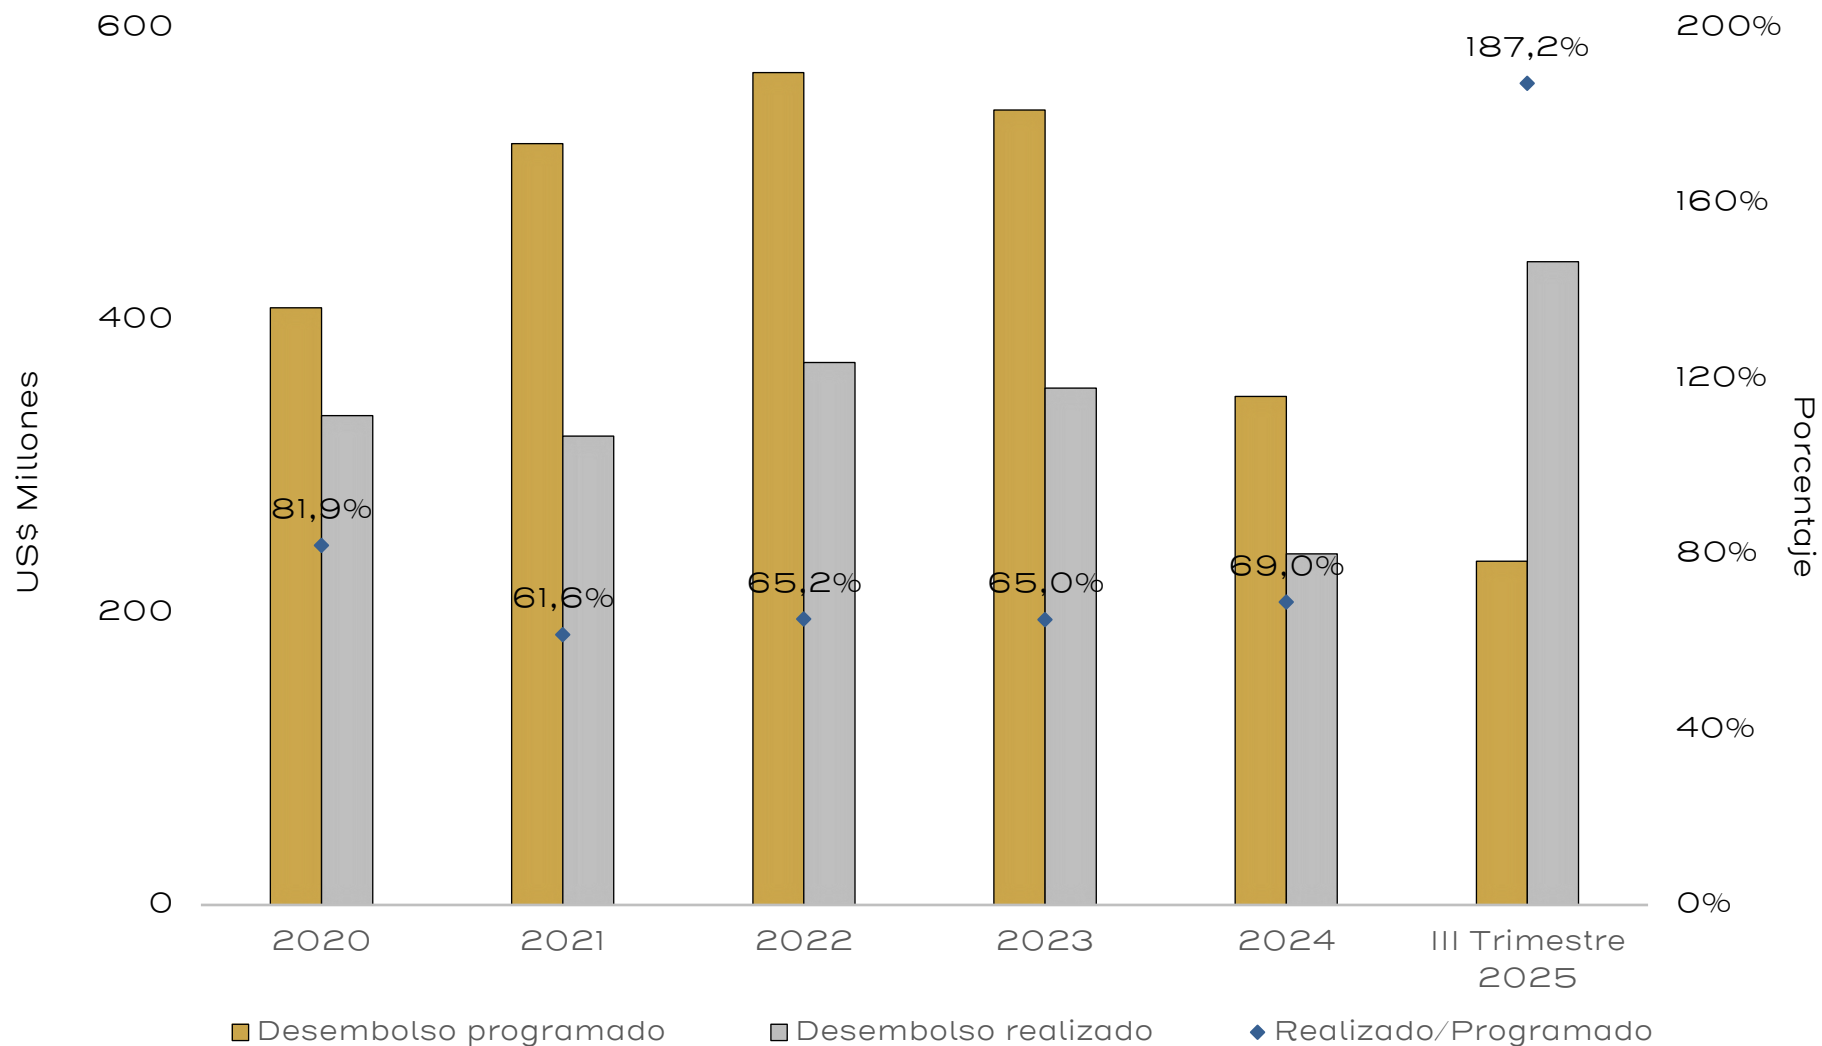

Fuente: DGGDP, MH.



## II. Situación de la cartera de créditos por organismo ejecutor

1. Cartera [MOPT](#)
2. Cartera [AyA](#)
3. Cartera [SENARA](#)
4. Cartera [ICE](#)
5. Cartera [MH](#)
6. Cartera [MJP](#)
7. Cartera [COMEX](#)
8. Cartera [CNE](#)

## Cartera de créditos del MOPT

**BID 3071/OC-CR y 3072/CH-CR**

Programa de Infraestructura de Transporte (PIT).

**BID 4507/OC-CR**

Programa Red Vial Cantonal II (PRVC II).

**BID 4864/OC-CR**

Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas (PIV APP).

**BID 5823/OC-CR**

Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana Conectividad Resiliente (PIV MU).



# Programa de Infraestructura de Transporte (PIT)

**3071/OC-CR**  
**US\$ 400,00 MILLONES**


**3072/CH-CR**  
**US\$ 50,00 MILLONES**

Monto de los Préstamos

**Avance Financiero:**  
**3071/OC-CR : 79,50%**  
**3072/CH-CR: 60,00%**

**Avance Físico: 63,23%**

**Fecha Límite de Desembolsos:**  
**12/11/2026**



## Avances

- En el proyecto Limonal – Barranca: se tiene un avance en ejecución de actividades como la plantación de material vegetativo, limpieza y mantenimiento, con un progreso del 92%.
- Diseño y Construcción de la nueva carretera a San Carlos RN 35: Punta Sur el cual tiene un avance del 100% en el diseño, y se dio la orden de inicio en junio 2025; Punta Norte se encuentra en ejecución, y el Tramo Central se encuentra en etapa de licitación.

# Programa Red Vial Cantonal II (PRVC II)


**US\$ 144,03  
MILLONES**

Monto del Préstamo

**Avance Financiero: 97,19%**

**Avance Físico: 96,00%**

**Fecha Límite de Desembolsos  
Vigente: 24/04/2026**



## Avances

- o La Campaña Comunicacional sobre Movilidad Sostenible: avanzó en la revisión y depuración de la Guía Didáctica respectiva y se remitieron a la UEC-MOPT las listas de verificación de los entregables del contrato. Se iniciaron las pautas en radio y medios digitales. El contrato presenta un avance del 75% en su ejecución.<sup>1/</sup>
- o Producto 6- Caminos Cantonales Rehabilitados: alcanzó un 96% de avance, destacando el avance de las obras del paquete P10, P11, P12, P13, P14, P22 y P32. Producto 7- Construcción de estructuras de puentes y alcantarillas mayores: avance se mantiene con registro de un 90%; destacando el avance para las obras de los paquetes P16 y P19.
- o Se mantiene el registro de avance de 366,12 km de caminos cantonales rehabilitados y 405 mts. de construcción de puentes en el marco del Programa.

<sup>1/</sup> Se tramitó la segunda prórroga solicitada por la UE, la nueva fecha de finalización sería II trimestre del 2026.

# Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas (PIV APP)


**US\$ 125,00  
MILLONES**

Monto del Préstamo

**Avance Financiero: 65,20%**

**Avance Físico: 76,98%**

**Fecha Límite de Desembolsos  
Vigente: 29/09/2027**



## Avances

- **Taras - La Lima (89,45%):** Finalizó la construcción del paso inferior La Lima, además de la colocación de barandas y señalización vial. Las expropiaciones registraron un 97 % de avance, con solo algunos expedientes en trámite judicial, y la gestión socioambiental mantuvo contratos activos de seguimiento en campo. El proyecto se encuentra en su fase final de construcción, dentro del cronograma establecido, y se proyecta su conclusión física para diciembre de 2025.
- **OBIS:** Pasos elevados de Grecia y San Ramón recibieron la orden de inicio en julio de 2025, con un plazo de ejecución de 18 meses. El intercambio El Coyol se encuentra en proceso de adjudicación, teniendo previsto adjudicar al cierre del 2025, mientras que el intercambio de Naranjo está en trámite de formalización del contrato, el cual se espera concretar al cierre del 2025.

# Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana Conectividad Resiliente (PIV-MU)

**US\$ 225,00  
MILLONES**

Monto del Préstamo

**Avance Financiero: 3,71%**

**Avance Físico: 13,94%**

**Fecha Límite de Desembolsos  
Vigente: 10/01/2029**



## Avances

### Punta Sur

Orden de inicio: se otorgó en junio 2025.

Obras en ejecución: movimientos de tierra y actividades preliminares de construcción con un avance del 15%.

### Punta Norte

Obras en ejecución: mejoramiento vial, estabilización de taludes, construcción de drenajes y obras complementarias con un avance del 28%.

### Tramo Central

Etapa: En proceso de licitación – en fase de evaluación técnica, a la espera de No Objeción del BID.

Actividades: gestión de consultorías de apoyo al programa.

# Cartera de créditos del AyA



## **BCIE 2129**

Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM (RANC-EE).

## **BCIE 2164**

Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora, Puntarenas.

## **BCIE 2188-A**

Programa Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC).

## **BCIE 2198**

Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón.



# Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM (RANC-EE)


**US\$ 130,00  
MILLONES**

Monto del Préstamo

**Avance Financiero: 36,92%**

**Avance Físico: 57,84%**

**Fecha Límite de Desembolsos  
Vigente: 12/08/2029**



Al cierre del III trimestre 2025, se presenta un avance del Agua No Contabilizada de 3,4%, cuya meta es 17%.

La licitación 030 asignada al componente Eficiencia Energética, están proceso de adjudicación. Misma que se espera quede en firme durante el primer trimestre 2026.

## Avances

Sustitución de medidores: 107,511 instalados (81% del total, 90% de la meta 2025); meta ajustada por retrasos y dificultades<sup>1/</sup> presentados; se prevé completar en 2026 con 40,000 unidades restantes a licitar o coordinar.

**Nota:** Retrasos por aprobaciones externas, dificultades logísticas, falta de mantenimiento en medidores y exclusión de “Zonas Peligrosas” por daños recurrentes.



# Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario

## Juanito Mora, Puntarenas.


**US\$ 154,56  
MILLONES**

Monto del Préstamo

**Avance Financiero: 35,81%**

**Avance Físico: 48,39%**

**Fecha Límite de Desembolsos  
Vigente: 30/10/2027**



- Ampliación del acueducto de San Pablo de Turrubares
  - Etapa II: La adquisición de terrenos permanece en trámite en el Juzgado Contencioso Administrativo, el cual informó que el expediente se encuentra en “casilla para resolver”, esperando novedades sobre la resolución durante el IV trimestre 2025.



- Mejoras al sistema de acueducto de Cóbano, Puntarenas
  - Etapa II: Proyecto finalizado en su totalidad, con recepción definitiva otorgada el 14 de julio del 2025 y traslado formal al área operativa, marcando el cierre administrativo y técnico del proyecto.

### Avances

- Mejoras Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la Zona Oeste de San José
  - Etapa I: El diseño fue entregado en setiembre 2025. Para la etapa de ejecución física se generó la orden de inicio comenzando el 30 de octubre 2025.
  - Etapa IV: Proyecto finalizado con recepción parcial de obras dada el 22 de agosto del 2025 y la recepción definitiva de obras fue el 22 de octubre 2025,

# Programa Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC)


**US\$ 111,12  
MILLONES**

Monto del Préstamo

**Avance Financiero: 15,38%**

**Avance Físico: 15,76%**

**Fecha Límite de Desembolsos  
Vigente: 28/04/2026**



## Avances

- o Etapa de ejecución: La línea de conducción de Búfalo, que pertenece a la etapa I del proyecto “Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable de Limón”, alcanzó un avance de ejecución del 40,51%.
- o Etapa de licitación: Se encuentran 3 proyectos: “Mejoras al acueducto de Guácimo” (en apertura de ofertas y se proyecta concluir el proceso de licitación en noviembre del 2025), “Mejoras y ampliación del Sistema de acueducto de Jacó” (inició el proceso en julio con la revisión de los documentos de licitación, se espera publicar en octubre del 2025) y “Construcción del edificio Laboratorio Nacional de Aguas” (luego de un análisis comparativo, el AyA determinó que la construcción será en La Unión de Cartago, se trabajó en la actualización de documentos licitatorios para publicarlos aproximadamente en diciembre 2025).
- o Etapa de diseño final: Están los proyectos, “Mejoras al acueducto de Quepos – Manuel Antonio” y dos etapas del “Proyecto Mejoras al Sistema de abastecimiento de agua potable de Limón: Tanques y Redes y Limón Producción”. Al cierre del III trimestre se logró un 75% de avance en la revisión de los diseños de Quepos y un 99% de avance en los diseños de Tanques y Redes. En el caso de Limón Producción se tiene un 54% de avance de la elaboración de los diseños por parte del Consultor de Implementación.

# Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón

**US\$ 42,00  
MILLONES**

Monto del Préstamo que  
ejecutará AyA

**Avance Financiero<sup>1</sup>: 38,10%**

**Avance Físico<sup>1</sup>: 26,31%**

**Fecha Límite de Desembolsos  
Vigente: 26/06/2026**



- Durante el III trimestre, el Sector 1 del proyecto presentaron avances en diversos frentes de trabajo. Se mantuvo la ejecución de las actividades constructivas en las cuencas 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 11 y 13, las cuales incluyeron la instalación de tuberías, colocación de pozos de registro, ejecución de previstas domiciliarias, realización de pruebas de tuberías, fabricación de elementos de concreto, mejoramiento de suelos y restitución de la carpeta asfáltica en los tramos intervenidos.

## Avances

- La apertura progresiva de frentes de trabajo aumentó de 1 a 15 entre los meses de enero a septiembre del presente año, esto ha mejorado la capacidad operativa, permitiendo mayor simultaneidad y eficiencia en la ejecución.

<sup>1/</sup> Estos avances representan únicamente los incrementos marginales correspondientes al AyA.



## Cartera de créditos del SENARA

### **BCIE 2198**

Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón.

### **BCIE 2220**

Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME).



# Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón

**US\$ 13,08  
MILLONES**

Monto del Préstamo que  
ejecutará SENARA

**Avance Financiero<sup>1</sup>: 93,43%**

**Avance Físico<sup>1</sup>: 73,00%**

**Fecha Límite de Desembolsos  
Vigente: 26/06/2026**



## Avances

- Continúa el avance de las obras en los cauces Chitá-Santa Fe, Quebrada Chocolate, Canal Santa Rosa (Westfalia) y los canales menores, adjudicadas al Consorcio BETA-MP MAREAS. Los avances registrados son:
  - En este trimestre se aprobó el reconocimiento de plazo por condiciones climáticas por un plazo de 29 días, que extiende la fecha de finalización hasta el 4 de octubre del 2025.
  - Se concluyó la excavación del Canal Santa Rosa y se finalizó la excavación en el Canal Colina, tramo Río Limoncito.
  - En las obras auxiliares, se registró avance en la construcción de cajas de registro primarias y secundarias, así como en la planificación y ejecución de los puentes peatonales.
- Licitación para la contratación y adquisición de equipo de medición<sup>2</sup>: El avance al cierre de este informe contempla la revisión final de los términos de referencia, para ser remitidos en primera instancia a la Comisión de Licitaciones y posteriormente a No Objeción de BCIE. Esperando llevar a cabo la publicación en enero 2026.
- Para la licitación del Plan de Educación Ambiental, se prevé la adjudicación a la Asociación Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA). Se espera que el contrato sea firmado durante el mes de octubre 2025, permitiendo el inicio del plan a finales de ese mes o a comienzos de noviembre.

<sup>1</sup>/ Estos avances representan únicamente los incrementos marginales correspondientes al Senara.

<sup>2</sup>/ Incluye la compra de estaciones meteorológicas, sensores de nivel de agua y otros dispositivos de medición necesarios para recopilar datos precisos y en tiempo real.

# Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME)

**US\$ 425,00  
MILLONES**

Monto del Préstamo

**Avance Financiero: 26,52%**

**Avance Físico: 10,53%**

**Fecha Límite de Desembolsos  
Vigente: 14/02/2030**



## Avances

- **Procesos de Adquisición.** A) Tras la no objeción del BCIE el pliego de condiciones de presa y vertedor se publicó el 16 de setiembre (apertura de ofertas programada para el 21 de enero de 2026). B) Las obras de conducción recibieron su orden de inicio el 15 de julio, iniciando así su fase de ejecución. C) La supervisión para las obras de conducción cerró trimestre en proceso de revisión de ofertas. D) La auditoría externa recibió la no objeción del BCIE para su adjudicación el 29 de setiembre.
- **Plan de gestión socio-ambiental.** En coordinaciones con PROCOMER para establecer la metodología de trabajo y las especificaciones técnicas del plan de desarrollo. Continúan las obras de la comunidad de Falconiana.
- **Adquisición de Terrenos<sup>1/</sup>.** Continuaron los avalúos, adquisición de terrenos y elaboración de diseños de infraestructura para el canal del oeste, alcanzando un 74%.

<sup>1/</sup> Para el Sitio de Presa y Embalse el avance alcanzó el 100,00% durante el año 2024.



## Cartera de créditos del ICE

### **BID 3589/OC-CR**

Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad.

### **JICA CR-P5-2**

Proyecto Geotérmico Borinquen I.



# Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad

**US\$ 119,56  
MILLONES**

Monto del Préstamo

**Avance Financiero: 100%<sup>1/</sup>**

**Avance Físico: 99,51%**

**Fecha Límite de Desembolsos  
Vigente: 07/08/2025**



## Avances

- o Cumplimiento del 100% de los desembolsos del Contrato de Préstamo, considerando la cancelación automática que realizó el BID sobre el saldo no desembolsado de S\$1,731,648.90.
- o Adquisición de materiales para refuerzo de la red de distribución: Continúa el proceso de instalación de las líneas de distribución de acuerdo con la programación para finalizar en diciembre 2025.
- o Durante el III trimestre se lleva un total de 10,858 luminarias LED instaladas. lo que dará un total general de 75.071.
- o Continúa el proceso de instalaciones de medidores AMIS<sup>2/</sup>, durante el III trimestre se instalaron 28.000 unidades, con lo cual quedan 16.000 pendientes para el IV trimestre.
- o SMART GRID<sup>3/</sup>: Continúa el proceso de instalación dentro del proyecto de digitalización y modernización del sistema de distribución en operación, y no se prevén atrasos en las actividades programadas para diciembre.

1/ En esta operación se rescindió un monto total de US\$14,93 millones del contrato, alcanzándose así un avance financiero del 100%

2/ AMI: Medidores inteligentes para optimización del proceso de lectura, conexión y desconexión de usuarios.

3/ Smart Grid: se refiere a la Red Eléctrica Inteligente.



# Proyecto Geotérmico Borinquen I

**US\$ 175,72  
MILLONES**

Monto del Préstamo

**Avance Financiero: 25,58%**

**Avance Físico: 49,83%**

**Fecha Límite de Desembolsos  
Vigente: 27/09/2026**



- Desarrollo de yacimiento geotérmico: Se finalizó la perforación del pozo PGB-28 y solo se está a la espera de las pruebas de funcionamiento de los pozos PGB-45 y PGB-28, por lo que se sigue con la evaluación geocientífica del yacimiento. Actualmente cuenta con un avance acumulado de 99,07%.
- Casa de máquinas: La empresa consultora West JEC colabora con el ICE en la revisión de las condiciones técnicas de las ofertas recibidas el 18 de septiembre de 2025, correspondientes al proceso licitatorio para el equipamiento de la Casa de Máquinas. Actualmente se realiza la evaluación de los requerimientos técnicos de las dos empresas participantes<sup>1/</sup>. La comunicación sobre la oferta que cumpla con los requisitos está prevista para enero de 2026.
- Sistemas de Recolección: En este trimestre se continúa con la realización de tratamientos a los taludes, pasoductos, se continuó con la fabricación y montaje de cimientos de concreto y soportes metálicos para sistema tubería metálica, montaje de tuberías de campo, tubería de concreto entre otros. Se finalizó impermeabilización en lagunas de reinyección. Avance acumulado de 38,22%.

<sup>1/</sup> Se recibieron dos ofertas (Grupo COX con fabricante Toshiba y Lindsayca con fabricante Baker Hughes)



# Cartera de créditos del MH

**BIRF 9075-CR**

Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario (PHD).



# Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario (PHD)

**US\$ 141,64  
MILLONES**

Monto del Préstamo

**Avance Financiero: 12,88%**

**Avance Físico: 45,89%**

**Fecha Límite de Desembolsos  
Vigente: 30/10/2027**



## Contrataciones COTS:

- Adquisición Sistema Financiero y de Talento Humano (Av. Físico: 44,54%).
- Adquisición Sistema Tributario (Av. Físico: 51,51%).
- Adquisición de Sistema Aduanero (Av. Físico: 32,83%).



## Avances

## Contrataciones con avances más representativos (Av. Físico: 100%)

- Sistema de Auditoría Interna.
- Servicio de Digitalización y Gestor Documental en el Ministerio de Hacienda, según demanda.
- Servicios de Consultoría para la definición e implementación de la arquitectura empresarial en el Ministerio de Hacienda.

## Otras contrataciones relevantes:

- Servicios de Nube e Interoperabilidad (Av. Físico: 56,18%).
- Servicios de Auditoría y Evaluaciones de Ciberseguridad (Av. Físico: 21,44%).



## Cartera de créditos del MJP

**BID 4871/OC-CR**

Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia.



# Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia

**US\$ 100,00  
MILLONES**

Monto del Préstamo

**Avance Financiero: 64,92%**

**Avance Físico: 57,42%**

**Fecha Límite de Desembolsos  
Vigente: 17/03/2027**



## Delegaciones Policiales finalizadas:

- ✓ Siquirres
- ✓ Horquetas
- ✓ Guácimo
- ✓ Desamparados Sur
- ✓ Puerto viejo
- ✓ Santa Ana
- ✓ Puntarenas Norte



## Centro Cívico por la Paz finalizado:

- ✓ Corredores
- ✓ Puntarenas
- ✓ Limón

**Centro de Mando y Control Policial:** Diseño finalizado y culminación de demolición del edificio que será reconstruido. Previsto inicio de construcción en octubre 2025.

## Avances

### Avances en la ejecución de otras actividades:

- ✓ Validación formal del Manual de Capacitación en Doctrina Institucional y Legitimidad Policial, la Caja de Herramientas para Fortalecer la Legitimidad y Confianza en el Servicio Policial, el Código de Conducta de la Unidad de Asuntos Internos, entre otros.
- ✓ Compra de dos servidores informáticos para la Unidad de Asuntos Internos y otro para la Academia Nacional de Policía, asimismo se adquirió una licencia Moodle.



# Cartera de créditos de COMEX

**BID 3488/OC-CR**

Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica (PIF).



# Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica (PIF)


**US\$ 100,00  
MILLONES**

Monto del Préstamo

**Avance Financiero: 100,00%**

**Avance Físico: 93,54%**

**Fecha Límite de Desembolsos  
Vigente: 31/12/2025**



## Avances

- **Puesto Fronterizo Peñas Blancas (CCF PB).** Concluyó la construcción del Edificio H (Migración) y casi en su totalidad la remodelación del Edificio A (alojamiento de funcionarios, la cual requirió una variación en el sistema de agua potable), con lo cual este centro alcanzó un avance físico de 95%. Además, todas las actividades del Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI) fueron ejecutadas y las concesiones de INDER para las familias beneficiarias, aprobadas.
- **Avances en productos informáticos:**
  - Las consultorías de desarrollo de la Expansión de VUCE y del Módulo de Gestión de Riesgos alcanzaron avances de 61% y 31% respectivamente.
  - **Sistema de gestión de puestos fronterizos.** Su avance alcanzó el 90%, al completar la instalación del total de los dispositivos requeridos en el CCF PB.
- **Puesto Fronterizo Paso Canoas (CCI PC).** Se notificó la intención de adjudicar la licitación para recolección de información para calcular indicadores de tiempo y costos.



## Cartera de créditos de la CNE

### **BCIE 2317**

Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI).

### **BIRF 9502-CR**

Segundo Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO).





# Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI)


**US\$ 700,00  
MILLONES**

Monto del Préstamo

**Avance Financiero: 29,65%**

**Avance Físico: 22,84%**

**Fecha Límite de Desembolsos  
Vigente: 17/06/2030**



Para el cierre del III trimestre se contó con un total de 463 proyectos, de los cuales 28 finalizaron (y se pagaron totalmente) o se encontraban en proceso de cierre (construcción).

No se realizaron exclusiones de proyectos en este trimestre (durante el I semestre 39 proyectos quedaron excluidos con base en acuerdos de la Junta Directiva de la CNE).

Comisión Nacional de Emergencias: 181 proyectos / US\$161,71 millones.

Estado de los proyectos que permanecen en el Plan de Inversión:

- Sin avances: 18
- En proceso de contratación estudios preinversión: 40
- En elaboración de estudios preliminares: 9
- En contratación de diseños o diseños/construcción: 32
- En elaboración de diseños: 24
- En construcción de obras: 36
  - Obras preliminares: 5
  - Construcción: 31
- Construcción finalizada y/o proceso de cierre: 22



## Avances

## CONAVI: 163 proyectos / US\$347,39 millones.

Estado de los proyectos que permanecen en el Plan de Inversión:

- Sin avances: 1
- En proceso de contratación estudios preinversión: 106
- En elaboración de estudios preliminares: 46
- En contratación de diseños o diseños/construcción: 4
- En elaboración de diseños: 0
- En construcción de obras: 5
  - Obras preliminares: 0
  - Construcción: 5
- Construcción finalizada en proceso de cierre: 1



## **Avances**

### MEP: 46 proyectos / US\$135,62 millones.

Estado de los proyectos que permanecen en el Plan de Inversión:

- Sin avances: 6
- En proceso de contratación estudios preinversión: 11
- En elaboración de estudios preliminares: 0
- En contratación de diseños o diseños/construcción: 22
- En elaboración de diseños: 0
- En construcción de obras: 7
  - Obras preliminares: 0
  - Construcción: 7
- Construcción finalizados o en proceso de cierre: 0

## INCOFER: 71 proyectos / US\$50,56 millones.

Estado de los proyectos que permanecen en el Plan de Inversión:

- Sin avances: 0
- En proceso de contratación estudios preinversión: 49
- En elaboración de estudios preliminares: 17
- En contratación de diseños o diseños/construcción: 1
- En elaboración de diseños: 0
- En construcción de obras: 0
  - Obras preliminares: 0
  - Construcción:
- Construcción finalizada: 4



## Avances

### MIVAH: 2 proyectos / US\$4,72 millones.

Estado de los proyectos que permanecen en el Plan de Inversión:

- Sin avances: 1
- En proceso de contratación estudios preinversión: 0
- En elaboración de estudios preliminares: 0
- En contratación de diseños o diseños/construcción: 0
- En elaboración de diseños: 0
- En construcción de obras: 0
  - Obras preliminares: 0
  - Construcción: 0
- Construcción en proceso de cierre: 1

# Segundo Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO)

**US\$ 160,00  
MILLONES**

Monto del Préstamo

**Avance Financiero: 0,00%**

**Avance Físico: No aplica**

**Fecha Límite de Desembolsos  
Vigente: 24/03/2026**



## Avances

- Aprobado por la Asamblea Legislativa mediante la Ley N°10622, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°231 el 9 de diciembre de 2024. Al 30 de setiembre no se han desembolsado recursos del crédito, por cuanto no ha sido declarado a la fecha ningún estado de emergencia que requiera del uso de estos fondos.
- Al tratarse de un instrumento de cobertura ex ante, es decir, que se contrata previo a que ocurra un desastre, es que en el contrato de préstamo no se especifican los proyectos que serían financiados con los recursos del préstamo, ni se incluyen categorías a financiar.
- El periodo de disponibilidad de los fondos de esta operación vence al finalizar el I trimestre del 2026, es por esta razón que se espera realizar ante el banco las gestiones necesarias para la respectiva solicitud de prórroga a dicho plazo.



MINISTERIO  
DE HACIENDA

GOBIERNO  
DE COSTA RICA

# **Programas/Proyectos de Inversión financiados con recursos externos**

## **Gobierno Central y Resto del Sector Público**

### **Al 30 de setiembre 2025**

Dirección General de Gestión de Deuda Pública

