



MINISTERIO
DE HACIENDA

GOBIERNO
DE COSTA RICA

Programas/Proyectos de Inversión financiados con recursos externos

Gobierno Central y Resto del Sector Público

Al 30 de setiembre 2024

Dirección General de Gestión de Deuda Pública

Contenido

- I. Situación general de la Cartera de créditos de inversión pública
- II. Situación de la Cartera de créditos por Organismo Ejecutor
 - Cartera CONAVI
 - Cartera MOPT
 - Cartera CCSS
 - Cartera AyA
 - Cartera SENARA
 - Cartera ICE
 - Cartera MH
 - Cartera MJP
 - Cartera COMEX
 - Cartera CNE

I. Situación general de la cartera de créditos de inversión pública

Cartera de créditos de inversión pública en ejecución



Monto de la cartera: US\$ 4.007,9 millones

Total de créditos: 21

Total de programas/proyectos: 20



Ejecutores más representativos: CONAVI, MOPT, CNE, AYA y SENARA.

Acreedores: BCIE, BID, BIRF, EXIMBANK, y JICA.



Características de la deuda:


- 12 créditos: Gobierno es Deudor
- 9 créditos: Instituciones son deudoras (en 3 de ellos el Gobierno es Garante)



Plazo Promedio de Ejecución de la Cartera*: 94 meses


*Para efectos del cálculo del plazo promedio de ejecución de la cartera, se considera la fecha límite de desembolsos o su expectativa de conclusión según el avance vigente del programa/proyecto.

Participación de los acreedores y préstamos externos al III trimestre 2024

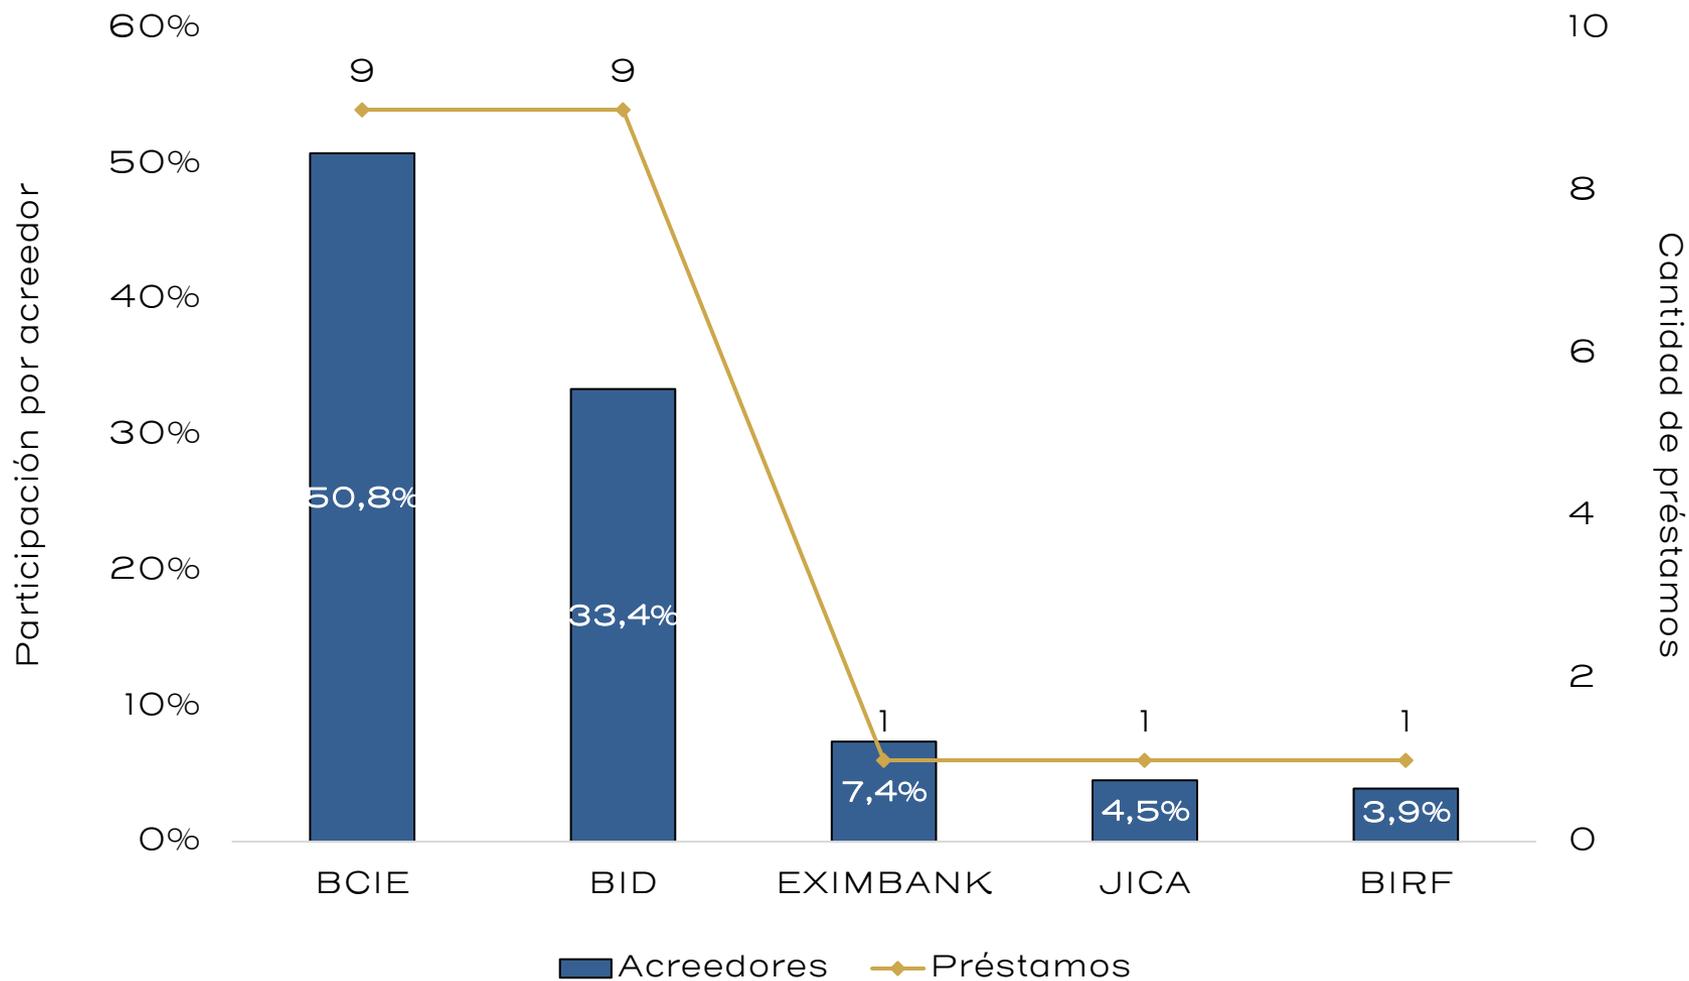

Fuente: DGGDP, MH

Préstamos externos por institución ejecutora al III trimestre 2024

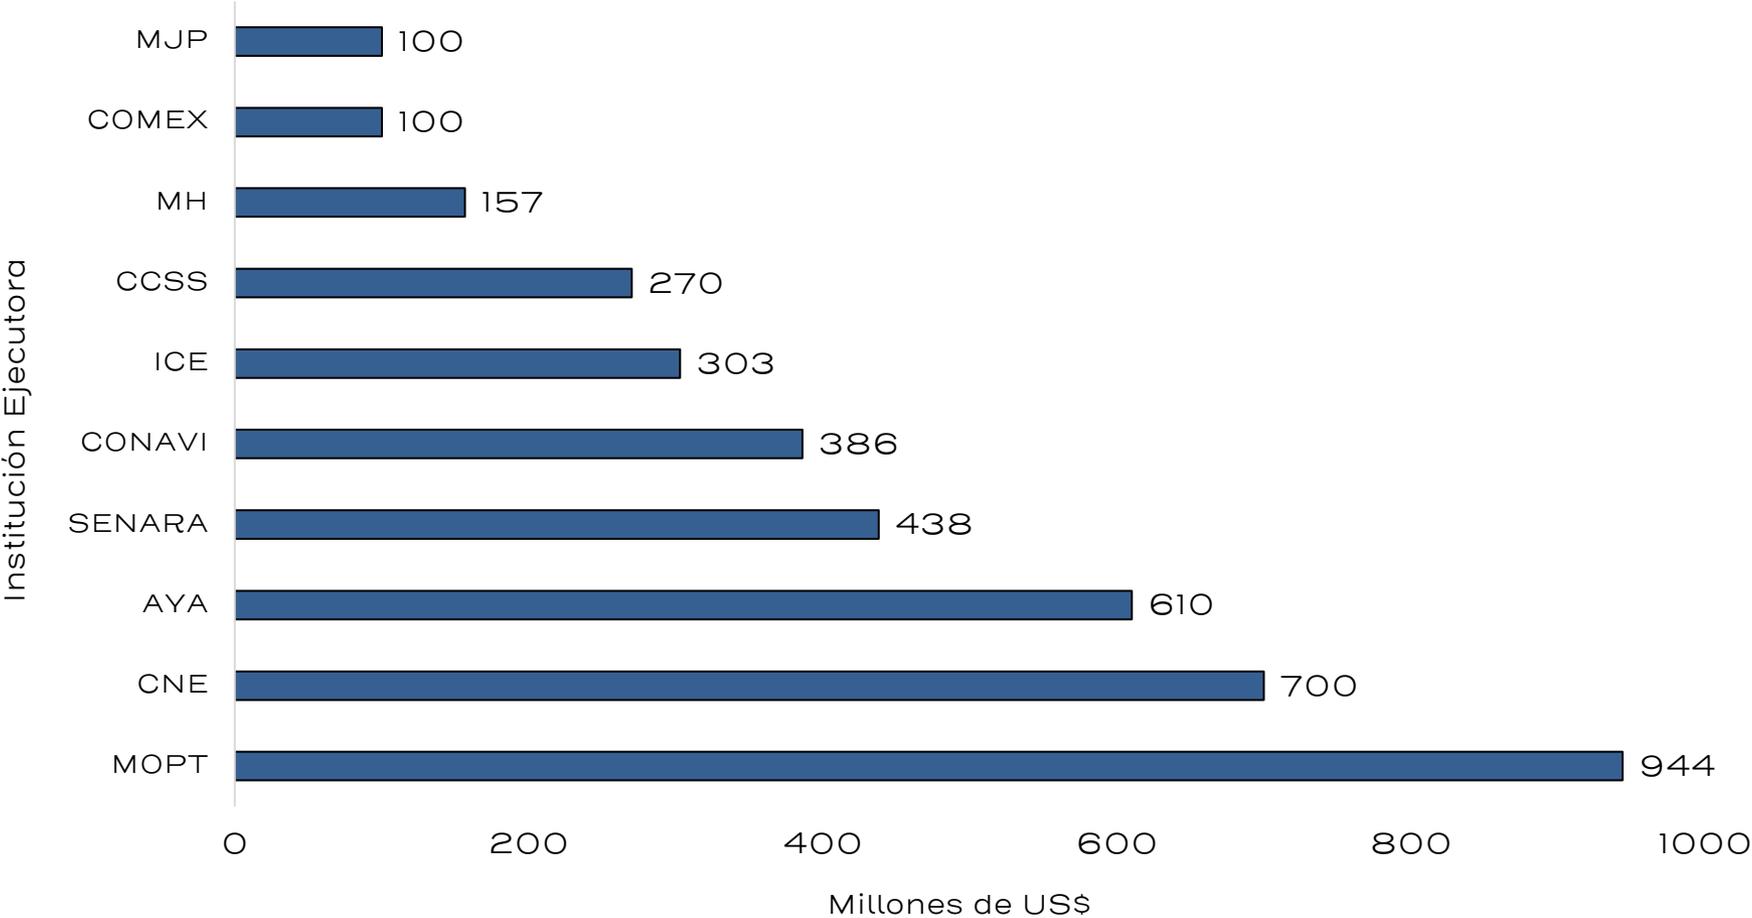

Fuente: DGGDP, MH


Situación de los programas/proyectos de inversión pública

Entidad Ejecutora	Monto total del financiamiento de los Programas/Proyectos (US\$)	Monto pendiente por desembolsar (US\$)	Número de Programas / Proyectos	Número de préstamos	Desempeño del Programa/Proyecto 1/		
							
MOPT	944 036 000,0	471 046 707,6	4	5		4	1
CNE	700 000 000,0	625 310 724,4	1	1			1
AYA	568 144 957,3	349 736 700,8	5	5	4	1	
SENARA	425 000 000,0	425 000 000,0	1	1		1	
CONAVI	386 055 000,0	29 835 520,3	2	2	1		1
ICE	302 979 015,8	153 647 797,3	2	2		1	1
CCSS	270 000 000,0	0,0	1	1		1	
MH	156 640 000,0	144 039 866,4	1	1		1	
COMEX	100 000 000,0	8 650 581,4	1	1	1		
MJP	100 000 000,0	62 076 383,2	1	1		1	
AYA/SENARA	55 080 000,0	54 580 000,0	1	1	1		
Total	4 007 934 973	2 323 924 281,5	20	21	7	10	4

1/ Desempeño calculado con corte a junio 2024.

Fuente: DGGDP, MH

Desembolso programado respecto al desembolso realizado del 2019 al III trimestre 2024

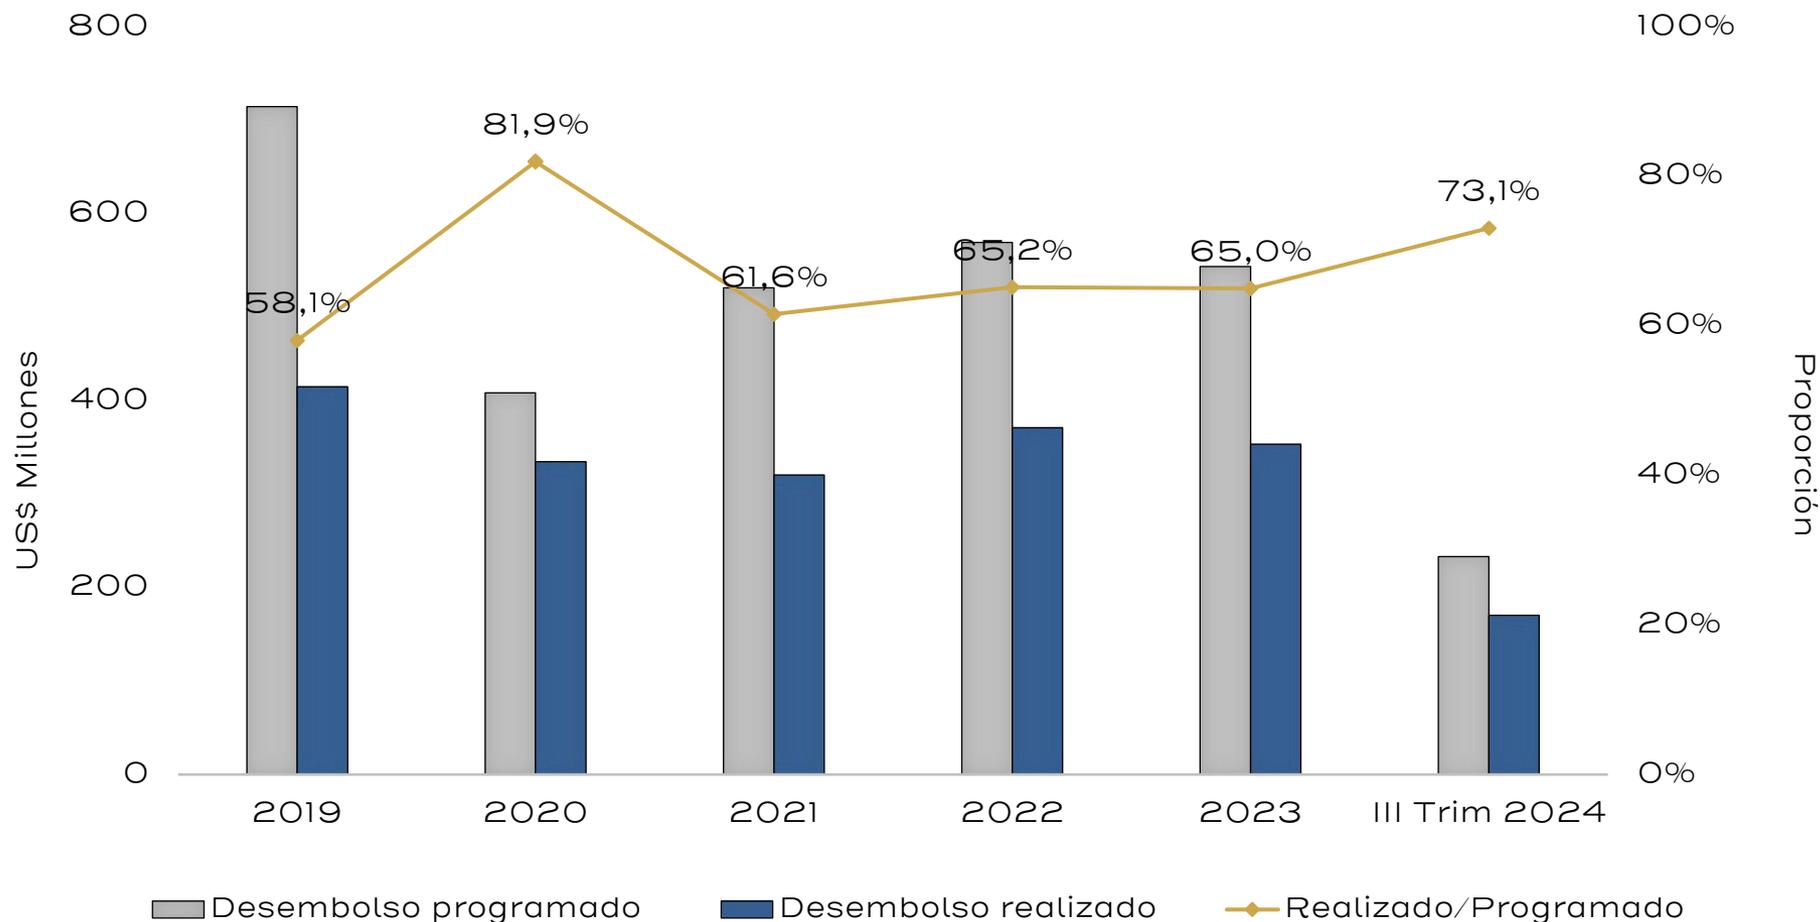

Fuente: DGGDP, MH

II. Situación de la cartera de créditos por organismo ejecutor

1. Cartera [CONAVI](#)
2. Cartera [MOPT](#)
3. Cartera [CCSS](#)
4. Cartera [AyA](#)
5. Cartera [SENARA](#)
6. Cartera [ICE](#)
7. Cartera [MH](#)
8. Cartera [MJP](#)
9. Cartera [COMEX](#)
10. Cartera [CNE](#)



Cartera de créditos del CONAVI

AM 2080

Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial.

1420202052013211015

Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32.



Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial


US\$ 90,05 MILLONES

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 98,33%

Avance Físico: 97,00%

Fecha Límite de Desembolsos Vigente: 29/04/2027



Avances

- **Unidad Funcional V:** tiene un avance del 92%, con la colocación de mezcla asfáltica y la construcción de pavimento ya completadas. Aún falta la entrega de los marginales y la finalización de tareas de seguridad, como la demarcación vial y la iluminación.
- **Rehabilitación del puente sobre el río El Virilla en la RN°32:** presenta un avance del 90%, entre los cuales están:
 - instalación de fibra de carbono interior y la colocación de concreto en el fuste de pila 1.
 - construcción de sistemas de contención vehicular y aceras
 - finalización de la instalación de postes de contención y la terminación de la obra en el puente de Calle Rojas

Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32


US\$ 296,00 MILLONES

Monto del Préstamo
Comprador de Exportación

Avance Financiero: 90,43%

Avance Físico: 87,26%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 10/04/2025**



Obras con mayor avance:



○ **Construcción de puentes nuevos vehiculares.** Avance promedio 99,94%
De los 33 puentes vehiculares, 27 finalizaron su construcción desde el 2023. Los 6 restantes cerraron el III trimestre con un avance promedio de 99,65% (poco significativo en relación con el avance de 97% logrado en el 2023). Se espera que la construcción de estos 6 puentes finalice durante el II Semestre 2024.

Avances

○ **Rehabilitación de la vía existente.** Avance 94,60%

○ **Obras nuevas:** construcción de la vía. Avance promedio 87,13%
Drenajes (95,25%), Base (97,65%), Superficie (94,10%), Trabajos de protección ambiental (100%), Calles Marginales (97,05%), Ciclovías (92,10%), Aceras (100%), Elevación de la rasante (90%) y Pasos de fauna (90%).



Cartera de créditos del MOPT

3071/OC-CR y 3072/CH-CR

Programa de Infraestructura de Transporte

4507/OC-CR

Programa Red Vial Cantonal II

4864/OC-CR

Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones
Público-Privadas

5823/OC-CR

Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana
Conectividad Resiliente



Programa de Infraestructura de Transporte

3071/OC-CR
US\$ 400,00 MILLONES


3072/CH-CR
US\$ 50,00 MILLONES

Monto de los Préstamos

Avance Financiero:
3071/OC-CR : 75,75%
3072/CH-CR: 60,00%

Avance Físico: 55,73%

Fecha Límite de Desembolsos:
12/11/2026



Avances

- Se continúa avanzando en las obras de seguridad de los tramos La Angostura, San Gerardo – Limonal y Barranca – San Gerardo, con un progreso del 89%, 46% y 23% respectivamente.
- Diseño y Construcción de la nueva carretera a San Carlos RN 35, se encuentra en la confección de los carteles de licitación.

Red Vial Cantonal II


US\$ 144,03 MILLONES

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 64%

Avance Físico: 84%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 20/09/2025**



Avances

- Para la adquisición del software de gestión de activos, denominado Sistema de Gestión de Activos Viales (SGAV), se adquirió el software PAVER y se coordinó con la Secretaría de Planificación Sectorial los levantamientos de caminos rurales que iniciarán en el mes de noviembre.
- Se inició el proceso de formalización del contrato al Consorcio: GEA 21- GPC-YUSO para la realización de una Campaña Comunicacional de Movilidad Segura y Sostenible.
- Se adjudicaron los paquetes P13, P14 y P22 y se estima la finalización para marzo, junio y setiembre 2025 respectivamente.
- Se dio la orden de inicio de los paquetes P10 y P11 los cuales están formados de un total de 8 lotes, todos con diferente inicio y fin, algunas obras iniciarán hasta mediados de noviembre.
- Los proyectos del paquete P12 están agrupados en 4 lotes, todos con diferente inicio y fin, se tiene contemplado que finalicen dentro del plazo límite.

Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas


US\$ 125,00 MILLONES

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 38,40%

Avance Físico: 56,16%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 29/09/2025**



Avances

- **Taras - La Lima (64,69%):** Se entregó el tramo central. Además, se avanza en la ejecución de los muros de tierra armada en el Paso Elevado Taras, la construcción de pilotes y montaje de vigas en la estructura Lima, por último, se da la finalización de la pantalla de pilotes de concreto en el Paso Inferior La Lima.
- **OBIS:^{1/}** Intercambio Circunvalación y Puente sobre el río Torres, no presentan avance al corte de este informe.

Nota: 1/ Se está valorando la opción de únicamente dejar tres de las seis OBIS asignadas al Programa, según informe técnico aportado por la Unidad Ejecutora.

Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana Conectividad Resiliente

US\$ 225,00 MILLONES

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 0,00%

Avance Físico: 0,00%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 10/01/2029**



El Programa se encuentra en trámite de incorporación de los recursos en el Presupuesto Nacional.

Punta Sur (CR-L1151-P00003): Evaluación de ofertas y apertura de la oferta técnica (30 agosto 2024), presupuesto estimado de USD \$123M.

Tramo Central (CR-L1151-P00004): Pliego de condiciones finalizados y revisados, presupuesto estimado de USD \$183.87M.

Punta Norte (CR-L1151-P00001): TDR elaborados y ajuste en la propuesta de justificación, presupuesto estimado de USD \$1M.

Asimismo, se avanzó en la licitación para la Administración de Contratos FIDIC (CR-L1151-P00010) y la contratación del Gestor Documental, con TDR elaborados y revisión final en curso.



Avances



Cartera de créditos de la CCSS

2128

Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario



Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario


US\$ 270,00 MILLONES

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 100,00%

Avance Físico: 100,00%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 10/10/2023 ^{1/}**



Avances

- El único Proyecto pendiente por finalizar para este Programa, corresponde al Hospital Monseñor Sanabria, en donde al corte se tiene que:
- El 6 de septiembre se firmó el acta de Recepción Provisional, estableciendo el 9 de diciembre como fecha para la recepción definitiva, tras la cual se iniciará la entrega de las instalaciones.
- El 2 de septiembre comenzaron los trabajos viales para los accesos del proyecto, conforme a los permisos del MOPT.
- En cuanto a aspectos de relevantes, se recibió el informe de reubicación de desfogue y respecto al vertido de aguas ilícitas, el CONAVI notificó cambios en el diseño.

^{1/} Se desembolsó el 100% del préstamo y continuó la ejecución del nuevo Hospital de Puntarenas.

Cartera de créditos del AyA



BCIE 1725

Programa Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón.

BCIE 2129

Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM.

BCIE 2164

Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas.

BCIE 2188-A

Programa de Agua y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio (PAACC).

BCIE 2198

Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón.



Programa Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón


US\$ 99,45 MILLONES

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 100,0%

Avance Físico: 98,7%

Fecha Límite de Desembolsos Vigente: 30/06/2021



Avances

- **Alcantarillado Sanitario, Puerto Viejo.** Avance físico 100,0%. Tras finalizar reparaciones pendientes en sistemas de bombeo y restitución de asfalto en líneas de alcantarillado, se inauguró el 30 de agosto de 2024.
- **Diseño Quinta Etapa Ampliación Acueducto Metropolitano.** Avance físico 91,1%. Finaliza revisión de entregables generados en convenio con el ICE, y se trasladaron a Administración Superior del AyA, para toma de decisiones.
- **Sistema de tratamiento de lodos (de Planta Potabilizadora de Miraflores, Pérez Zeledón).** Avance físico 65,2%. Se finalizó la colocación de cunetas, barandas, techo y tubería de drenaje.

Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM (RANC-EE)


US\$ 130,00 MILLONES

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 14,00%

Avance Físico: 44,70%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 12/08/2025**



Avances

- Se continúa trabajando en los avances en el Sistema de Gestión de Mantenimiento y Órdenes de Servicio (GMAO), con entrega de nuevos módulos y mejora en interoperabilidad.
- Se inicio la sustitución de 7 km de tuberías en la Zona de Pasito de Alajuela.
- Se trabaja con la instalación de válvulas reductoras de presión para mejorar la eficiencia en la red de distribución.
- Se continua en la sustitución de más de 5,400 medidores domiciliarios.

Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora


**US\$ 154,60
MILLONES**

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 14,79%

Avance Físico: 30,45%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 30/10/2027**



Avances

- Ampliación del acueducto de San Pablo de Turrubares
 - Etapa I: Construida, obras finalizadas el 23 de agosto de 2024.
 - Etapa II: En proceso en el Juzgado Contencioso Administrativo, sin plazo definido para su conclusión.
- Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable, zona oeste de San José
 - Etapa I: Concluido el proceso de contratación administrativa, pendiente de acta de adjudicación.
 - Etapa III: En fase de recepción de ofertas.
 - Etapa IV: En construcción, con un avance del 22.28%.
- Mejoras al sistema de acueducto de Pasito de Alajuela
 - Etapa I: Proceso de contratación administrativa con un 46% de avance, ofertas en estudio.
 - Etapa II: La ejecución de las obras bajo el esquema de licitación por demanda ha comenzado, alcanzando un avance del 0.72%.

Programa de Acueducto y Alcantarillado en Ciudades Costeras (PAACC)


US\$ 111,12 MILLONES

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 4,49%

Avance Físico: 12,82%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 28/04/2026**



Avances

Excepto el proyecto de alcantarillado de Moín, los cinco proyectos restantes han completado la etapa de revisiones de diseños preliminares y se está a la espera de los ajustes solicitados al consultor y la entrega de los diseños finales. Los siguientes proyectos presentan otros avances que se detallan a continuación:

- Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable de Limón.
 - *Búfalo Maxi Palí*: Se realizó la formalización contractual, así como la confección del contrato en SICOP y se está a la espera de la firma del contrato de construcción por parte de la Gerencia General del AyA.
- Construcción del edificio Laboratorio Nacional de Aguas.
 - Se realizaron revisiones al alcance de los diseños, así como una estimación de costos para valorar escenario de diseño y construcción, a solicitud de la Administración Superior.

Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón


US\$ 42,00 MILLONES

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 0%

Avance Físico: 18,35%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 26/06/2026**



Avances

o Infraestructura y equipamiento:

- El contrato de la licitación 2021LI-000005-PRI para la construcción de las obras del Sector 1 se formalizó y se dio la orden de inicio el 23 de septiembre de 2024.
- El contratista ha iniciado con la gestión de los permisos constructivos requeridos ante el CFIA y el MOPT, indispensables para iniciar las obras. Se espera que los permisos sean aprobados en el mes de octubre, con el objetivo de iniciar los trabajos constructivos según lo planificado.
- Se estima que el visado de planos será otorgado el 15 de octubre, mientras que el permiso de Edificaciones Nacionales se espera para el 22 de octubre.

o Administración y supervisión:

- Se ha avanzado en la revisión de las ofertas técnicas y económicas de la licitación para la supervisión de las obras 2022LI-000009-PRI. Aunque el proceso sufrió retrasos debido a subsanaciones, el proceso de evaluación culminó con la recomendación de adjudicación y el 30 de septiembre se recibió la no objeción del BCIE.



Cartera de créditos del SENARA

BCIE 2198

Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón.

BCIE 2220

Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME).



Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón


US\$ 13,08 MILLONES

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 3,82%

Avance Físico: 60,36%

Fecha Límite de Desembolsos Vigente: 26/06/2026



Avances

- Se ha completado el proceso de contratación de las obras en los cauces Chitá-Santa Fe, Quebrada Chocolate, Canal Santa Rosa (Westfalia) y los canales menores.
- Se presentó el informe de evaluación de ofertas para la contratación de supervisión de obras a la Comisión de Licitaciones, que lo aprobó. Tras obtener la No Objeción del BCIE, se inició la negociación con el oferente, quien debe presentar una nueva oferta ajustada en cuanto a personal y plazo de ejecución. Se espera recibir la contraoferta entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre para su análisis.
- La licitación para el Plan de Educación Ambiental fue remitido a la Dirección Jurídica para su revisión, y una vez recibidas las observaciones, se integrarán para su aprobación por la Comisión de Licitaciones del AyA y envío para la No Objeción del BCIE.
- Los términos de referencia para el estudio de factibilidad de la creación de un centro de acopio fueron enviados a la Dirección Jurídica para su revisión legal. Una vez recibidas las observaciones, se integrarán para su aprobación por la Comisión de Licitaciones del AyA y posterior envío para la No Objeción del BCIE.

Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME)

US\$ 425,00 MILLONES

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 0,0%

Avance Físico: 7,0%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 60 meses a partir del
primer desembolso**



Avances

- **Casa de Máquinas.** Se inicia proceso de limpieza y movimiento de tierras, los cuales sientan las bases para iniciar el proceso constructivo.
- **Personal DIGEP.** Se realizaron dos contrataciones más, para completar en la Dirección de Gestión del Proyecto PAACUME, el total de ocho durante el presente año.
- **Procesos de Adquisición.** Avances sustanciales en Supervisión de Obras, Construcción de Presa, Auditoría Externa (pliego de condiciones enviado al Acreedor para No Objeción, pliegos en revisión y hasta estudios de mercado).
- **Adquisición de Terrenos.** El proceso avanzó 6,0% en el sitio de Presa y Embalse, para totalizar a la fecha 96,0%.



Cartera de créditos del ICE

BID 3589/OC-CR

Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad.

JICA CR-P5-2

Proyecto Geotérmico Borinquen I.



Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad

US\$ 121,30 MILLONES

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 87,85%

Avance Físico: 93,73%

Fecha Límite de Desembolsos Vigente: 07/08/2025



Avances

o Generación:

- En la actividad para la rehabilitación de la PH la Garita se continua con la preparación de los componentes necesarios para la instalación del SCADA, de acuerdo con cronograma se finalizará durante el I semestre del 2025.
- Se continúa con el proceso de instalaciones de las estaciones hidrometeorológicas, a la fecha de corte del periodo registra un total de instalaciones de 264 estaciones finalizadas de un total de 314.

o Transmisión:

- Digitalización y Modernización Sistema Transmisión: Los equipos para la plataforma para monitoreo dinámico del sistema de transmisión se mantienen en el proceso de configuración. Se están programando pruebas locales con la participación de ICE-Telecomunicaciones, antes de instalar.

o Distribución y comercialización:

- Durante el trimestre se instalaron 7,701 luminarias LED, alcanzando un total de 27,818 hasta la fecha. Para los años 2024 y 2025, se tienen programadas 47,253 luminarias, lo que dará un total general de 75,071.
- Medidores AMIS: Continua el proceso de instalaciones. Se registra 53,826 medidores AMI instalados de un total general de 84,900. Con la agenda que se está trabajando se tiene programada la instalación de 44,000 medidores AMI adicionales.

Proyecto Geotérmico Borinquen I


**US\$ 181,67
MILLONES**

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 23,54%

Avance Físico: 43,01%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 27/09/2026**



Avances

- **Desarrollo de yacimiento geotérmico:**
 - Se finalizó con éxito la perforación del pozo PGB-45, por lo que actualmente se encuentra en pruebas de producción. Adicionalmente, se están haciendo trabajos de fabricación de torres de monitoreo de pozos.
- **Sistemas de Recolección:**
 - En el III trimestre se realizaron obras hidráulicas e impermeabilización en lagunas de reinyección, tratamiento de taludes, pasoductos, fabricación y montaje de cimientos de concreto y soportes metálicos para el sistema de tubería metálica, se trabajó en la fabricación de silenciadores, entre otros.
- **Obras ambientales:**
 - Se realizaron 3 monitoreos de ruido, 3 monitoreo lluvia, 3 monitoreo de aguas superficiales, 3 monitoreo de gases, 78 rescates y reubicación de fauna (principalmente serpientes).
 - Se realizaron reuniones de seguimiento con las comunidades y acercamiento con los hoteleros de la zona.



Cartera de créditos del MH

9075-CR

Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario



Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario

US\$ 156,64 MILLONES

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 8,04%

Avance Físico: 22,44%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 31/07/2026**



Avances

Contrataciones COTS:

- Adquisición de Sistema financiero y de Talento Humano (Av. Físico: 20,95%)
- Adquisición Sistema Tributario (Av. Físico: 20,95%)
- Adquisición de Sistema Aduanero (Av. Físico: 20,00%)

Contrataciones con avances más representativos:

- Sistema de Auditoría Interna (Av. Físico: 100%)
- Servicio de Digitalización y Gestor Documental en el Ministerio de Hacienda, según demanda (Av. Físico: 95%)

Otras contrataciones:

- Contratación de servicios de Nube e Interoperabilidad (Av. Físico: 4,50%)
- Programa de Capacitación y Entrenamiento Proyecto Hacienda Digital (Av. Físico: 4,00%)
- Sistema de Actas, de Correspondencia, Seguimiento de Informes (Av. Físico: 3,00%)
- Desarrollo del Portal del Ministerio de Hacienda (Av. Físico: 2,60%)



Cartera de créditos del MJP

4871/OC-CR

Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia



Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia

US\$ 100,00 MILLONES

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 37,92%

Avance Físico: 35,79%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 17/03/2026**



Delegaciones Policiales

- ✓ Finalizadas y operando:
 - Delegación Policial de Siquirres (Av. Físico: 100%)
 - Delegación Distrital de Horquetas (Av. Físico: 100%)
 - Delegación Policial de Santa Ana (Av. Físico: 100%)
- ✓ En proceso de construcción:
 - Delegación Policial de Puntarenas Norte (Av. Físico: 97%)
 - Delegación Distrital de Puerto Viejo (Av. Físico: 96%)
 - Delegación Policial de Desamparados Sur (Av. Físico: 72%)
 - Delegación Policial de Guácimo (Av. Físico: 7%)



Avances

Centros Cívicos por la Paz

- ✓ En proceso de construcción:
 - Centro Cívico por la Paz de Puntarenas (Av. Físico: 90%)
 - Centro Cívico por la Paz de Corredores (Av. Físico: 86%)
 - Centro Cívico por la Paz de Limón (Av. Físico: 5%)



Cartera de créditos de COMEX

3488/OC-CR

Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica (PIF)



Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica


US\$ 100,00 MILLONES

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 91,3%

Avance Físico: 64,1%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 31/05/2025**



Avances

- **Puesto Fronterizo Peñas Blancas.** El ritmo de ejecución mejora tras toma de acuerdos para mitigación de riesgos materializados en diseño y suelos, para alcanzar el 58%.
- **Puesto Fronterizo Sabalito.** Suscripción de adenda para diseño de rehabilitación del centro, se firma el 22 de agosto, y dio inicio a su ejecución.
- **Proyectos de reformas normativas que afecten los procesos.** Se mantiene monitoreo de procesos implementados en Puesto de Paso Canoas y se tiene procesos temporales listos para el Puesto en Peñas Blancas.
- **Sistemas Informáticos.** Avance en desarrollo de nuevas funcionalidades del VUCE alcanza 67,0% y el Sistema de Gestión de Puestos Fronterizos llega al 80%.



Cartera de créditos de la CNE

2317

Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI).



Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI)

US\$ 700,00 MILLONES

Monto del Préstamo

Avance Financiero: 10,67%

Avance Físico: 6,48%

**Fecha Límite de Desembolsos
Vigente: 17/06/2030**



1. Comisión Nacional de Emergencias: 203 proyectos / US\$173,19 millones.

Preinversión: 106 proyectos asignados.

- 44 proyectos sin avances.
- 27 proyectos con 5% de avance: En proceso de elaboración de Términos de Referencia (TDR).
- 18 proyectos con 10% de avance: En proceso de licitación
- 4 proyectos con 15% de avance: Adjudicados.
- 1 proyecto con 50% de avance: Trabajo de campo y revisión documental para estudios técnicos y preliminares.
- 12 proyectos con 75% de avance: Análisis y elaboración de informes.

Infraestructura Resiliente y Sostenible: 203 proyectos asignados.

- 86 proyectos sin avances.
- 41 proyectos con 5% de avance: En proceso de elaboración de TDR.
- 58 proyectos con 10% de avance: En proceso de licitación.
- 13 proyectos con 15% de avance: Adjudicados.
- 5 proyectos con avances entre 60%–98%: Construcción de obras.



Avances



Avances

2. CONAVI: 176 proyectos / US\$ 347,49 millones.

- **Preinversión: 159 proyectos asignados.**
 - 1 proyecto sin avance.
 - 132 proyectos con 5% de avance: En proceso de elaboración de TDR.
 - 26 proyectos con 10% de avance: En proceso de licitación.
- **Proyectos de Infraestructura Resiliente y Sostenible: 175 proyectos asignados.**
 - 5 proyectos sin avances.
 - 136 proyectos con 5% de avance: En proceso de elaboración de TDR.
 - 35 proyectos con 10% de avance: En proceso de licitación.

3. MEP: 47 proyectos / US\$ 110,14 millones.

- **Preinversión: 13 proyectos asignados.**
 - 5 proyectos con 5% de avance: En proceso de elaboración de TDR.
 - 8 proyectos con 10% de avance: En proceso de licitación.
- **Proyectos de Infraestructura Resiliente y Sostenible: 47 proyectos asignados.**
 - 11 proyectos sin avances
 - 36 proyectos con 10% de avance: En proceso de licitación



Avances

4. INCOFER: 74 proyectos / US\$ 64,56 millones.

- **Preinversión: 74 proyectos asignados.**
 - 22 proyectos sin avances.
 - 35 proyectos con 5% de avance: En proceso de elaboración de TDR.
 - 17 proyectos con 10% de avance: En proceso de licitación.
- **Proyectos de Infraestructura Resiliente y Sostenible: 74 proyectos asignados.**
 - 22 proyectos sin avances.
 - 35 proyectos con 5% de avance: En proceso de elaboración de TDR.
 - 17 proyectos con 10% de avance: En proceso de licitación.

5. MIVAH: 2 proyectos / US\$ 4,72 millones.

- **Preinversión:**

No tiene asignados recursos bajo este componente.
- **Proyectos de Infraestructura Resiliente y Sostenible: 2 proyectos asignados.**
 - 1 proyecto (Construcción de 105 viviendas) con 5% de avance: En tramitación y confección de expedientes (valoración y aprobación de casos).
 - 1 proyecto (Construcción de 31 viviendas) con 94% de avance.



MINISTERIO
DE HACIENDA

GOBIERNO
DE COSTA RICA

Programas/Proyectos de Inversión financiados con recursos externos

Gobierno Central y Resto del Sector Público

Al 30 de setiembre 2024

Dirección General de Gestión de Deuda Pública
