Seguimiento
Créditos Externos en ejecución del Gobierno Central y Resto del Sector Público

Al 31/03/2022

Cartera de créditos de inversión en ejecución

Al 31 de marzo 2022

25 créditos externos

En 18 préstamos, el Gobierno es Deudor o Garante.

En 7 préstamos, la Institución Ejecutora es la Prestataria

5,92% representa la cartera en relación con el PIB**

3,08% representa el saldo por desembolsar en relación con el PIB**

Los endeudamientos más altos están dirigidos hacia Programas y Proyectos ejecutados por el CONAVI, MOPT y AYA

** Cartera exclusiva de Programas/Proyectos de Inversión Pública (no incluye préstamos para Apoyo presupuestario)*

*** PIB a precios de mercado, nominal 2022; convertido a dólares utilizando el Tipo de Cambio del SPNB al 31/03/2022*

Cartera de créditos de inversión en ejecución

Participación porcentual de los empréstitos externos por Acreedor

Al 31 de marzo 2022

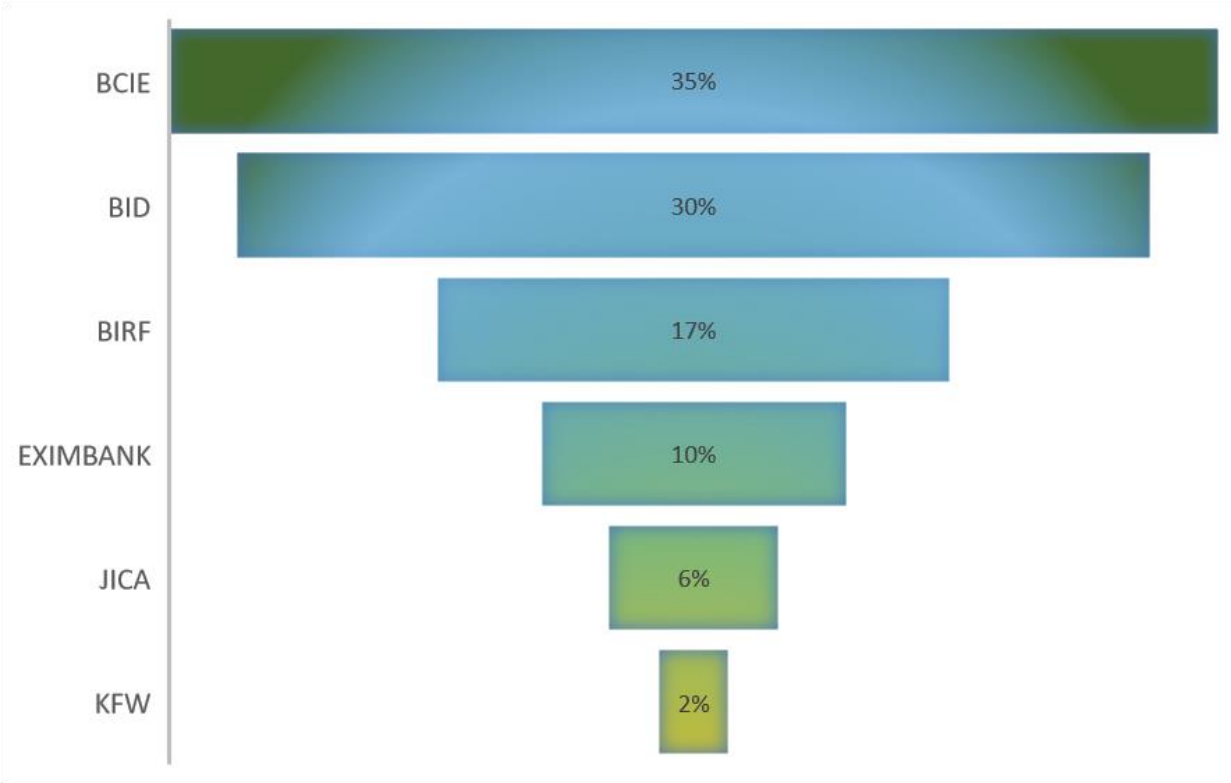

Cartera de instituciones ejecutoras

Al 31 de marzo 2022

CONAVI	MOPT	ICE
AYA	CCSS	SENARA
COMEX	INCOPESCA	MH
CNE	MICIT	MJP

Desembolsos de inversión programados y reales
2014 – 2022

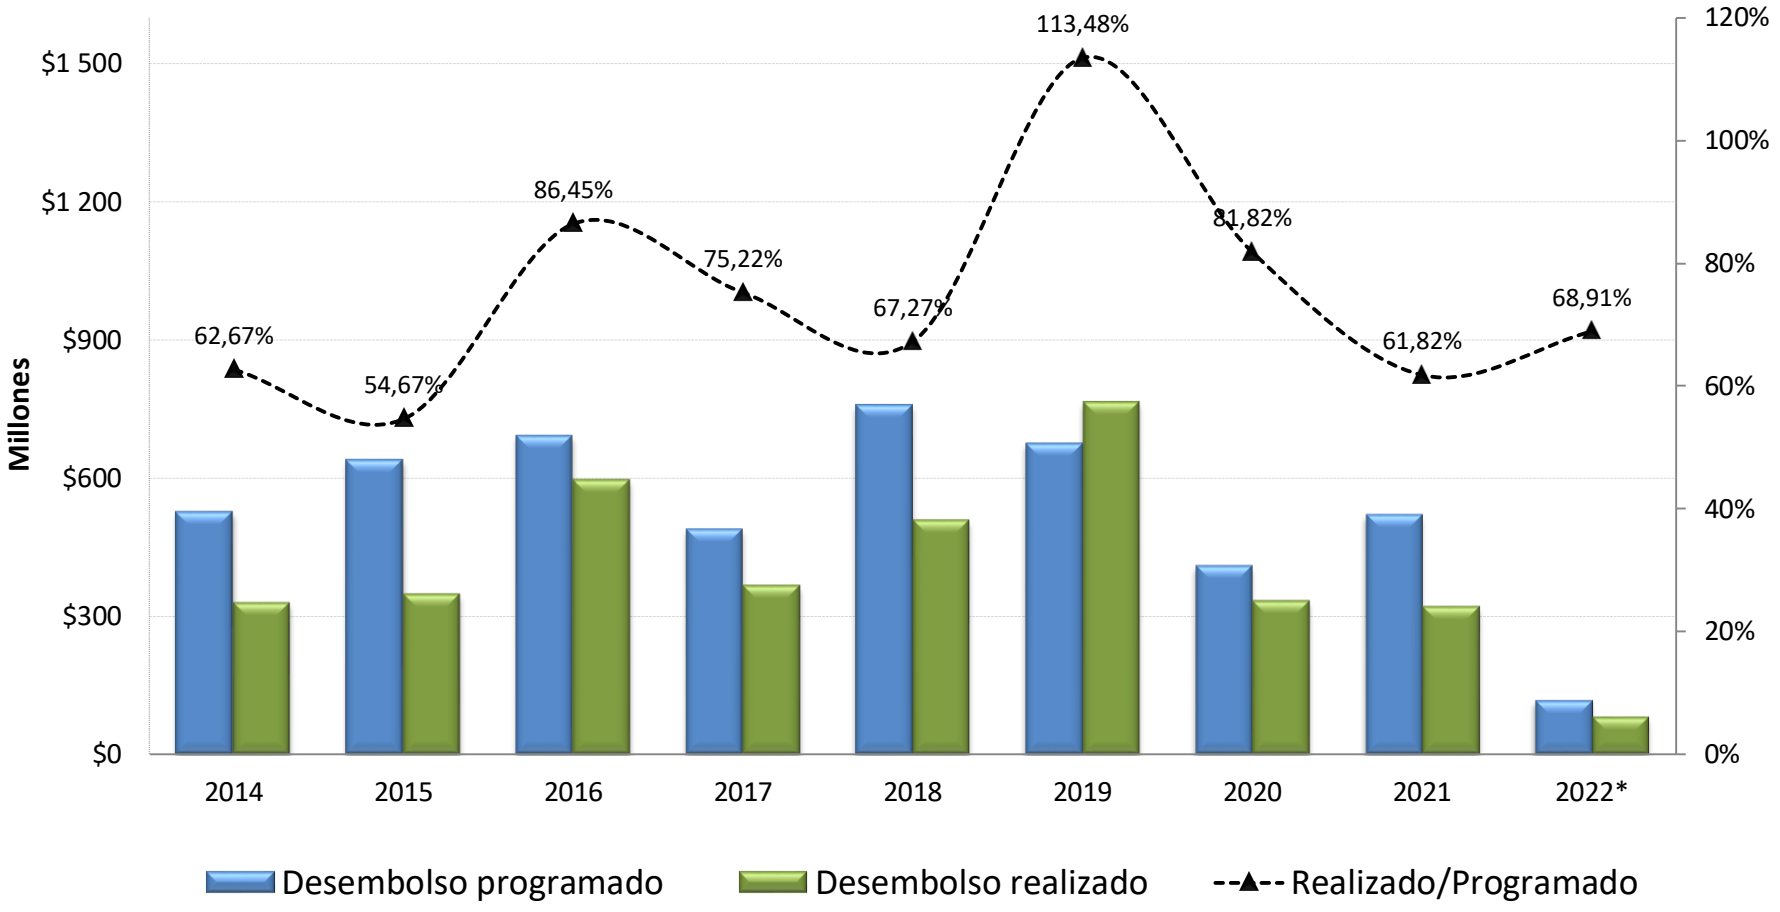

2022* Desembolso programado y realizado al I Trimestre 2022.

Plazos promedio de aprobación de la AL, cumplimiento de condiciones previas y ejecución de los Programas/Proyectos de la Cartera
(en meses)

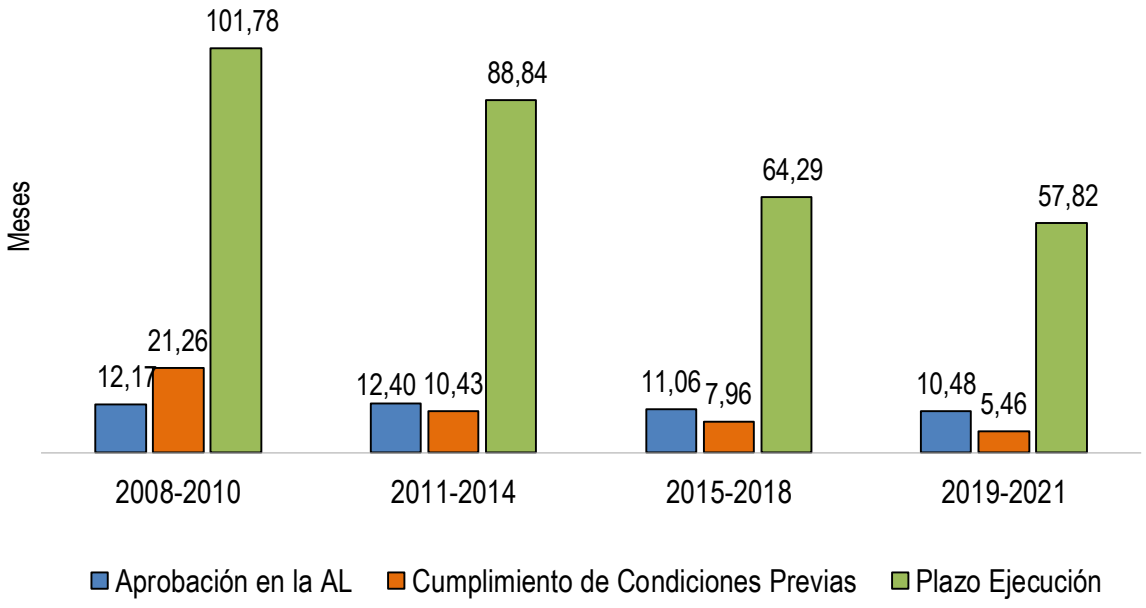

- ✓ Reducción del tiempo de ejecución de los Programas/Proyectos vigentes en el Cartera a marzo 2022 con respecto a los que se negociaron antes del año 2008 (en 3,66 años en promedio).
- ✓ Se tiene una reducción del tiempo de cumplimiento de condiciones previas en 15,80 meses si comparamos carteras de 2008-2010 con la del 2015 al 2020.

*Incluye Préstamos del Gob. Central con Garantía Soberana y Deudores de Otros Sectores. No incluye préstamos de Apoyo Presupuestario.

Situación de los Programas/Proyectos de Inversión Pública

Al 31 de marzo del 2022 –en dólares-

Institución Ejecutora	Monto total del financiamiento de los Programas/Proyectos	Monto pendiente por desembolsar	Número de proyectos	Número de préstamos	Desempeño del Programa/Proyecto		
ICE	$ 348 347 293,07	$ 263 805 103,79	2	2			2
CONAVI	$ 816 597 773,12	$ 237 094 792,27	3	4	3		
MOPT	$ 719 036 000,00	$ 384 711 515,69	3	4		3	
CCSS	$ 690 000 000,00	$ 160 801 342,75	2	2	1		1
AYA	$ 660 100 301,99	$ 483 752 039,72	6	6	5	1	
INCOPESCA	$ 75 100 500,00	$ 74 912 748,75	1	1			1
COMEX	$ 100 000 000,00	$ 79 447 301,62	1	1		1	
AYA/SENARA	$ 55 080 000,00	$ 54 580 000,00	1	1	1		
CNE	$ 80 000 000,00	$ 311 546,46	1	1			1
MICIT	$ 35 000 000,00	$ 3 140 101,72	1	1		1	
MH	$ 156 640 000,00	$ 151 287 250,00	1	1		1	
MJP	$ 100 000 000,00	$ 99 150 000,00	1	1		1	
Total	**$ 3 835 901 868,18**	**$1 992 993 742,77**	**23**	**25**	**10**	**8**	**5**

Situación de los Programas/Proyectos a marzo 2022

Programa / Proyecto	Monto del Préstamo 1/	Avance financiero a marzo	Avance físico a marzo	Contrapartida 1/		Firma del contrato	Fecha original de desembolsos	Fecha prórroga de desembolsos	Número de Prórrogas	Estado según DCP
				Original	Vigente					
CONAVI										
Ruta 32 2/	386,54	100,00% 50,32%	52,11%	147,7	125,4	03/06/2013 03/06/2013	07/12/2020 10/04/2023	N/A N/A	0 0	
Obras Estratégicas	340,00	100,00%	94,00%	30,54	144,86	16/04/2012	29/05/2017	29/05/2021	1	
AM Obras Estratégicas	90,06	0,00%	6,00%	2,67	2,67	16/11/2020	29/04/2027	N/A	0	
ICE										
Borinquen I	213,85	14,49%	26,81%	134,33	134,33	20/6/2017	20/6/2026	N/A	0	
Energía Renovable	134,50	39,82%	55,71%	91,7	91,7	7/2/2019	7/2/2024	N/A	0	

1/ En millones de dólares.
2/ Avance físico consolidado de sus 2 préstamos (el crédito concesional fue desembolsado en su totalidad).
.

Situación de los Programas/Proyectos a marzo 2022

Programa / Proyecto	Monto del Préstamo[1/]	Avance financiero a marzo	Avance físico a marzo	Contrapartida [1/]		Firma del contrato	Fecha original de desembolsos	Fecha prórroga de desembolsos	Número de Prórrogas	Estado según DCP
				Original	Vigente					
CCSS										
Seguro Universal de Salud	420,00	92,86%	93,35%	N/A	N/A	21/04/2016	30/04/2022	31/12/2023	1	
Renovación Hospitalaria	270,00	51,56%	88,50%	82,88	82,88	07/01/2014	10/10/2019	10/10/2023	2	
AYA										
Juanito Mora	154,56	7,10%	19,33%	31,30	31,30	04/05/2018	30/04/2024	N/A	0	
RANC-EE	130,00	8,62%	27,30%	30,20	46,93	12/08/2015	12/08/2023	N/A	0	
Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario	103,51	96,09%	92,78%	69,81	73,20	26/03/2008	30/12/2016	30/06/2021	3	
Agua Potable y Saneamiento	73,00	72,08%	84,42%	12,03	17,93	26/09/2012	24/09/2019	24/07/2024	2	
PAACC	111,13	1,90%	10,26%	28,73	28,73	07/05/2019	28/04/2026	N/A	0	

1/ En millones de dólares.

Situación de los Programas/Proyectos a marzo 2022

Programa / Proyecto	Monto del Préstamo[1/]	Avance financiero a marzo	Avance físico a marzo	Contrapartida[1/]		Firma del contrato	Fecha original de desembolsos	Fecha prórroga de desembolsos	Número de Prórrogas	Estado según DCP
				Original	Vigente					
AYA										
Saneamiento en Zonas Prioritarias	87,90	0,0%	17,10%	9,67	9,67	20/12/2018	30/06/2024	N/A	0	
AYA/SENARA										
Alcantarillado y Control Inundac. Limón	55,08	0,91%	19,33%	1,61	1,61	07/01/2019	26/06/2023	N/A	0	
MOPT										
PIT[2/]	450,0	58,78%	50,53%	N/A	N/A	03/04/2014	13/11/2020	12/11/2022	1	
PRVC - II	144,04	37,72%	46,00%	8,00	8,00	20/09/2018	20/09/2023	N/A	0	
Infraestructura Vial y Prom. de APP	125,00	16,0%	42,04%	53,00	55,61	18/03/2020	29/09/2025	N/A	0	
CNE										
Vacunas COVID-19	80,00	99,61%	N/A	N/A	N/A	25/05/2021	15/12/2022	N/A	0	

1/ En millones de dólares.
2/ Avance financiero consolidado de sus 2 préstamos.

Situación de los Programas/Proyectos a marzo 2022

Programa / Proyecto	Monto del Préstamo[1/]	Avance financiero a marzo	Avance físico a marzo	Contrapartida[1/]		Firma del contrato	Fecha original de desembolsos	Fecha prórroga de desembolsos	Número de Prórrogas	Estado según DCP
				Original	Vigente					
COMEX										
PIF	100,00	20,55%	33,01%	N/A	N/A	17/12/2015	31/05/2022	31/05/2024	1	
MJP										
Prevención de la Violencia	100,00	0,85%	1,45%	N/A	N/A	17/03/2020	17/03/2026	N/A	0	
MICITT										
PINN	35,00	91,03%	100,00%	N/A	N/A	02/04/2013	01/04/2019	30/09/2021	2	
INCOPESCA										
Sostenible de la Pesca	75,10	0,25%	0,82%	7,00	7,00	03/07/2020	19/05/2027	N/A	0	
MH										
Hacienda Digital	156,64	3,42%	1,37%	N/A	N/A	06/04/2020	31/03/2026	N/A	0	

1/ En millones de dólares.

Créditos de Inversión y de Apoyo Presupuestario en Trámite Legislativo, Negociación y Estructuración

(Al 15 de Mayo del 2022)

Ministerio de Hacienda

Programa de Financiamiento de Proyectos de Inversión del Gobierno Central
-en millones de dólares-

Acreedor	Programa / Proyecto	Deudor / Garante	Ejecutor	Monto	Contrap. Nacional	Estado actual
TRÁMITE LEGISLATIVO						
BCIE	Construcción, equipamiento y puesta en marcha de un Sistema de TRP en la GAM	GOBNO	INCOFER	550,0	0,0	Para aprobación en la Asamblea Legislativa bajo el Proyecto de Ley N°21958.
NEGOCIACIÓN						
BCIE	Fortalecimiento regional infraestructura hospitalaria	GOBNO	CCSS	500,0	31,2	Contrato de Préstamo negociado el 01/10/2021. En proceso de completar aprobaciones institucionales (MIDEPLAN, BCCR, DCP y AP). Pendiente dictamen favorable del BCCR.
BID	Reactivación económica basada en el empleo y la inversión extranjera	GOBNO	MTSS	100,0	0,0	Contrato de Préstamo negociado el 23/02/2022. En proceso de completar aprobaciones institucionales (MIDEPLAN, BCCR, DCP y AP). Pendiente dictamen favorable del BCCR.
BIRF	Adquisición de vacunas contra el COVID-19	GOBNO	CNE	120,0	0,0	Contrato de Préstamo negociado el 05/05/2022. En proceso de completar aprobaciones institucionales (MIDEPLAN, BCCR, DCP y AP). Pendiente presentar solicitud de dictamen favorable del BCCR.
			TOTAL	**1.270,0**	**31,2**	

Programa de Financiamiento de Proyectos de Inversión del Gobierno Central
-en millones de dólares-

Acreedor	Programa / Proyecto	Deudor / Garante	Ejecutor	Monto preliminar	Estado actual
ESTRUCTURACIÓN					
BCIE	Obras de infraestructura y equipamiento del Sistema Penitenciario	GOBNO	MJP	98,4	En proceso de completar aprobaciones institucionales (MIDEPLAN, BCCR, DCP y AP). Pendiente aprobación final de inicio de trámites de MIDEPLAN.
BCIE	Fortalecimiento de la UTN mediante inversión en infraestructura, equipamiento y capital humano	GOBNO	UTN	50,0	En proceso de estructuración.
BCIE	Infraestructura y equipamiento educativo	GOBNO	MEP	137,0	En proceso de estructuración.
BCIE	Rehabilitación y construcción de puentes y caminos	CONAVI	CONAVI	350,0	En proceso de estructuración.
BIRF	Construcción y reconstrucción de infraestructura resiliente para procesos de ACC	GOBNO	CNE	500,0	En proceso de estructuración. Se han dado reuniones con el Despacho del MH y la DCP.

Programa de Financiamiento de Proyectos de Inversión del Gobierno Central
-en millones de dólares-

Acreedor	Programa / Proyecto	Deudor / Garante	Ejecutor	Monto preliminar	Estado actual
BIRF	Opción de desembolso diferido ante el riesgo de catástrofes	GOBNO	MH	130,0	En proceso de estructuración.
BID	II Programa de Infraestructura Vial	GOBNO	MOPT	225,0	En proceso de estructuración.
BID	II Programa de energía renovable, transmisión y distribución de electricidad	ICE/GOBNO	ICE	365,5	En proceso de estructuración.
JICA	Proyecto geotérmico Borinquen II	ICE/GOBNO	ICE	13.285 ¥ (aproximada/ US$ 102,2)	En proceso de estructuración.
			TOTAL	**1.958,1**	

Programa de Financiamiento de Proyectos de Inversión – Otros sectores
-en millones de dólares-

Acreedor	Programa / Proyecto	Deudor / Garante	Ejecutor	Monto preliminar	Estado actual
NEGOCIACIÓN					
BCR	Fomento proyectos de obras y servicios municipales – Banca de Segundo Piso para el Financiamiento del Sector Municipal	IFAM	IFAM	¢20.000 (aproximada/ US$ 29,9)	En proceso de completar aprobaciones institucionales (MIDEPLAN, BCCR, DCP y AP). Pendiente presentar solicitud de dictamen favorable del BCCR.
ESTRUCTURACIÓN					
BCIE	Abastecimiento acueducto metropolitano V etapa	AyA	AyA	399,2	Se está finiquitando el estudio de factibilidad para presentar la solicitud de aprobación de inicio de trámites de MIDEPLAN.
BNCR	Conclusión Mejoramiento del medio ambiente de la GAM	AyA	AyA	140,0	Se está finiquitando el estudio de factibilidad para presentar la solicitud de aprobación de inicio de trámites de MIDEPLAN.
			TOTAL	**569,1**	

Programa de Financiamiento de Apoyo Presupuestario

-en millones de dólares-

Acreedor	Programa / Proyecto	Deudor / Garante	Ejecutor	Monto	Estado actual
TRÁMITE LEGISLATIVO					
CAF	Línea de crédito para apoyo a la respuesta al COVID-19	GOBNO	CNE	50,0	Remitido a Leyes y Decretos del Ministerio de la Presidencia para que sea presentado a la Asamblea Legislativa.
NEGOCIACIÓN					
CAF	II Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (PBL)	GOBNO	MH	500,0	Contrato de Préstamo negociado el 05/06/2021. En proceso de completar aprobaciones institucionales (MIDEPLAN, BCCR, DCP y AP). Pendiente recomendación de la DCP a la AP.
			TOTAL	**550,0**	

Programa de Financiamiento de Apoyo Presupuestario

-en millones de dólares-

Acreedor	Programa / Proyecto	Deudor / Garante	Ejecutor	Monto	Estado actual
ESTRUCTURACIÓN					
AFD	II Programa de Apoyo Presupuestario con base en reforma de políticas de Apoyo al Plan de Descarbonización	GOBNO	MH	€100,0 (aproximada/ US$ 105,4)	En proceso de estructuración. Se cuenta con la matriz de Política.
AFD	Programa de Apoyo Presupuestario	GOBNO	MH	€100,0 (aproximada/ US$ 105,4)	En proceso de estructuración.
BCIE	II Programa de Apoyo Presupuestario (OPD)	GOBNO	MH	250,0	En proceso de estructuración.
BID	II Programa de Apoyo Presupuestario con base en reforma de políticas de Apoyo al Plan de Descarbonización	GOBNO	MH	200,0	En proceso de estructuración. Se cuenta con la matriz de Política.
BID	Programa de Apoyo Presupuestario	GOBNO	MH	200,0	En proceso de estructuración.
BID	Programa de Apoyo Presupuestario	GOBNO	MH	200,0	En proceso de estructuración.
BIRF	III Programa de Apoyo a las Finanzas Públicas (DPL)	GOBNO	MH	200,0	En proceso de estructuración.
			TOTAL	**1.260,8**	

Programación de desembolsos de los créditos de Apoyo Presupuestario en Negociación y Estructuración

-en millones de dólares-

Acreedor	Programa	Monto	Programación de desembolsos			
			2022	2023	2024	2025
AFD	II Programa de Apoyo Presupuestario con base en reforma de políticas de Apoyo al Plan de Descarbonización	105,4	68,5	36,9	N/A	N/A
AFD	Programa de Apoyo Presupuestario	105,4	0	68,5	36,9	N/A
BCIE	II Programa de Apoyo Presupuestario (OPD)	250,0	0	250,0	N/A	N/A
BID	II Programa de Apoyo Presupuestario con base en reforma de políticas de Apoyo al Plan de Descarbonización	200,0	200,0	N/A	N/A	N/A
BID	Programa de Apoyo Presupuestario	200,0	0	200,0	N/A	N/A
BID	Programa de Apoyo Presupuestario	200,0	0	0	0	200,0
BIRF	III Programa de Apoyo a las Finanzas Públicas (DPL)	200,0	0	200,0	N/A	N/A
CAF	Línea de crédito para apoyo a la respuesta al COVID-19	50,0	50,0	N/A	N/A	N/A
CAF	II Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (PBL)	500,0	0	500,0	N/A	N/A
TOTAL US$		**1.810,8**	**318,5**	**1.255,4**	**36,9**	**200,0**

Programación de desembolsos de Programas/Proyectos de Inversión, problemáticas y acciones.

Programaciones de desembolsos según Sector de Programas y Proyectos en Ejecución

(En millones de dólares)

Sectores	Monto pendiente por desembolsar (31/03/22)	Programación de desembolsos *					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027-2029
Salud, nutrición y deporte*	699,44	178,27	159,56	171,22	155,26	40,64	18,62
Infraestructura y Transporte*	621,81	326,30	298,99	35,70	11,36	0,00	0,00
Ambiente, energía y mares*	263,81	13,74	68,56	55,67	33,84	56,28	35,83
Hacienda pública, monetario y supervisión financiera*	151,29	7,97	72,03	45,59	22,82	5,00	0,00
Seguridad ciudadana y justicia	99,15	2,94	35,12	38,53	21,62	0,94	0,00
Comercio exterior	79,45	32,00	47,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Desarrollo agropecuario, pesquero y rural	74,91	7,49	14,61	17,75	17,04	12,23	5,80
GRAN TOTAL US$	**1.992,99**	**568,70**	**696,32**	**364,46**	**261,94**	**115,08**	**60,25**

*** Las Programaciones de desembolsos son las presentadas por las UE/UEN/UC al 31 de diciembre de 2021, por lo que en los casos de los sectores de Transporte, Ambiente, Salud y Hacienda Pública, la programación no resta el monto desembolsado durante el I trimestre del 2022.**

Principales problemáticas identificadas en la ejecución de los Programas/Proyectos

Debilidades/ Deficiencias de comunicación/ coordinación interna/externa.

Estudios y diseños base desactualizados y/o incompletos.

Incumplimientos relacionados con contratistas.

Dificultades para llevar a cabo expropiaciones, relocalización de servicios o conectividad de nuevos servicios públicos.

Declaratorias de contrataciones infructuosas o desiertas.

Falta de planificación en la Definición/Cesión/ Compra de terrenos.

Acciones para solventar problemáticas

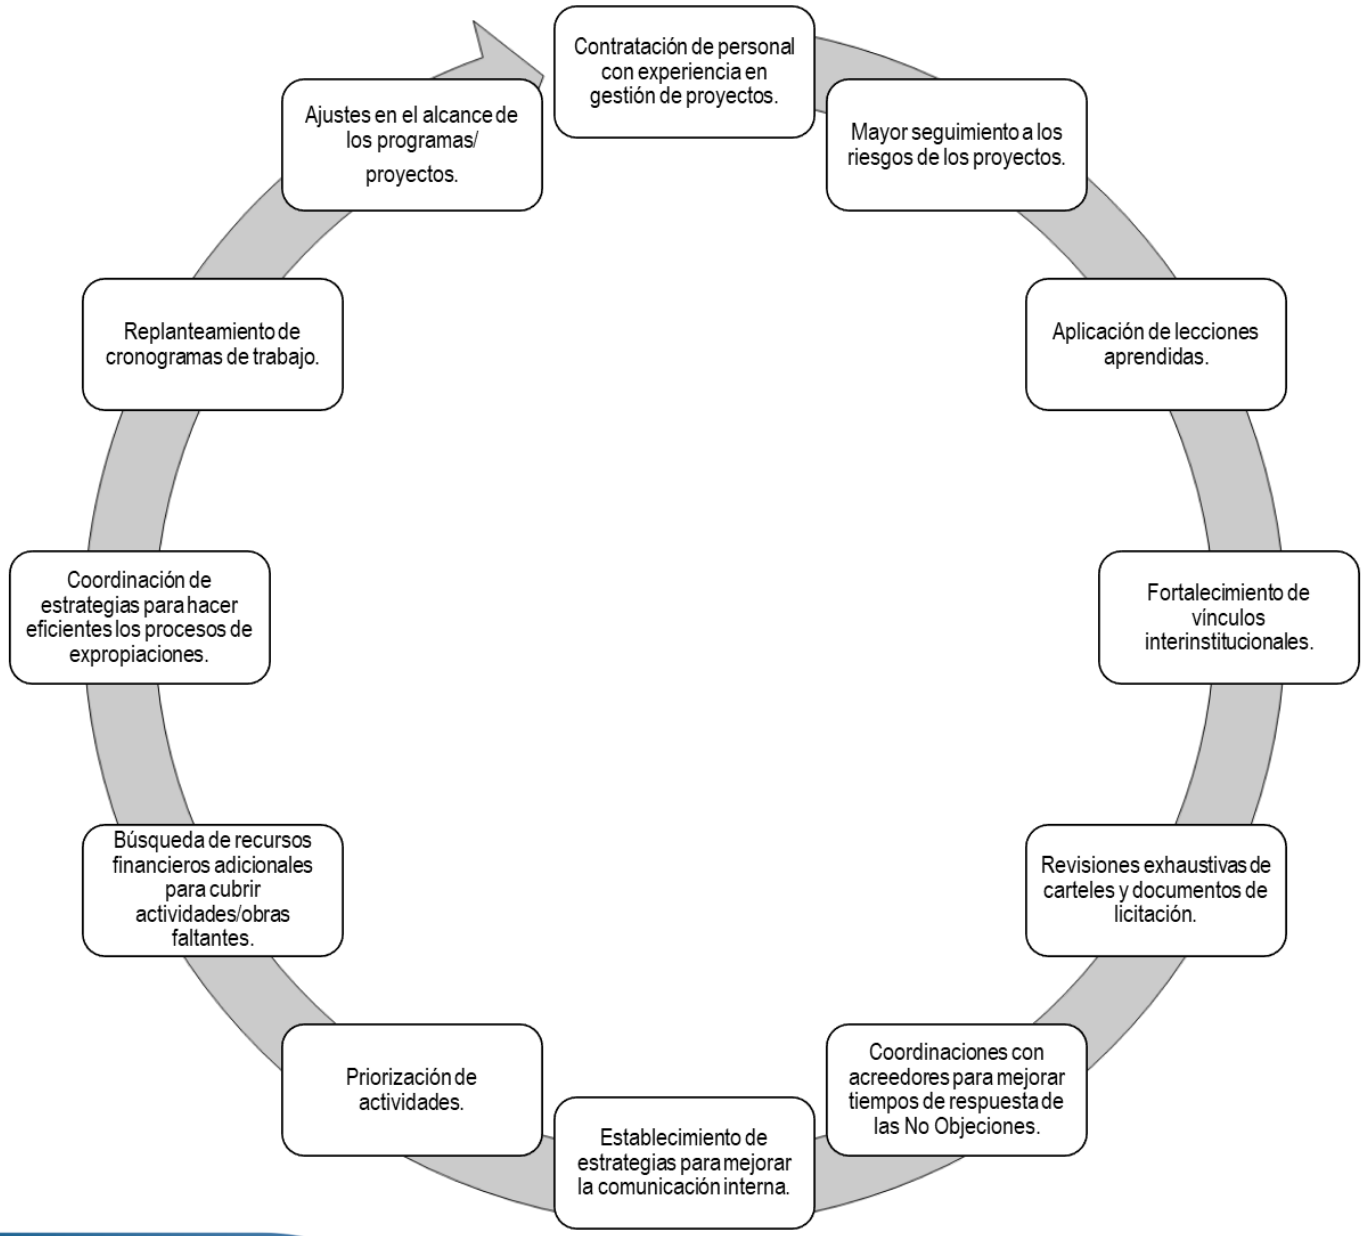

Consideraciones Finales

- ✓ Necesidad de robustecer labores de Planificación y Preinversión a nivel Institucional que faciliten la gestión, control y seguimiento de los futuros Programas/Proyectos.
  - Mejoras incorporadas al Proyecto de Ley del SNIP.
- ✓ Incorporación de la Dirección de Credito Público desde inicios de la estructuración de los programas.
- ✓ Importancia de valorar el potencial de ejecución a nivel Institucional en la negociación de un financiamiento (casos AYA, CONAVI/MOPT).
- ✓ Apoyo en la reducción de tiempos en AL para aprobar nuevos créditos y su incorporación presupuestaria (uso de decretos ejecutivos cuando sea posible).
- ✓ Esquemas de ejecución que promuevan la Gestión por Resultados, así como uso de mecanismos de financiamiento y ejecución alternativos para mitigar déficit fiscal.
- ✓ Definición por parte del Ejecutor de una estrategia formal para la adquisición/expropiación de los terrenos requeridos en forma oportuna.

Consideraciones Finales

- ✓ Recopilación y sistematización de lecciones aprendidas (aplicarlas en todo el ciclo de vida de los Programas/Proyectos).
- ✓ Celebrar reuniones tripartitas con Acreedores para el seguimiento, rendición de cuentas, compromisos y toma de decisiones oportunas.
- ✓ Promover que los Jerarcas de las Instituciones realicen reuniones periódicas de rendición de cuentas sobre el estado de avance de los Programas/Proyectos con las Unidades Ejecutoras/Coordinadoras.
- ✓ Control de misiones de los Bancos para seguimiento y/o generación de nuevas operaciones.
- ✓ Comunicación constante y asertiva con las UEs/UCPs para coadyuvar en toma de decisiones que faciliten la ejecución de los créditos/programas/proyectos.

Acciones tomadas por el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Crédito Público

- ✓ Aplicar la *Metodología de Seguimiento,* los *Lineamientos Generales dirigidos a UE/UCP, así como la Metodología para la clasificación del desempeño de los Programas/Proyectos financiados con endeudamiento externo*.

- ✓ Mantener seguimiento continuo y elaborar informes semestrales sobre los Programas/Proyectos de Inversión Pública en ejecución.

- ✓ Continuar efectuando reuniones de rendición de cuentas por parte de los responsables de la ejecución de los Programas/Proyectos.

- ✓ Participar en la revisión de cartera de créditos en coordinación con organismos acreedores multilaterales y Organismos Ejecutores.

- ✓ Coordinar la realización de *Talleres/Cursos de Gestión de Proyectos.*

Acciones tomadas por el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Crédito Público

- ✓ Apoyar a los Ejecutores directamente o mediante la coordinación con otros entes involucrados en la ejecución (SETENA, CGR, STAP, AL, entre otros).
- ✓ Promover que los Jerarcas Institucionales realicen seguimientos más exhaustivos y sesiones internas de rendición de cuentas a efectos de tomar acciones correctivas oportunas.
- ✓ Gestionar recursos para CTNR que coadyuven a contar a futuro con una cartera de programas/proyectos mejor formulados y con mayor avance a nivel de preinversión.
- ✓ Impulsar esquemas y mecanismos de financiamiento y ejecución alternativos.
- ✓ Apoyar a las UE en la resolución de problemáticas a lo interno de la Administración Financiera (Diferencial Cambiario, Plazas, Impuestos, entre otros).
- ✓ Coordinar en conjunto con los Organismos Financieros y los Ejecutores visitas de campo a los proyectos en ejecución.

Proy. Ruta 32

Monto del Préstamo (Millones)	Avance financiero a Marzo	Avance físico a Marzo	Contrapartida		Firma del contrato	Fecha Límite de Desembolso		Número de Prórrogas	Estado según DCP
			Original	Vigente		Original	Prórroga		
¥628,00	100,0%	52,11%	$147,7M	$125,42M	03/06/2013	07/12/2020	N/A	0	
$296,00	50,32%				03/06/2013	10/04/2023	N/A	0	

- La ejecución más significativa se reporta en la construcción de puentes vehiculares, con avances físicos por encima del 90%.
- El proyecto cuenta ya con 3 ampliaciones en la fecha de finalización (contrato CHEC) y la UE estima que se requerirán más ampliaciones. La última ampliación trasladó la fecha de finalización del proyecto para el 08 de febrero 2023.

Problemas:

- Retrasos en la entrega de Diseños producto de: Incumplimiento del Contratista y solicitud de modificaciones en los diseños de las obras (CONAVI). Quedan pendientes diseños de drenajes y calles marginales (los cuales no afectan las expropiaciones)
- El atraso en la expropiación y adquisición de terrenos ha repercutido significativamente en la ejecución y es una de las mayores complicaciones que se han reportado para este proyecto (siguen pendientes expropiaciones que afectan la construcción de Pasos superiores viales, retornos, intercambios, entre otros). Se proyectan expropiaciones en fechas posteriores a la fecha límite de desembolsos.
- Falta de acatamiento por parte de CHEC a los apercibimientos remitidos por la UE. El contrato CONAVI-CHEC no permite la aplicación de multas.
- Aumento en la estimación de recursos económicos (contrapartida nacional) por la inclusión de obras adicionales no contempladas en alcance inicial (estas obras adicionales y su financiamiento aún no se han incorporado oficialmente)
- El proyecto tiene más de 5 años de haber iniciado su ejecución y durante todo este periodo ha mantenido en un estado crítico.

Acciones tomadas:

- Reuniones periódicas con los diseñadores de CHEC para aclarar temas e información/ajustes requeridos.
- Búsqueda de apoyo del Ministro del MOPT para lograr acuerdos con CHEC respecto al rezago en los avances de obras y el desacato a las notificaciones enviadas por el CONAVI.
- Aplicación de algunas sanciones al contratista.
- Reuniones de seguimiento con diferentes involucrados, para avanzar con los procesos de expropiaciones.

Prog. Abast. Agua Potable S.J., Acued. Urb. y Alcant. Sanit. Puerto Viejo

Monto del Préstamo (Millones)	Avance financiero a Marzo	Avance físico a Marzo*	Contrapartida		Firma del contrato	Fecha límite de Desembolsos		Número de Prórrogas	Estado según DCP
			Original	Vigente		Original	Prórroga		
$103,5	96,1%	92,8%	69,8	73,2	26/03/2008	30/12/2016	30/06/2021	3	

- Programa finalizó el periodo de desembolsos el 30 de junio de 2021, sin embrago, actualmente ejecuta las obras comprometidas mediante contrato firmado.
- El Programa cuenta con 47 proyectos finalizados y 7 proyectos en ejecución.

Problemas:

- Variación en el alcance del Programa, debido a que no se comprometió el 100% de los recursos externos e internos.
- Debilidad en los estudios de pre-inversión que recibió la UE por parte de otros departamentos del AyA.
- Retrasos en los avances de obra de los Proyectos en ejecución por el retraso en la importación de los materiales de construcción y equipos necesarios para las obras.
- Retrasos en la adquisición de Terrenos.

Acciones tomadas:

- Se asumirá con fuente interna todos los Proyectos que no pudieron comprometerse con la fuente externa.
- Seguimiento cercano a los Proyectos en ejecución por parte de la UE.

*Avance físico en revisión por parte de la UE

Zonas Prioritarias

Monto del Préstamo (Millones)	Avance financiero a Marzo	Avance físico a Marzo	Contrapartida		Firma del contrato	Fecha límite de Desembolsos		Número de Prórrogas	Estado según DCP
			Original	Vigente		Original	Prórroga		
EUR 79,3	0,0%	18,1%	EUR 8,7	EUR 8,7	20/12/2018	30/06/2024	N/A	0	

- Se solicitó al KfW la No Objeción de la Contratación del Consultor de Implementación el 1° de abril.
- Se adquirieron los terrenos de Jacó, Palmares y Quepos. En el caso de Golfito, se realizó la modificación presupuestaria para la constitución de la servidumbre San Juan de Golfito.

Problemas:

- Retraso en la contratación del Consultor de Implementación (CI) según lo estimado en el cronograma del Programa.
- Aumento en los costos de la obras del Programa por más de EUR 35.000.000.
- Retraso en la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el AyA-INCOFER, lo cual tiene detenido el proceso de adquisición de la servidumbre San Juan, único terreno pendiente para ser gestionado (Golfito).

Acciones tomadas:

- El Banco aportó un consultor que revisó todo lo requerido al Programa, previo a la contratación del CI, por lo cual se tiene avance en el Cartel de Golfito, mismo que servirá de base para los restantes proyectos.
- Reuniones con el Banco para actualizar los costos de las obras, según estimaciones actuales de la UEN y analizar alternativas para la ejecución del Programa.

Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora

Monto del Préstamo (Millones)	Avance financiero a Marzo	Avance físico a Marzo	Contrapartida		Firma del contrato	Fecha Límite de Desembolso		Número de Prórrogas	Estado según DCP
			Original	Vigente		Original	Prórroga		
$154,6	7,1%	19,33%	$31,3	$31,3	04/05/2018	30/04/2024	N/A	0	

- De las 14 obras que forman parte del Programa el que más ha avanzado es el de Ampliación del acueducto de San Mateo y Jesús María, Alajuela, que ya se encuentra finalizado y está en operación.
- Además se ha avanzado en las obras de ampliación y mejoramiento del sistema de acueducto de Bagaces, Guanacaste, que actualmente cuenta con un 69.32% de avance general.
- En el resto de las obras se avanza en actividades de la fase de formulación referentes a la viabilidad ambiental, readecuaciones de diseños y en la realización de términos de referencia para la contratación de las obras.

Problemas:

- El problema más delicado del Programa, son los constantes cambios que se le solicitan a los diseños, por parte de los clientes internos del AyA.
- Problemas en la adquisición de terrenos por poca anuencia del propietario a su venta, problemas de acondicionamiento en ciertas etapas del año, lentitud en la entrega de terrenos donados por la Municipalidad necesario para la construcción.

Acciones tomadas:

- La UE solicita informes detallados de las acciones a subsanar para satisfacer las necesidades del proyecto.
- El AyA solicita estudio registral y catastral en el terreno, para definir la ruta de trabajo.
- Se le da seguimiento al estado del proyecto de ley ante la Municipalidad.

Programa de Agua Potable y Saneamiento

Monto del Préstamo (Millones)	Avance financiero a Marzo	Avance físico a Marzo	Contrapartida		Firma del contrato	Fecha Límite de Desembolso		Número de Prórrogas	Estado según DCP
			Original	Vigente		Original	Prórroga		
$73,0	72,08%	84,42%	$12,0	17,93	26/09/2012	24/09/2019	24/07/2024	2	

- La conclusión de las obras originalmente contratadas para el proyecto Redes Zona Sur (Componente I), el pasado 22 de enero de 2022, con poco más de 17 kilómetros instalados en Redes Terciarias.
- Inicio de pruebas operativas en la Estación Calle Nueva, del proyecto El Llano de Alajuelita (Componente III).
- Giro de la Orden de inicio de las obras del proyecto “Construcción de un Tanque de Almacenamiento y Línea de Distribución, Asentamiento La Carpio, La Uruca, San José” (Componente III), emitida el pasado 4 de febrero de 2022 con notificación de inicio de las obras para el 1° de marzo de 2022, el cual pretende ejecutarse durante los siguientes 9 meses.

Problemas:

- Durante el proceso de ejecución de obra, el Contratista ha encontrado diversas interferencias como, por ejemplo; tuberías potables, pluviales, de telecomunicaciones entre otras.
- La falta de financiamiento para concluir el Proyecto PMAAMSJ podría impedir cumplir a cabalidad con el objetivo y alcance del Proyecto.
- El contratista no logre finalizar la obra por declaración de insolvencia, tiene problemas en el pago de los subcontratistas de San José de Upala..

Acciones tomadas:

- Se sigue en busca de los US$140 millones para el mejoramiento ambiental. Actualmente están en revisión del estudio con MIDEPLAN para reenviar la solicitud al Banco Nacional.
- Par el caso de la obra de San Jose de Upala se busca activar el mecanismo contractual para lograr la que se cumpla el alcance del contrato.

Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón

Monto del Préstamo (Millones)	Avance financiero a Marzo	Avance físico a Marzo	Contrapartida		Firma del contrato	Fecha Límite de Desembolso		Número de Prórrogas	Estado según DCP
			Original	Vigente		Original	Prórroga		
$55,1	0,91%	19,33%	$1,61	$1,61	07/01/2019	26/06/2023	N/A	0	

SENARA:

- Contratación Levantamiento Lidar: Se realizó la revisión técnica y económica de las ofertas y se obtuvo la no objeción del BCIE para dichas revisiones. Se comunicó la adjudicación a los oferentes.
- Contratación de obras en cauces Chitá- Santa Fe, Quebrada Chocolate, Canal Santa Rosa (Westfalia) y Canales menores: Se trabajó en la preparación de los documentos de contratación, entre ellos, las especificaciones de construcción e inicio de elaboración del cartel.
- Contratación de supervisión y seguimiento: Se prepararon los TDR de la contratación y se está en proceso de revisión y ajuste.

AyA:

- Sector I: En proceso de recepción de ofertas para la contratación de la construcción del Sector.
- Sector II: En proceso de adquisición de los terrenos necesarios.

Problemas:

- **SENARA:** Retraso en el proceso de avalúos y de negociación con los afectados.
- Atraso en la ejecución del proyecto por cuanto no es posible atender la totalidad de las asignaciones según lo programado inicialmente debido a la falta de personal en la UE.
- **AyA:** Diferentes problemas con la adquisición de terrenos del Sector II, entre ellos por invasión en los identificados.
- Demora con los diseños del Sector II al no contar con la adquisición de los terrenos.

Acciones tomadas:

- **SENARA:** Retomará los trámites ante la STAP con la finalidad de obtener más plazas para la Unidad Ejecutora
- **AyA:** Replicar la experiencia vivida en el Sector I en torno a la elaboración del diseño, especificaciones técnicas, requisitos y más.

Programa de Obras Estratégicas de Infraestrutura Vial

Monto del Préstamo (Millones)	Avance financiero a Marzo	Avance físico a Marzo	Contrapartida		Firma del contrato	Fecha límite de Desembolsos		Número de Prórrogas	Estado según DCP
			Original	Vigente		Original	Prórroga		
$340,00	100,00%	94,00%	$30,54	144,86%	14/12/2012	29/05/2017	29/05/2021	1	

- **Duplicación Puente sobre el Río Virilla, Ruta Nal. No.1**, finalizado.
- **Acceso a la TCM**, finalizado.
- **Duplic. Puente sobre el Río Virilla, R. Nac. No.147**, finalizado.
- **Construcción del Puente Rio Virilla – Saprissa** Finalizado
- **Paso a Desnivel Rotonda Guadalupe**, Finalizado
- **Paso a Desnivel Rotonda Garantías Sociales**, finalizado.
- **Paso a Desnivel La Bandera**, con un 96,26% de avance físico, esta en periodo de notificación de defectos
- **Corredor Vial Circunvalación Norte** con un 78% de avance físico.

Problemas:

- Retraso en la relocalización de servicios públicos
- Atraso por condiciones climáticas
- Omisiones parciales de servicios del AyA dentro de los diseños originales

Acciones tomadas:

- Se realizan reuniones de coordinación con cada institución para dar seguimiento a los diseños.
- Se coordina con el A y A, CNFL y ICE para los planos de reubicación de servicios de Calle Blancos.

Ampliación al Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial

Monto del Préstamo (Millones)	Avance financiero a Marzo	Avance físico a Marzo	Contrapartida		Firma del contrato	Fecha límite de Desembolsos		Número de Prórrogas	Estado según DCP
			Original	Vigente		Original	Prórroga		
$90,05	0,00%	6,00%	$2,67	2,67%	16/11/2020	29/04/2027	N/A	0	

- **Corredor Vial Circunvalación Norte, específicamente en la Unidad Funcional V** con un 31% de avance físico.
  - Se inició con trabajo de pilotes a partir de la Pila 50 a Pila 56
  - Se realiza pilotes de la pantalla del paso inferior.
  - Excavación del tramo a desnivel
  - Construcción de zapatas de pilas hasta la 59

Problemas:

- Atrasos en el cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso

Acciones tomadas:

- Se envió oficio DM-2022-1194 con el cumplimiento de las condiciones previas al primero desembolso y se efectuó el mismo por la suma de $26 millones el día 29 de abril del 2022.

Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM

Monto del Préstamo (Millones)	Avance financiero a Marzo	Avance físico a Marzo	Contrapartida		Firma del contrato	Fecha límite de Desembolsos		Número de Prórrogas	Estado según DCP
			Original	Vigente		Original	Prórroga		
$130,00	8,62%	27,30%	$46,93	46,93%	12/08/2015	12/08/2023	N/A	0	

- Se adjudicó el Consultor Especializado y quedó en firme a inicios de Julio 2019.
- Consultor ya presentó el 1er. Informe correspondiente a la Etapa 1.1. (Levantamiento de Línea Base).
- Se finalizó la Etapa 1-3 (Propuestas Detalladas).
- Se trabaja en el Informe de la Etapa 2 (Asesoría y asistencia durante los procesos de contratación)

Problemas:

- Alta rotación de personal
- Atraso en la publicación de las licitaciones, lo cual generó una paralización de más de 7 meses, dicha suspensión realizada por la Gerencia General del AyA.

Acciones tomadas:

- Se está en el proceso de contratación para llenar las plazas faltantes.
- La elaboración de documentos estándar para acelerar los procesos de licitación. El adelantar acciones y tareas que se ubicaban en las licitaciones de sistemas de información con recursos internos del proyecto.

Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario

Monto del Préstamo (Millones)	Avance financiero a Marzo	Avance físico a Marzo	Contrapartida		Firma del contrato	Fecha límite de Desembolsos		Número de Prórrogas	Estado según DCP
			Original	Vigente		Original	Prórroga		
$270,00	51,56%	88,50%	$82,88	88,82%	07/01/2014	10/10/2019	10/10/2023	1	

- Hospital La Anexión, finalizado
- Torre Este del Hospital Calderón Guardia Etapa 1, y Etapa 2, finalizados
- Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas, avance físico 28,54%

Problemas:

- Atraso en la orden de inicio. Los diseños definitivos tuvieron una duración de casi dos años, lo cual atraso el Proyecto.

Acciones tomadas:

- Se dio la orden de inicio a principios de enero 2022.
- Seguimiento continuo a las obras que se van ejecutando, con el fin de minimizar tiempos de ejecución.

Proy. Hacienda Digital para el Bicentenario

Monto del Préstamo (Millones)	Avance financiero a Marzo	Avance físico a Marzo	Contrapartida		Firma del contrato	Fecha Límite de Desembolso		Número de Prórrogas	Estado según DCP
			Original	Vigente		Original	Prórroga		
$156,64	3,42%	1,37%	N/A	N/A	06/04/2020	31/03/2026	NA	0	

- Al cierre de marzo, se tienen contabilizadas un total de 43 contrataciones requeridas por el Proyecto, de las cuales 33% no han iniciado el proceso de contratación, 37% están en proceso de contratación y 30% ya iniciaron su ejecución.
- Las contrataciones más avanzadas son: Consultor Especialista en Ingresos-Especialista en Aduanas (15%), Consultor Especialista en Transformación Digital (23,80%), Consultor Especialista en Egresos-Especialista en Finanzas (24%), Consultor para el rol de Especialista en Gestión Socio Ambiental (62,50%) y Consultor Especialista en Gestión Documental (41,67%).
- En lo que respecta particularmente a la contratación de los Sistemas Centrales, estos se encuentran en proceso de contratación y los avances reportados por la UCP son los siguientes: Adquisición Sistema Financiero - Administrativo y Recursos Humanos 2,68%, Adquisición Sistema Tributario 3,21% y Adquisición del Sistema Aduanero 2,64%.

Problemas:

- Demoras por parte del Banco Mundial en la revisión y aprobación de Términos de Referencia de contrataciones.
- Atrasos en los procesos de contratación de los sistemas centrales del proyecto, debido a demoras en la contratación de los profesionales de la UCP.

Acciones tomadas:

- Solicitud expresa al Banco Mundial del apoyo urgente de especialistas, para la revisión de los Términos de Referencia realizados.
- Sesiones de trabajo conjuntas entre la UCP y el Banco Mundial para revisión de documentación que requiere su aprobación o No Objeción.
- Contratación de consultores (UCP) para apoyo en los procesos de contratación.

PIF

Monto del Préstamo (Millones)	Avance financiero a Marzo	Avance físico a Marzo	Contrapartida		Firma del contrato	Fecha límite de Desembolsos		Número de Prórrogas	Estado según DCP
			Original	Vigente		Original	Prórroga		
$100,00	20,5%	33,0%	N/A	N/A	17/12/2015	31/05/2022	31/05/2024	1	

- Orden de inicio de la Licitación Pública Internacional de la construcción y el equipamiento básico de Paso Canoas (lote 1 del proceso PIF-CR-216-LPI-O-2021) el 5 de abril de 2022.
- Se publicó la Ley 10.127 el 02 de marzo de 2022, Ley que regula la creación y el desarrollo del Puesto Fronterizo Las Tablillas.

Problemas:

- Aumento en los costos estimados del Puesto Fronterizo de Paso Canoas en un 30% más según el presupuesto referencial.
- Aumento en el plazo de contratación de la supervisión de obra del ingeniero FIDIC , ya que no se logró encontrar mercado competitivo de una firma supervisora que cumpliera dichos términos.

Acciones tomadas:

- Se varía el orden de las Licitaciones para adjudicar las obras de mayores montos (Paso Canoas y Peñas Blancas) y posteriormente las de Sabalito y Las Tablillas. La Licitación del Puesto Fronterizo de Peñas Blancas concluirá en mayo 2022.
- Se modificó la contratación del ingeniero FIDIC a consultores individuales bajo este mismo tipo de contrato, las contrataciones finalizaron en marzo 2022.

PINN

Monto del Préstamo (Millones)	Avance financiero a Marzo	Avance físico a Marzo	Contrapartida		Firma del contrato	Fecha límite de Desembolsos		Número de Prórrogas	Estado según DCP
			Original	Vigente		Original	Prórroga		
$35,00	91,03%	100%	N/A	N/A	02/04/2013	01/04/2019	30/09/2021	2	

- Este Programa concluyó el periodo de desembolsos el 30 de setiembre de 2021 y remitió Informe de Cierre y Finiquito el 17 de diciembre de 2022.

- Actualmente ejecuta los Fondos Remanentes del Programa, es decir los fondos comprometidos y no desembolsados de los beneficiarios del Programa.

Problemas:

- No se cumplió con la meta física en los subcomponentes: 1.2.1 “Empresas apoyadas por medio de ayudas complementarias para proyectos de innovación y/o desarrollo tecnológico en empresas individuales o grupos de empresas”, y el 2.2.2 “Programa de Atracción de Talentos” afectando el alcance inicial del Programa.

- No se desembolsó el 100% de los recursos del Programa, ya que no fue posible comprometer todos los recursos previstos en la fecha de corte indicada por el Banco para tener los contratos firmados.

Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras y Construcción del Laboratorio Nacional de Aguas (PAACC)

Monto del Préstamo (Millones)	Avance financiero a Marzo	Avance físico a Marzo	Contrapartida		Firma del contrato	Fecha Límite de Desembolso		Número de Prórrogas	Estado según DCP
			Original	Vigente		Original	Prórroga		
$111,1	1,9%	10,26%	$28,7	$28,7	07/05/2019	28/04/2026	N/A	0	

- En las 5 obras de aguas y saneamiento, se avanzó en los estudios de factibilidad en el reconocimiento preliminar e identificación de estudios básicos requeridos para los sistemas de tanques y redes, así como análisis de los terrenos de las estaciones de bombeo, en la atención y revisión de algunas consultas en Bienes Inmuebles.
- Se inicia los trabajos de Ejecución de Estudios y Diseños Preliminares. En la construcción de Alcantarillado Sanitario de Moín, se realizan las coordinaciones necesarias para avanzar en nuevas opciones para elaborar los Diseños Finales Tercerizados.
- Se realizaron ajustes al cronograma del proyecto del Edificio del Laboratorio Nacional de Aguas LNA ante un nuevo proceso de licitación al declararse la anterior desierta, que implico de una actualización de la valoración de riesgos y de ajustes a los planos constructivos, así como del presupuesto.

Problemas:

- Atrasos en proceso de contratación administrativa de la Licitación Pública Internacional del LNA, que requirió de ajustes en el periodo de revisiones, aclaraciones y subsanaciones de las ofertas.
- Ante los cambios en las condiciones para la adquisición de los terrenos, de acuerdo a la Factibilidad Técnica se generan constantes atrasos en el desarrollo de los diseños finales al realizarse constantes cambios en los mismos.

Acciones tomadas:

- El Consultor de Implementación analiza los Estudios de Factibilidad y viabilidad de los componentes del proyecto. Además, está generando las alertas correspondientes para tomar las medidas necesarias para obtener el mejor producto final de los Diseños Finales.

Programa Red Vial Cantonal II

Monto del Préstamo (Millones)	Avance financiero a Marzo	Avance físico a Marzo	Contrapartida		Firma del contrato	Fecha Límite de Desembolso		Número de Prórrogas	Estado según DCP
			Original	Vigente		Original	Prórroga		
$144,0	37,72%	46,00%	$8,00	$8,00	20/09/2018	20/09/2023	N/A	0	

- Respecto a los paquetes de obras viales 1, 2, 3 y 4 se encuentran completamente concluidos.
- Se realizó el ajuste de las factibilidades por cambio climático de los 13 proyectos del paquete 11.
- Contratos firmados de las contrataciones PRVC-II-143-CP-O-2021 y PRVC-II-144-CP-O-2021.

Problemas:

- Atrasos en diferentes procesos (consultas socioambientales, capacitación, elaboración de estimaciones) con las Municipalidades, debido a que indican que deben atender otras actividades como prioridad.

Acciones tomadas:

- Los casos conocidos como “Cochinilla” y “Diamante” han tenido efectos adversos en el Programa y en especial su impacto en la Gestión Vial. Por lo tanto, según la UEC, se trabaja con mayor rigurosidad para que los próximos procesos de licitación continúen cumpliendo con la política de adquisiciones del Banco y con la legislación nacional; en razón de lo anterior, el equipo del Programa seguirá en los próximos meses cercanos impulsando nuevas contrataciones por Comparación de Precios y Licitaciones Internacionales, con o sin precalificación, según corresponda, en un afán de devolverle el dinamismo de ejecución de obras que ha caracterizado al Programa, y con el acompañamiento correspondiente del Banco.

Programa de Infraestructura de Transporte

Monto del Préstamo (Millones)	Avance financiero a Marzo	Avance físico a Marzo	Contrapartida		Firma del contrato	Fecha Límite de Desembolso		Número de Prórrogas	Estado según DCP
			Original	Vigente		Original	Prórroga		
$400,00 $50,00	60,00% 40,00%	50,53%	N/A	N/A	13/11/2014	13/11/2020	12/11/2022	1	

- **Ampliación y Rehabilitación Barraca - Limonal y La Angostura**. Avance físico del 15,45% Se avanza en las actividades de limpieza y remociones, movimiento de tierra y drenaje.
- **Ampliación y Rehabilitación Limonal - Cañas:** Avance físico del 68,45% Se avanza en las actividades de movimiento de tierra, pavimento. rígido, alcantarillas, drenajes, muros y en los puentes Lajas, Higuerón y Javillos, así como en el Intercambio de Limonal.
- **Rehabilitación Playa Naranjo - Paquera:** Avance físico 97,50%, esta en periodo de notificación de defectos.
- **Rompeolas Puerto Caldera:** Avance físico 97,75%, esta en periodo de notificación de defectos.

Problemas:

- Atraso en el proceso de expropiaciones.
- Atrasos en ejecución de los Proyectos, adheridos al Covid – 19 y efectos climáticos.
- Suspensión de los procesos de expropiación a la espera del rediseño del proyecto.
- Aumento en la estimación de recursos económicos por la inclusión de obras adicionales no contempladas en alcance inicial.

Acciones tomadas:

- Rediseñar varios de los tramos con la finalidad de eliminar expropiaciones.
- Solicitar una prorroga de 30 meses adicionales, para poder ejecutar el 100% de los Proyectos asignados.
- Se ha dado prioridad al trabajo en los sectores donde el tronco se encuentra liberado.
- Finalmente se están revisando las ingenierías de valor, con esto se pretende desafectar en gran parte del tronco para que el Contratista ejecute esa zona del Proyecto.

Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas

Monto del Préstamo (Millones)	Avance financiero a Marzo	Avance físico a Marzo	Contrapartida		Firma del contrato	Fecha límite de Desembolsos		Número de Prórrogas	Estado según DCP
			Original	Vigente		Original	Prórroga		
$125,00	16,00%	42,04%	$53,00%	$55,60	18/03/2020	29/09/2025	N/A	0	

- **Construcción Intercambios Taras – La Lima:** Avance físico 8,78% Se ejecutan las actividades de limpieza y remociones, movimiento de tierra, pavimentos, drenajes y estructuras. Actualmente la obra se encuentra paralizada.
- **OBIS Lote 1, Puentes sobre Río Ciruelas, Alajuela, Río Segundo, Paso desnivel Firestone y Conector Barreal:** Avance físico 97,57% esta en periodo de notificación de defectos**.**
- **OBIS Lote 2 A y B, Intercambio Circunvalación y Puente sobre el río Torres, Peajes río Segundo y Naranjo:** Avance físico 97,57% Lote 2A esta en proceso de revisión de diseños y Lote 2B esta en proceso de contratación.
- **Construcción Ruta Nacional No. 35, Sección: Bernardo Soto - Abundancia:** Se finalizó el proceso de pre-inversión y actualmente se encuentra en procesos de expropiaciones y contratación del regente ambiental.

Problemas:

- Atraso en el proceso de expropiaciones.
- Atraso en actividades de obra por interferencia de servicios públicos y suspensión del CO por parte de Contratista por atraso en el trámite de pagos.
- Se requirieron reprogramaciones de Obra por afectaciones con Importaciones, pandemia, gestiones con entidades por pandemia y relocalizaciones de servicios.
- Atraso en la formalización de una adenda o acuerdo de cooperación entre el MOPT y el Fideicomiso Ruta Uno.

Acciones tomadas:

- Se han priorizado expedientes con los Juzgados y la Procuraduría General de la República, sin embargo, los procesos de expropiación no generan afectación al proyecto.
- Implementación de medidas para el traslado de servicios de red eléctrica y prioridad de pago para las estimaciones aprobadas por el Ingeniero.
- Se viene coordinando con el contratista para mejorar los plazos de las gestiones afectadas
- Implementado una estrategia en conjunto entre la Unidad Supervisora, la Unidad Ejecutora y la Unidad Asesora con el fin de establecer tiempos máximos de gestión de cada una de las partes

Prevención de la Violencia

Monto del Préstamo (Millones)	Avance financiero a Marzo	Avance físico a Marzo	Contrapartida		Firma del contrato	Fecha límite de Desembolsos		Número de Prórrogas	Estado según DCP
			Original	Vigente		Original	Prórroga		
$100,00	0,85%	1,45%	N/A	N/A	17/03/2020	17/03/2026	0	0	

- Se realizó la apertura de ofertas del paquete N° 1 de Delegaciones Policiales (comprendido por la Río Frío y Siquirres), así como el proceso de evaluación de las mismas.
- Se inició la elaboración de los TdR para la contratación del diseño de las Delegaciones Policiales del paquete N° 2 (lista preliminar: Guatuso, Guácima, Cahuita, Chomes, San Joaquín, Santa Ana, Patarrá, Filadelfia, Gravilias, Bataan, Las Juntas, San Ramón y El Guarco).
- Se gestionó la contratación del consultor individual para la elaboración de un diagnóstico y plan de ejecución para los desarrollos informáticos de la plataforma DATAPOL.

Problemas:

- Atraso en la correcta coordinación y operación financiera de la UCP.
- Se recibieron ofertas con montos por encima de los planificados para la contratación de los techados de las áreas deportivas en centros cívicos por la paz de Garabito y Santa Cruz.
- Dificultades para obtener 8 terrenos, dado que aún no se han encontrado ubicaciones que cumplan los estándares para desarrollar algunas obras.

Acciones tomadas:

- Se realizaron reuniones y recibieron colaboración por parte del Ministerio para acelerar el proceso de organización.
- Se analiza realizar un cambio en el diseño de los techados de 2 Skate Parks para ajustarse al presupuesto actualizado.
- Se realizan reuniones con municipalidades e instituciones de interés para obtener los terrenos idóneos a la brevedad.

Dirección de Crédito Público

Ministerio de Hacienda
