

Consejo Directivo “Modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del
Ministerio de Hacienda”
Libro de actas

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 03-2022. Acta número tres correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por el Consejo Directivo del Proyecto Hacienda Digital, a las nueve horas con tres minutos del día veinticinco del mes de marzo del año dos mil veintidós, por medio de la herramienta Microsoft Teams, presidida por el señor Elian Villegas Valverde, Ministro de Hacienda, la señora Alicia Avendaño Rivera, secretaria y Directora a.i del Proyecto Hacienda Digital, la señora Elizabeth Guerrero Barrantes, Viceministra de Ingresos, el señor Isaac Castro Esquivel Viceministro de Egresos, la señora Hellen Morales Serrano, Oficial Mayor y Directora Administrativa y Financiera.-----

CAPITULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

ARTÍCULO 1: Lectura, comentario y aprobación del orden del día. Se somete a consideración y se aprueba el orden del día de la siguiente forma: 1. Estado de situación de las adquisiciones, 2 Estudio de Mercado de RFI y GPS, 3. Informe de Avance del Proyecto 4. Temas Varios. Por lo anterior se somete a consideración y los señores miembros toman el siguiente **ACUERDO EN FIRME N° 1: SE DA POR APROBADO EL ORDEN DEL DÍA.** ---

CAPITULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.-----:-----

ARTÍCULO 2. Lectura, comentario y aprobación del acta de la sesión ordinaria 02-2022 del 25 de febrero del 2022. -----

ACUERDO 2. Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 02-2022 del 25 de febrero del 2022.

ACUERDO EN FIRME. -----

Consejo Directivo “Modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del Ministerio de Hacienda”
Libro de actas


CAPITULO III. PRESENTACIÓN Y ANALISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS ADQUISICIONES.-----

ARTÍCULO 3. Presentación de las adquisiciones. Nos encontramos en la etapa de publicación de las licitaciones, y ya se cuenta con la no objeción por parte del Banco Mundial el cartel de licitación Tributación. Los carteles de Aduanas y Tributación se espera la No Objeción por parte del banco Mundial en el mes de abril. Se solicita al señor Ministro pedir mayor agilidad de aprobación de la No objeción al Banco Mundial



Se informa que ya se tiene conformadas las comisiones para la evaluación, y se está en el proceso de capacitación de los integrantes.

Consejo Directivo “Modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del Ministerio de Hacienda”
Libro de actas

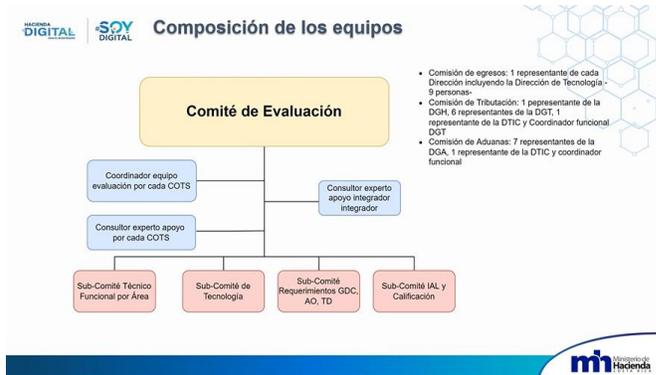

Comité: Sistema de la Administración Tributaria

- Miembros del Comité**
 - Gabriela Amor Montero – Coordinadora del equipo
 - Jacqueline Gutierrez Madrigal
 - Gilberth Meza Rodriguez
 - Hazel Palma Ramirez
 - Karolay Quiros Gomez
 - Mercedes Rapso Salas
 - Randy Chavarria Martinez
 - Yendry Patricia Soto Sanchez
 - Emilio Chacon Umana
- Miembros del Sub-Comité de Exoneraciones y Cobro Judicial**
 - Steve Carazo Chanto
 - Claudio Ulloa Loria

Comité: Sistema Financiero y Recursos Humanos

- Miembros del Comité**
 - Gerardo Retana Espinoza (Presupuesto)
 - Victor Trejos (Tesorería)
 - María Eugenia Espinoza Zamora (Servicio Civil)
 - María Julieta Jinesta Valverde (Contabilidad)
 - Vivian Martínez Rivera (STAP)
 - Stephanie Carvajal Gorgona (Credito Público)
 - Isabel Ramos (DTIC)

Comité: Sistema Aduanero

- Miembros del Comité**
 - Sandra Mena Ulate funcionaria del Departamento de Estadística y Registro de la Dirección de Gestión Técnica.
 - Wendy Madrigal Arroyo funcionaria del Departamento de Procesos Aduaneros de la Dirección de Gestión Técnica.
 - Luis Monge Hidalgo funcionario del Departamento de Denuncias la Dirección de Fiscalización
 - Juan Gabriel Gódinez Chacón funcionarios de la Aduana Santamaría. Como representante de las Aduanas.
 - Heberto Noguera Contraparte Funcional del Proyecto.
 - Magaly Guevara DTIC
 - Edgar Rodriguez DTIC

ACUERDO 3. Se da por recibida la presentación y se solicita al Ministro realizar una solicitud de apoyo al Banco Mundial para agilizar el proceso de la NO objeción de los carteles de licitación pendientes (Aduanas y Financiero). **ACUERDO EN FIRME.** -----

CAPITULO IV. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SUMINISTRO DE LOS RFI Y GPS.-----

ARTICULO 4. Se presenta los resultados del estudio de mercado del proyecto RFID y GPS definido por la Dirección General de Aduanas.

Consejo Directivo “Modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del Ministerio de Hacienda”

Libro de actas

El estudio de mercado cubrió el Suministro de RFI y GPS. SERVICIO DE TRAZABILIDAD para el control de tránsitos que incluye los ítems aprobados por el Dirección General de Aduanas, a saber::

1- Detalle de los ítems a cotizar estudio de mercado:

Cantidad(*)	Productos y Servicios
259 080 Marchamos RFID al año	Suministrar, distribuir y colocar Marchamos de Seguridad requeridos.
15 puntos	Instalar antenas para los puntos de control identificados en coordinación con la DGA.
144 192 GPS´s al año	Suministrar, colocar y activar dispositivos GPS bajo demanda (aproximadamente al 25% del universo de los tránsitos).
1	Desarrollar un software independiente para la trazabilidad de los dispositivos Marchamos RFID y GPS, así como, proporcionar, al menos, tres estaciones de trabajo en la ubicación que sea definida por la Administración.
1	Realizar los desarrollos informáticos dentro del sistema informático aduanero que permita la recepción de toda la información y alertas que generen los dispositivos marchamos RFID y GPS, así como, los API´s de RFID. Además, los desarrollos informáticos para gestionar el inicio y fin de todos los tránsitos.

(*)Cantidades tomadas del volumen de tránsitos nacionales e internacionales proporcionado por la DGA.

**Consejo Directivo “Modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del
Ministerio de Hacienda”
Libro de actas**

2- Invitación al estudio de Mercado:

Se remitió la invitación de participar en RFI (Estudio de Mercado) a seis empresas recomendadas por la DGA a saber:

- COTECNA INSPECTION SA (El Salvador)
- CIFSA (Costa Rica)
- Hi-G-Tek Solutions (Israel)
- TAS Tecnología, Acceso & Seguridad (Regional)
- TLH Logística (Costa Rica)
- Consorcio AESA-EY
- Navegación Satelital de Costa Rica, S.A. (NAVSAT)

3- Se estableció las siguientes fechas para la remisión de las propuestas del estudio de Mercado:

Actividad	Fechas
Fecha de Publicación de Solicitud de Información (RFI)	04/12/2022
Fecha máxima para enviar preguntas	Hasta 01 de febrero
Fecha de Respuesta a las preguntas	Hasta 08 de febrero
Fecha máxima para presentar la Información	Hasta 15 de febrero

4- Se recibieron propuestas al estudio de Mercado de cuatro empresas a saber:

- COTECNA INSPECTION SA (El Salvador)
- Hi-G-Tek Solutions (Israel)
- Navegación Satelital de Costa Rica, S.A. (NAVSAT)

Consejo Directivo “Modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del
Ministerio de Hacienda”
Libro de actas

5- Los resultados de las propuestas son los siguientes:

Empresa	COTECNA	Hi-G-Tek	NAVSAT(1)
Costo total del servicio por año	\$ 5 125 000,00	\$ 6 612 000,00	\$ 4 927 580,00
Costo total de servicio por 4 años	\$ 20 500 000,00	\$26 451 000,00	\$ 19 710 320,00
Plazo de entrega	120 días	3 meses	8 meses

Conclusiones:

- De acuerdo al estudio y las ofertas recibidas, la mejor cotización económica:
COTECNA
 - Anual: \$ 5 125 000,00
 - Costo mensual (Fee): \$ 427 083,33
 - Periodo (4 años): \$ 20 500 000,00
 - Plazo de entrega: 3 meses
- El presupuesto estimado en el Proyecto Hacienda Digital es de: \$7.000.000.00; por lo que el monto del estudio de mercado es **superior al estimado**.

La conclusión del estudio mercado es que supera el presupuesto estimado en el Proyecto, por lo que se necesita revisar el alcance del proyecto y detallar los términos de referencia para la no objeción del Banco.

Queda pendiente de la revisión de oferta del estudio para realizar el cartel correspondiente y trabajar con la Dirección General de Aduanas con un cronograma para la aplicación.

CAPITULO V. INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO. -----

ARTICULO 5. Se informe el avance de las diversas áreas del proyecto los cuales son publicados en los boletines mensuales



- SINIGER



Se informa que el proyecto va avanzando según lo programado, con atrasos sufridos por la tardanza de la No objeción de los procesos de Licitación por parte del Banco Mundial

Consejo Directivo “Modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del
Ministerio de Hacienda”
Libro de actas

CAPITULO VI. TEMAS VARIOS (REUNIÓN COMISIÓN DE TRANSPARENCIA). –

ARTICULO 6. Se analizo la necesidad de realizar la reunión la Comisión de Transparencia del Proyecto Hacienda Digital

ACUERDO 3. Se coordinará la agenda con la señora Viceministra para la última semana de abril y convocar a reunión de transparencia. **ACUERDO EN FIRME.**-----

Al ser las nueve horas con treinta y siete minutos se levanta la sesión. -----

Elian Villegas Valverde
Presidente, CDPHD

Alicia Avendaño Rivera
Secretaria, CDPHD
