


















20150831 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	
0		20150831 Declaraciones web	552,63 días	28.970 horas	lun 22/07/13	mié 21/10/15			95%	28/04
1		P1: Cargar catálogos y realizar su mantenimiento	161,63 días	1.041 horas	lun 22/07/13	mié 12/03/14			100%	
38		Prod 2: Formulario dinámico e Impuesto de Renta	175 días	3.624 horas	mié 28/08/13	mié 14/05/14			100%	
68		P21: Rutina Cálculo de Intereses	49,5 días	436 horas	lun 17/03/14	mar 03/06/14			100%	
97		P3: Consulta a Datos del Contribuyente y acceso intranet	167 días	1.864 horas	mar 03/06/14	mié 11/02/15			100%	
151		P4: Acceso de usuarios Contribuyentes y buzón	192,5 días	3.176 horas	jue 15/05/14	vie 27/02/15			100%	
210		P19: Ajustes Conectividad para que funcione con nueva plataforma, sólo ajustes para conectar con nueva BD y quitar TD@	231,5 días	1.696 horas	lun 24/03/14	mié 11/03/15			100%	
241		P5: Paquete de Impuesto General sobre las ventas y retenciones	162 días	1.372,1 horas	jue 15/05/14	jue 15/01/15			100%	
302		P6: Rutinas y consulta contribuyente	67,5 días	952 horas	lun 26/01/15	jue 07/05/15			99%	
346		P7: Descargar y subir archivo xml	202,8 días	1.763,2 horas	jue 15/05/14	vie 13/03/15			100%	
375		P8: Formularios, simplificada modelo 105 Simplificada Renta y ventas	222,3 días	2.152 horas	jue 15/05/14	vie 17/04/15			100%	
427		P9: Conciliación bancaria	112 días	1.048 horas	mié 26/11/14	vie 22/05/15			99%	

20150831 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
470		P10: Formularios solidario	172 días	1.856 horas	lun 03/11/14	mié 22/07/15			96%	
526		P11: Planillas	126 días	960 horas	mié 12/11/14	jue 28/05/15			98%	
564		P13: Procesos	120 días	1.120 horas	lun 17/11/14	lun 25/05/15			99%	
604		P14: Migración de datos (desarrollo y pruebas)	117 días	1.512,8 horas	mar 16/12/14	jue 18/06/15			99%	
626		P14.0 Instalación ambiente de calidad	32,94 días	347,9 horas	vie 23/01/15	mar 10/03/15			100%	
678		P14.1 Pruebas integrales	50 días	912 horas	mar 19/05/15	lun 27/07/15			74%	
679		Pruebas de integración I ciclo	24 días	464 horas	mar 19/05/15	vie 19/06/15			75%	
680		14.1 Elaboración de plan de pruebas	4 días	32 horas	mar 19/05/15	vie 22/05/15	551	Katia Vargas	100%	
681		14.1 Preparación de los datos	4 días	32 horas	lun 25/05/15	jue 28/05/15	680	Katia Vargas[25%];C Hernandez[25%] F.	100%	
682		14.1 Pruebas	3 sem.	360 horas	lun 25/05/15	vie 12/06/15	625;458;551	Katia Vargas;Isabel Delgado;Jose Antonio Madriz	65%	
683		14.1 Acompañamiento y ajustes	1 sem	40 horas	lun 15/06/15	vie 19/06/15	681;682	S-COM4 PO	65%	
684		14.1 Finalizacion I ciclo de pruebas	0 días	0 horas	vie 19/06/15	vie 19/06/15	683	Katia Vargas	0%	
685		Pruebas de integración II ciclo	26 días	448 horas	lun 22/06/15	lun 27/07/15			72%	
686		14.1 Elaboración de plan de pruebas II	3 días	24 horas	lun 22/06/15	mié 24/06/15	684	Katia Vargas	98%	

20150831 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
687		14.1 Preparación de los datos II	3 días	24 horas	jue 25/06/15	lun 29/06/15	686	Katia Vargas[25%];C Hernandez[25%] F.	95%	
688		14.1 Pruebas II	3 sem.	360 horas	mar 30/06/15	lun 20/07/15	687	Katia Vargas;Isabel Delgado;Jose Antonio Madriz	65%	
689		14.1 Acompañamiento y ajustes II	1 sem	40 horas	mar 21/07/15	lun 27/07/15	688	S-COM4 PO	65%	
690		14.1 Finalizacion II ciclo de pruebas	0 días	0 horas	lun 27/07/15	lun 27/07/15	689	Katia Vargas	0%	
691		P14.1.1 Manual de usuario aplicación Web y adm	5 días	80 horas	mar 28/07/15	lun 03/08/15			85%	
692		Manual de usuario sitio web del contribuyente	1 sem	40 horas	mar 28/07/15	lun 03/08/15	690	Jenny Zeledon[50%]; Vargas[50%]	100%	
693		Manual de usuario sitio administrativo, opciones para el usuario experto	1 sem	40 horas	mar 28/07/15	lun 03/08/15	690	Katia Vargas[50%];J Zeledon[50%]	70%	
694		P14.2 Pruebas de Estrés	96 días	448 horas	mar 17/03/15	mié 05/08/15			92%	
695		14.2 Comprobar herramientas automatizadas	10 días	80 horas	mar 17/03/15	lun 06/04/15	680CC	Luis F. Coronado[50%] Rapso[50%]	100%	
696		14.2 Determinar escenarios	5 días	40 horas	mar 07/04/15	lun 13/04/15	695	Luis F. Coronado[50%] Rapso[50%]	100%	
697		14.2 Crear archivos de datos según escenarios	4 días	32 horas	mar 14/04/15	vie 17/04/15	696	Luis F. Coronado[50%] Rapso[50%]	100%	













20150831 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
698	 	14.2 Crear scripts de pruebas	5 días	40 horas	lun 20/04/15	vie 24/04/15	697	Luis F. Coronado[50%] Rapso[50%]	100%	
699		14.2 Prueba de estrés ciclo I	12 días	104 horas	lun 15/06/15	mar 30/06/15			100%	
700		14.2 Obtener estado de BD I	1 día	8 horas	lun 15/06/15	lun 15/06/15	683CC	Carlos Hernandez	100%	
701		14.2 Ejecutar prueba ciclo I	1 día	8 horas	mar 16/06/15	mar 16/06/15	700	Luis F. Coronado[50%] Rapso[50%]	100%	
702		14.2 Monitoreo de red I	1 día	8 horas	mar 16/06/15	mar 16/06/15	701CC	Marie C. Herrera	100%	
703		14.2 Monitoreo de base de datos I	1 día	8 horas	mar 16/06/15	mar 16/06/15	701CC	Carlos Hernandez	100%	
704		14.2 Monitoreo de servidores I	1 día	8 horas	mar 16/06/15	mar 16/06/15	701CC	Johnny Herrera	100%	
705		14.2 Revision de resultados I	1 sem	32 horas	mié 17/06/15	mar 23/06/15	701	Carlos Hernandez[20%] Herrera[20%]; F. Coronado[20%]	100%	
706		14.2 Correcciones I	1 sem	32 horas	mié 24/06/15	mar 30/06/15	705	Carlos Hernandez[20%] Herrera[20%]; F. Coronado[20%]	100%	
707		14.2 Actualizar script de pruebas	3 días	24 horas	mié 01/07/15	vie 03/07/15	706	Carlos Hernandez[50%] Rapso[50%]	100%	
708		14.2 Actualizar archivos de datos	3 días	24 horas	lun 06/07/15	mié 08/07/15	707	Carlos Hernandez[50%] Rapso[50%]	100%	










20150831 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
709		14.2 Pruebas de estrés ciclo II	12 días	104 horas	mar 21/07/15	mié 05/08/15			67%	
710		14.2 Obtener estado de BD II	1 día	8 horas	mar 21/07/15	mar 21/07/15	689CC	Carlos Hernandez	100%	
711		14.2 Ejecutar prueba ciclo II	1 día	8 horas	mié 22/07/15	mié 22/07/15	710	Luis F. Coronado[50%] Rapso[50%]	100%	
712		14.2 Monitoreo de red II	1 día	8 horas	mié 22/07/15	mié 22/07/15	711CC	Marie C. Herrera	100%	
713		14.2 Monitoreo de base de datos II	1 día	8 horas	mié 22/07/15	mié 22/07/15	711CC	Carlos Hernandez	100%	
714		14.2 Monitoreo de servidores II	1 día	8 horas	mié 22/07/15	mié 22/07/15	711CC	Johnny Herrera	100%	
715		14.2 Revision de resultados II	1 sem	32 horas	jue 23/07/15	mié 29/07/15	711	Carlos Hernandez[20%] Herrera[20%]; F. Coronado[20%]	100%	
716		14.2 Correcciones II	1 sem	32 horas	jue 30/07/15	mié 05/08/15	715	Carlos Hernandez[20%] Herrera[20%]; F. Coronado[20%]	0%	
717		<i>14.2 Pruebas de estrés aprobadas</i>	<i>0 días</i>	<i>0 horas</i>	<i>mié 05/08/15</i>	<i>mié 05/08/15</i>	<i>716</i>		<i>0%</i>	
718		P18: Documentación de sistemas de información	11 días	72 horas	mar 28/07/15	mar 11/08/15			50%	
724		P15: Instalación ambiente de producción y aplicaciones	44,94 días	1.113 horas	lun 06/07/15	vie 04/09/15			70%	
725		Configuración de servidores físicos (Formateo e instalación de equipos para BD)	4 días	32 horas	lun 06/07/15	jue 09/07/15		Johnny Herrera	100%	








20150831 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
726		Creación y configuración de ambiente de virtualización	16 días	272 horas	lun 06/07/15	lun 27/07/15			100%	
727		Asignar almacenamiento para virtuales y para BD	5 días	80 horas	lun 06/07/15	vie 10/07/15	725CC	Fabiola León;Diego Gómez	100%	
728		Asignar perfiles de red a servidores	2 días	32 horas	lun 13/07/15	mar 14/07/15	727	Jorge Umañan;Wenc Rodriguez	100%	
729		Agregar nombres de hosts al AD y DNS's	2 días	16 horas	mié 15/07/15	jue 16/07/15	728	Pablo Vargas	100%	
730		Crear los closters de VmWare	2 días	32 horas	mié 15/07/15	jue 16/07/15	728	Jorge Umañan;Wenc Rodriguez	100%	
731		Definición de alias y zonas	2 días	32 horas	vie 17/07/15	lun 20/07/15	730	Fabiola León;Diego Gómez	100%	
732		Creación de plantillas para las capas web y aplicativos	2 días	32 horas	mar 21/07/15	mié 22/07/15	731	Jorge Umañan;Wenc Rodriguez	100%	
733		Creación de OU's	2 días	16 horas	jue 23/07/15	vie 24/07/15	732	Pablo Vargas	100%	
734		Asignación de Ips	2 días	0 horas	jue 23/07/15	vie 24/07/15	732		100%	
735		Crear servidores web y aplicativos	2 días	16 horas	jue 23/07/15	vie 24/07/15	732	Diego Gómez	100%	
736		Incluir equipos al dominio	1 día	8 horas	lun 27/07/15	lun 27/07/15	735	Pablo Vargas	100%	
737		Agregar permisos, apertura de puertos	1 día	8 horas	lun 27/07/15	lun 27/07/15	735	Johnny Herrera	100%	
738		Instalación de base de datos	34,94 días	637 horas	mar 14/07/15	lun 31/08/15			59%	
739		Requerimientos para preparación de nueva instalación: instancia y base de datos SQL Server	10,63 días	182 horas	mar 14/07/15	mar 28/07/15			71%	


20150831 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
740	 	Validar información sobre los servicios de bases de datos que requiere el negocio que se instalen y algún otro componente en particular 0.5 days	4 horas	8 horas	jue 16/07/15	jue 16/07/15	737FC-8 días	Carlos Hernandez;Me Rapso	100%	
741		Definir según los requerimientos de negocio, las necesidades de equipo 0.5 days	4 horas	8 horas	jue 16/07/15	jue 16/07/15	740CC	Carlos Hernandez;Me Rapso	100%	
742	 	Definir según los requerimientos de servicios a instalar, las cuentas, usuarios y políticas requeridas para c/u	3 horas	6 horas	jue 16/07/15	jue 16/07/15	741	Carlos Hernandez;Me Rapso	100%	
743		Validar información sobre la configuración de la instancia a ser instalada: seguridad, modo recuperación, collection, procesos de carga, migración de datos	4 horas	8 horas	jue 16/07/15	vie 17/07/15	742	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	75%	
744		Validar alcance de las pruebas a realizar en ambiente de producción	4 horas	8 horas	jue 16/07/15	vie 17/07/15	742	Carlos Hernandez;Me Rapso	50%	
745		Revisar instancia y base de datos actual (calidad, homologación) para inventariar su condición, características, objetos, componentes de jobs, paquetes, migraciones datos, pr... 1 day	1 día	24 horas	vie 17/07/15	lun 20/07/15	744	Carlos Hernandez;Flo Espinoza;Merc Rapso	75%	
746	 	Definir distribución de recursos de nuevos equipos de base de datos	4 horas	8 horas	mar 14/07/15	mar 14/07/15	737FC-10 días	Carlos Hernandez;Jof Herrera	100%	
747		Definir configuración de la nueva instancia según la información validada	1 hora	2 horas	lun 20/07/15	lun 20/07/15	745	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	100%	

20150831 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	
748	 	Definir: nombres de instancias, bases de datos, cluster SQL Serve. Dirección IP, puerto SQL, 0.5 days	3 horas	6 horas	lun 20/07/15	lun 20/07/15	747	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	100%	28/04
749		Generar documentación con el detalle de los recursos requeridos para el equipo: servidores, almacenamiento, memoria, procesadores, servicios, usuarios, políticas, etc 2 days	2 días	32 horas	lun 20/07/15	mié 22/07/15	748	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	100%	
750		Generar documentación con el detalle de la configuración de la instancia y la base de datos: seguridad, modo recuperación, collection, filegroups, datafiles, distribución de almacenamiento, etc 2 days	6 horas	12 horas	mié 22/07/15	jue 23/07/15	749	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	35%	
751		Generar la documentación de la instancia y base de datos actual (calidad, homologación) para inventar su condición, características, objetos, componentes de jobs 2 days	6 horas	12 horas	mié 22/07/15	jue 23/07/15	750CC	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	50%	
752		Generar detalle de la instancia y base de datos actual para definir lo necesario para la nueva instancia 2 days	0 horas	0 horas	jue 23/07/15	jue 23/07/15	751	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	50%	
753	 	Enviar solicitudes a diferentes unidades para instalar agentes de: antivirus, respaldos, scom, entre otros 1 day	1 día	16 horas	jue 23/07/15	vie 24/07/15	752	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	35%	











20150831 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
754		Generar documento final con toda la información recopilada, validada y definida 3 days	1 día	16 horas	vie 24/07/15	lun 27/07/15	753	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	50%	
755		Desarrollar plan de implementación de instancia, bases de datos según información del documento generado 2 days	1 día	16 horas	lun 27/07/15	mar 28/07/15	754	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	50%	
756		Requerimientos para preparación de servidores	2 días	24 horas	mar 28/07/15	jue 30/07/15			50%	
757		Definir y enviar requerimientos de almacenamiento a la UAS	1 día	8 horas	mar 28/07/15	mié 29/07/15	755	Carlos Hernandez	100%	
758		Definir y enviar requerimiento de respaldos a la Unidad correspondiente (UAS, UGOT) 1 day	0 días	0 horas	mar 28/07/15	mar 28/07/15	757CC	Carlos Hernandez	0%	
759		Definir y enviar requerimiento de almacenamiento SWAP a la UAS 1 day	0 días	0 horas	mar 28/07/15	mar 28/07/15	757CC	Carlos Hernandez	0%	
760		Definir y enviar requerimiento de cuentas de servicio de SQL Server, respaldos y políticas requeridas a la UAS 1 day	0 días	0 horas	mar 28/07/15	mar 28/07/15	757CC	Carlos Hernandez	50%	
761		Definir y enviar requerimiento de instalación y configuración de agentes para el antivirus, scom y respaldos 1 day	0 días	0 horas	mar 28/07/15	mar 28/07/15	757CC	Carlos Hernandez	50%	
762	 	Definir y enviar requerimiento de firewall a la UAS y la UGRC 1 day	1 día	16 horas	mié 29/07/15	jue 30/07/15	757	Carlos Hernandez;Jof Herrera	0%	
763		Instalar y configurar Instancia de BD	20,31 días	385 horas	jue 30/07/15	jue 27/08/15			57%	

20150831 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
764	 	Copiar medios de instalación en cada uno de los nodos del cluster a instalar 1 day	4 horas	8 horas	jue 30/07/15	vie 31/07/15	762	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	100%	
765		Realizar Pruebas de Failover del cluster de windows 0.5 days	2 horas	4 horas	jue 30/07/15	jue 30/07/15	764CC	Carlos Hernandez;Jof Herrera	0%	
766		Mover todos los recursos al nodo A 0.1 days	30 mins	1 hora	jue 30/07/15	jue 30/07/15	765	Carlos Hernandez;Jof Herrera	0%	
767		Instalar el nodo A del cluster para la Instancia 1, tomando en consideración el plan y definiciones para la instancia 1 day	1 día	16 horas	jue 30/07/15	vie 31/07/15	766	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	100%	
768		Repetir los 2 puntos anteriores tantas veces como nodos tenga el cluster 5 days	2 días	32 horas	vie 31/07/15	mar 04/08/15	767	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	50%	
769		Instalar instancia para réplica (si aplica) 3 days	1 día	16 horas	mar 04/08/15	mié 05/08/15	768	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	100%	
770		Instalar servicios de SQL Server que no son Clusterizados si aplica 3 days	1 día	16 horas	mié 05/08/15	jue 06/08/15	769	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	100%	
771		Validar configuración de la instancia RPT y realizar los ajustes necesarios 2 days	1 día	16 horas	jue 06/08/15	vie 07/08/15	770	Carlos Hernandez;Jof Herrera	100%	
772		Probar la funcionalidad de los servicios: failover, detención, reinicio, cuentas correctas, etc	2 horas	4 horas	vie 07/08/15	lun 10/08/15	771	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	20%	
773		Ajustar el firewall (UAS)	1 día	16 horas	lun 10/08/15	mar 11/08/15	772	Carlos Hernandez;Jof Herrera	0%	








20150831 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
774	 	Probar y ajustar firewall hasta que funcione correctamente	4 horas	8 horas	mar 11/08/15	mar 11/08/15	773	Carlos Hernandez;Jof Herrera	0%	
775	 	Instalar o restaurar las bases de datos en cada instancia	4 horas	8 horas	lun 10/08/15	lun 10/08/15	772	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	0%	
776		Generar y guardar los scripts	4 horas	8 horas	lun 10/08/15	mar 11/08/15	775	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	0%	
777		Validar y ajustar las propiedades de las bases de datos	2 horas	4 horas	mar 11/08/15	mar 11/08/15	776	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	50%	
778		Realizar ajustes de primary, filegroups, datafiles, tempdb según plan de implementación	1 día	16 horas	mar 11/08/15	mié 12/08/15	777	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	0%	
779		Ejecutar proceso de migración de datos de TD@ desde 2011 a la fecha	3 días	48 horas	mié 12/08/15	lun 17/08/15	778	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	0%	
780		Crear los roles de usuario en las bases de datos	4 horas	8 horas	lun 17/08/15	lun 17/08/15	779	Carlos Hernandez;Me Rapso	70%	
781		Crear los usuarios que deben conectarse a cada base de datos	4 horas	8 horas	lun 17/08/15	lun 17/08/15	780CC	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	50%	
782		Validar y ajustar usuarios de conexión entre aplicaciones y base de datos	1 día	16 horas	lun 17/08/15	mar 18/08/15	781	Carlos Hernandez;Me Rapso	75%	
783		Validar usuarios, accesos, roles, y depurarlos	1 día	16 horas	mar 18/08/15	mié 19/08/15	782	Carlos Hernandez;Me Rapso	35%	
784		Cambio de contraseña	4 horas	8 horas	mar 18/08/15	mié 19/08/15	783CC	Diego Gómez;Flory Espinoza	100%	

20150831 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
785	 	Verificar antivirus, respaldos y scom, que esten activos y funcionando correctamente	4 horas	8 horas	mié 19/08/15	mié 19/08/15	784	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	25%	
786		Realizar pruebas de respaldo, restauraciones, incluyendo planes de mantenimiento	4 horas	4 horas	mié 19/08/15	mié 19/08/15	785CC	Carlos Hernandez	75%	
787		Validar conectividad de usuario con aplicación: Reporting, cargas, aplicación	2 días	32 horas	mié 19/08/15	vie 21/08/15	786	Carlos Hernandez;Me Rapso	75%	
788		Configurar Always ON, según plan de mantenimiento	4 días	64 horas	vie 21/08/15	jue 27/08/15	787	Carlos Hernandez;Jof Herrera	100%	
789		Mejoras en los datos	2 días	46 horas	jue 27/08/15	lun 31/08/15			40%	
790		Defragmentar índices	2 horas	4 horas	jue 27/08/15	vie 28/08/15	788	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	0%	
791		Generar scripts	2 horas	4 horas	jue 27/08/15	vie 28/08/15	790CC	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	0%	
792		Migrar y ajustar jobs	1 hora	2 horas	jue 27/08/15	vie 28/08/15	791CC	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	25%	
793		Migrar y ajustar paquetes	1 hora	2 horas	jue 27/08/15	vie 28/08/15	792CC	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	50%	
794		Validar y ajustar proced.	1 hora	2 horas	jue 27/08/15	vie 28/08/15	793CC	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	35%	
795		Depurar bases de datos	0 horas	0 horas	jue 27/08/15	jue 27/08/15	794CC	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	0%	



20150831 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
796	 	Ajustar filfactor y otras características	1 día	16 horas	jue 27/08/15	vie 28/08/15	795CC	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	0%	
797		Configurar réplica si aplica	1 día	16 horas	vie 28/08/15	lun 31/08/15	796	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	100%	
798		Instalación de aplicaciones y prueba	12,5 días	172 horas	nié 19/08/15	vie 04/09/15			37%	
799		Instalar aplicaciones	1 día	16 horas	mié 19/08/15	jue 20/08/15	784	Johnny Herrera;Mercede Rapso	100%	
800		Realizar conexiones de las interfaces	4 horas	8 horas	jue 20/08/15	jue 20/08/15	799	Johnny Herrera;Mercede Rapso	100%	
801		Realizar pruebas de componentes	1 día	16 horas	jue 20/08/15	vie 21/08/15	800	Johnny Herrera;Mercede Rapso	100%	
802		Realizar pruebas de funcionalidad	2 días	32 horas	vie 21/08/15	mar 25/08/15	801	Johnny Herrera;Mercede Rapso	80%	
803		Realizar pruebas de replicacion	3 días	24 horas	mar 25/08/15	vie 28/08/15	802	Carlos Hernandez	0%	
804		Probar jobs y paquetes	4 horas	8 horas	vie 28/08/15	lun 31/08/15	803	Johnny Herrera;Mercede Rapso	50%	
805		Validar resultados de todas las pruebas	4 horas	12 horas	lun 31/08/15	lun 31/08/15	804	Carlos Hernandez;Jof Herrera;Mercede Rapso	50%	
806		Repetir pruebas no exitosas	2 días	32 horas	lun 31/08/15	mié 02/09/15	805	Carlos Hernandez;Jof Herrera	0%	












20150831 Declaraciones web

Id	Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
807	Documentar los ajustes realizados	1 día	16 horas	mié 02/09/15	jue 03/09/15	806	Carlos Hernandez;Jof Herrera	0%	
808	Desabilitar servicio de réplica si aplica y documentar	1 día	8 horas	jue 03/09/15	vie 04/09/15	807	Carlos Hernandez	0%	
809	P16: Migración de datos Producción	7 días	120 horas	e 04/09/15	ie 16/09/15			14%	
810	Elaboración de plan de migración	1 día	8 horas	vie 04/09/15	lun 07/09/15	808	S-COM1 AM	100%	
811	Migración de datos	2 días	48 horas	lun 07/09/15	mié 09/09/15	810	Carlos Hernandez;Lui F. Coronado;Mer	0%	
812	Revisión de la carga de datos	2 días	48 horas	mié 09/09/15	vie 11/09/15	811	Katia Vargas;Carlos Hernandez;Me	0%	
813	Revisión de respaldos generados	2 días	16 horas	vie 11/09/15	mié 16/09/15	812	Carlos Hernandez	0%	
814	Aprobación de la migración Produccion	0 días	0 horas	vie 11/09/15	vie 11/09/15	812	Katia Vargas	0%	
815	P17: Puesta en Producción	2,25 días	28 horas	e 11/09/15	ie 17/09/15			0%	
816	Actualizar aplicaciones	1 día	16 horas	vie 11/09/15	lun 14/09/15	814	Johnny Herrer	0%	
817	Pruebas de acceso a la aplicación	4 horas	4 horas	lun 14/09/15	mié 16/09/15	816	Katia Vargas	0%	
818	Pruebas de conexión a BD	4 horas	4 horas	mié 16/09/15	mié 16/09/15	817	Katia Vargas	0%	
819	Aprobación de la puesta en producción	0 días	0 horas	mié 16/09/15	mié 16/09/15	818	Katia Vargas;N	0%	
820	Habilitar acceso a Producción al público	2 horas	4 horas	mié 16/09/15	jue 17/09/15	819	Johnny Herrera;Merce	0%	
821	P20. Capacitación, divulgación y comunicación para la puesta en producción	79 días	40 horas	mié 01/07/15	mié 21/10/15			45%	
822	Fase 1. Complemento proceso integral de pruebas	38 días	40 horas	mié 01/07/15	vie 21/08/15			100%	
823	Prueba focalizada con contadores	11 días	40 horas	mié 01/07/15	mié 15/07/15			100%	

20150831 Declaraciones web


Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
824		Elaborar instrucción para la conformación de grupos de capacitación en cada AATT	5 días	0 horas	lun 17/08/15	vie 21/08/15			100%	
825		Capacitación en el uso de ATV a funcionarios de DSC y CIT	5 días	0 horas	lun 27/07/15	vie 31/07/15			100%	
826		Capacitación en el uso de ATV a funcionarios de la subgerencias de Servicio al Contribuyente en las AATT	10 días	0 horas	lun 03/08/15	vie 14/08/15	825		100%	
827		Elaborar instructivo con estructura del ATV como base para tutoriales	22 días	0 horas	lun 17/08/15	mié 16/09/15	826		0%	
828		Elaboración de guías paso a paso	26 días	0 horas	vie 31/07/15	mié 14/10/15	827		30%	
829		Fase 2. Divulgación, distribución de volantes y afiches	56 días	0 horas		lun mié 21/10/15			42%	
830		Identificar los grupos destinatarios de mensajes	5 días	0 horas		lun 03/08/15	vie 07/08/15	828CC	100%	
831		Maestro de contribuyentes (masividad)	5 días	0 horas	lun 03/08/15	vie 07/08/15			100%	
832		Identificar representantes legales	5 días	0 horas	lun 03/08/15	vie 07/08/15	831CC		100%	
833		Identificar contadores o autorizados	5 días	0 horas	lun 03/08/15	vie 07/08/15	832CC		100%	
834		Comunicación por medio de mensajería de texto celular	5 días	0 horas	lun 10/08/15	vie 14/08/15	833		30%	
835		Comunicación por medio de correo electrónico	8 días	0 horas		mar 01/09/15	jue 10/09/15		30%	
836		Anuncio en sitio Web	12 días	0 horas	lun 03/08/15	mar 18/08/15			100%	
837		Distribución de volantes para la campaña	27 días	0 horas		vie mié 21/10/15			0%	
838		Impresión de los volantes	6 días	0 horas	vie 11/09/15	lun 21/09/15	835		0%	
839		Distribución de los volantes a sucursales	21 días	0 horas		mar 22/09/15	mié 21/10/15	838	0%	
840		Auncio en redes sociales	10 días	0 horas	lun 03/08/15	vie 14/08/15			100%	
841		Pautas publicitarias	10 días	0 horas	vie 11/09/15	vie 25/09/15	838CC		0%	

20150831 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	
										28/04
842		Conferencia de prensa	1 día 0 horas		lun 03/08/15	lun 03/08/15	841CC		100%	
843		Actualización preguntas tributarias	11 días 0 horas		vie 11/09/15	lun 28/09/15	838CC		0%	
844		Fase 3. Publicación de resolución sobre obligatoriedad del uso de la herramienta	1 día 0 horas		vie 11/09/15	vie 11/09/15			0%	
845		Publicación de resolución sobre obligatoriedad, e incluir contingencia para el pago en D110	1 día 0 horas		vie 11/09/15	vie 11/09/15	838CC		0%	
846		F4. Comunicación a bancos sobre los formularios que no se reciben en físico	1 día 0 horas		lun 14/09/15	lun 14/09/15			0%	
847		Comunicar la resolución sobre obligatoriedad a bancos y cuales formularios se permite recibir	1 día 0 horas		lun 14/09/15	lun 14/09/15			0%	
848		F5. Comunicación interna	12 días 0 horas		jue 30/07/15	vie 14/08/15			100%	
849		Elaboración de capsulas informaticas	2 días 0 horas		jue 30/07/15	vie 31/07/15			100%	
850		Revisión de capsulas informativas	2 días 0 horas		lun 03/08/15	mar 04/08/15	849		100%	
851		Remisión de capsulas informativas	8 días 0 horas		mié 05/08/15	vie 14/08/15	850		100%	
852		F6. Capacitación externa	21 días 0 horas		mar 01/09/15	mié 30/09/15			15%	
853		Capacitación a contadores públicos y privados, regionalmente	21 días 0 horas		mar 01/09/15	mié 30/09/15			15%	
854		Adm Seguimiento a Proyecto S-COM	359 días 924 horas		mié 12/03/14	mié 02/09/15			99%	
932		Reunión Seguimiento Contrato	359 días 312 horas		mié 13/03/14	mié 03/09/15			99%	


20150831 Declaraciones web

21 julio 07/07	15/09	11 diciembre 24/11	02/02	01 mayo 13/04	22/06	21 septiembre 31/08	09/11	11 febrero 18/01	29/03	01 julio 07/06	16/08	21 noviembre 25/10	03/01
-------------------	-------	-----------------------	-------	------------------	-------	------------------------	-------	---------------------	-------	-------------------	-------	-----------------------	-------

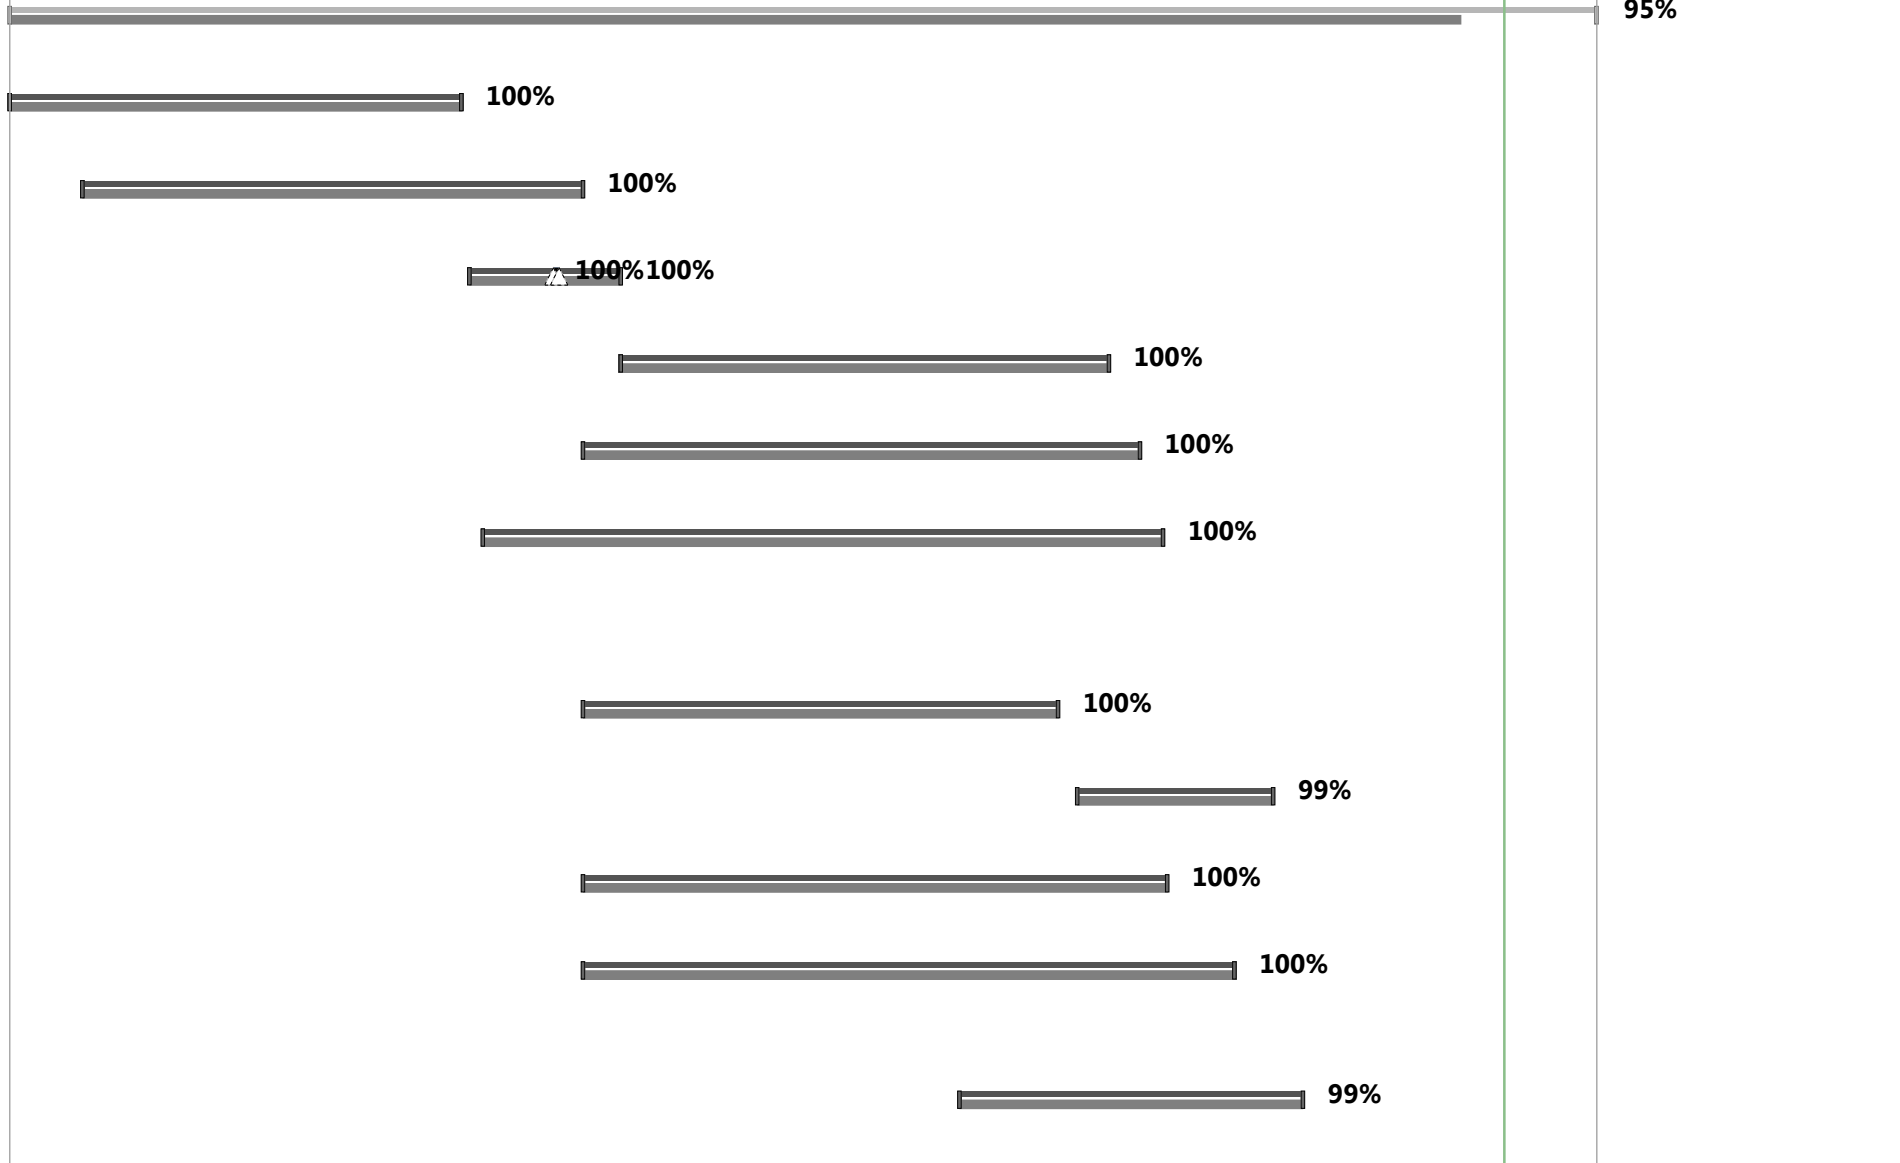


20150831 Declaraciones web

21 julio 07/07	15/09	11 diciembre 24/11	02/02	01 mayo 13/04	22/06	21 septiembre 31/08	09/11	11 febrero 18/01	29/03	01 julio 07/06	16/08	21 noviembre 25/10	03/01
-------------------	-------	-----------------------	-------	------------------	-------	------------------------	-------	---------------------	-------	-------------------	-------	-----------------------	-------

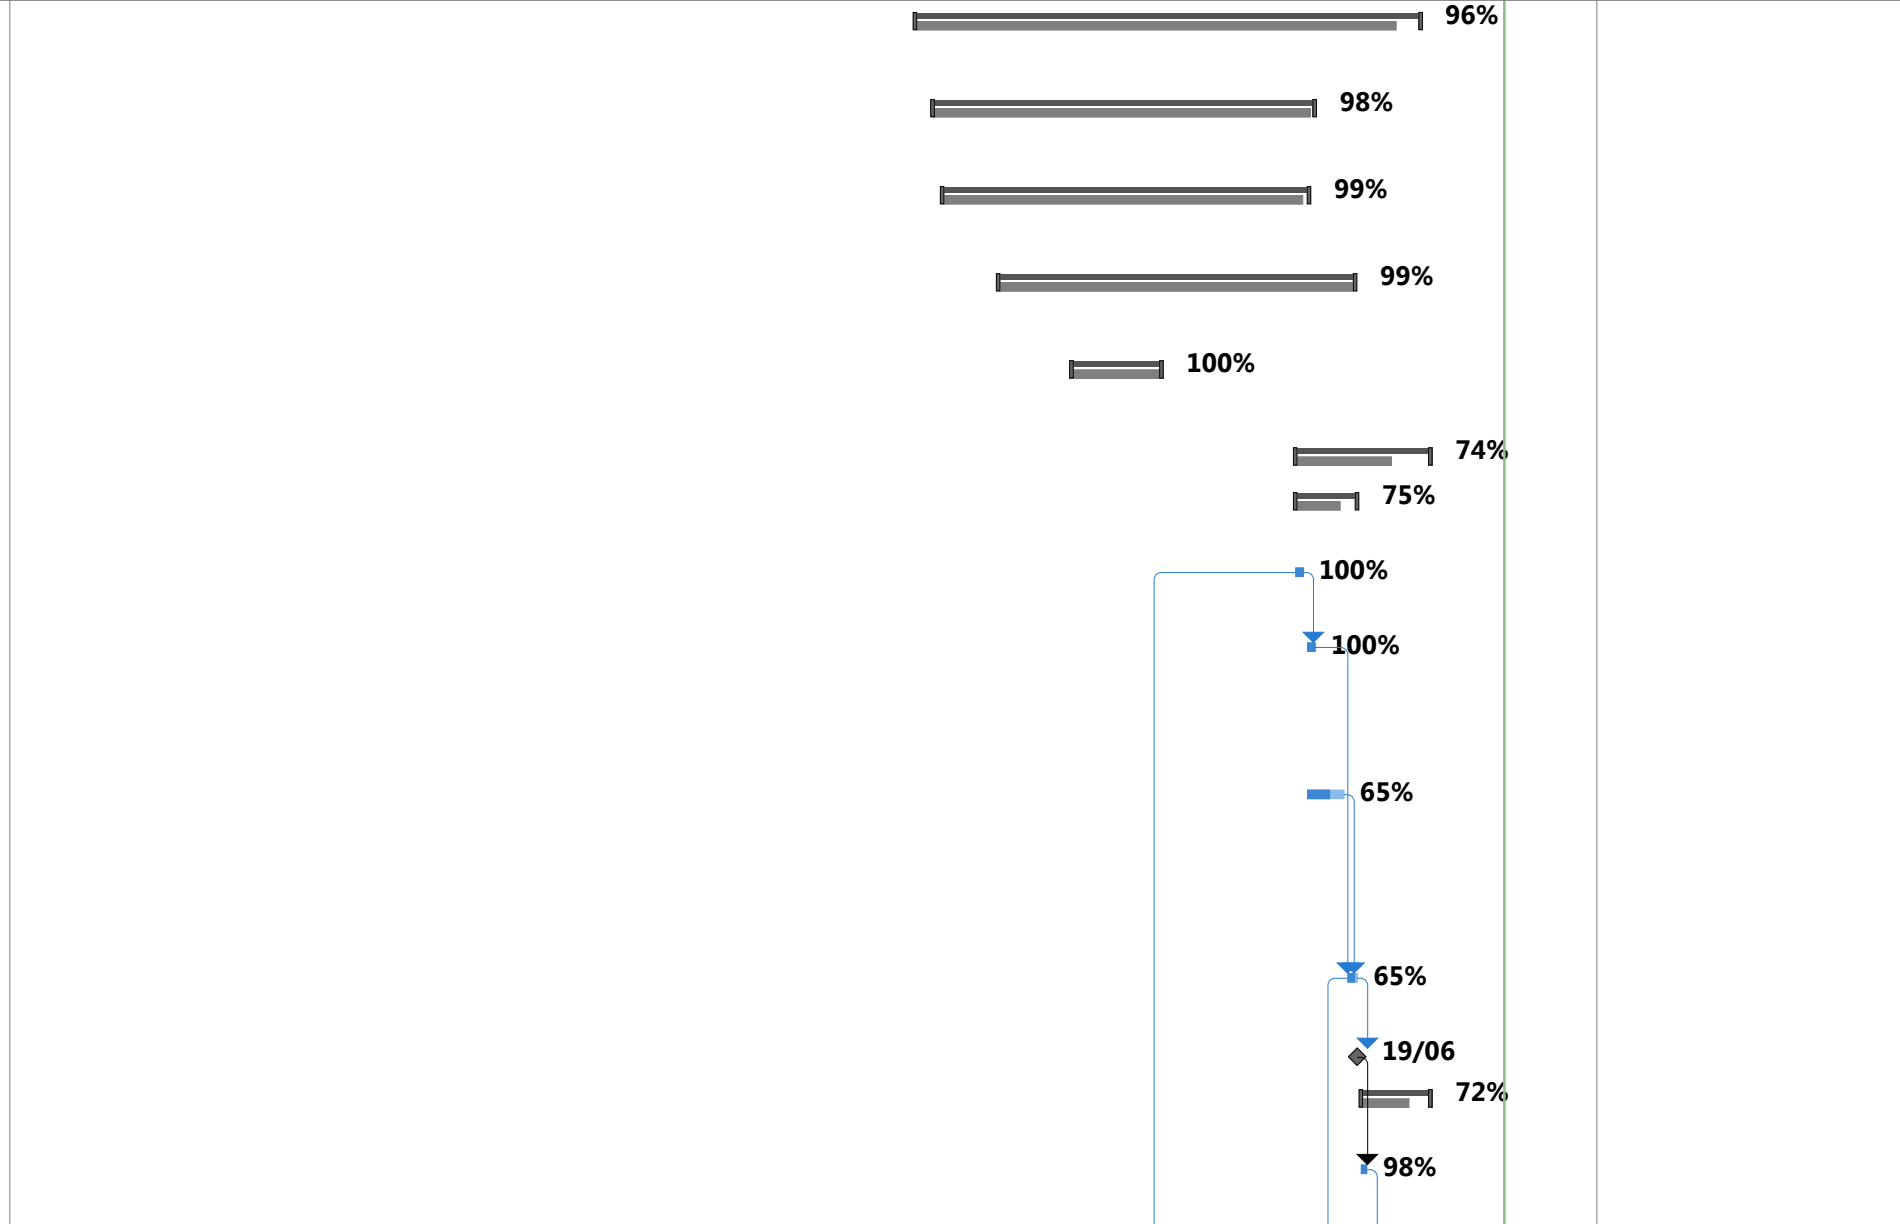


20150831 Declaraciones web

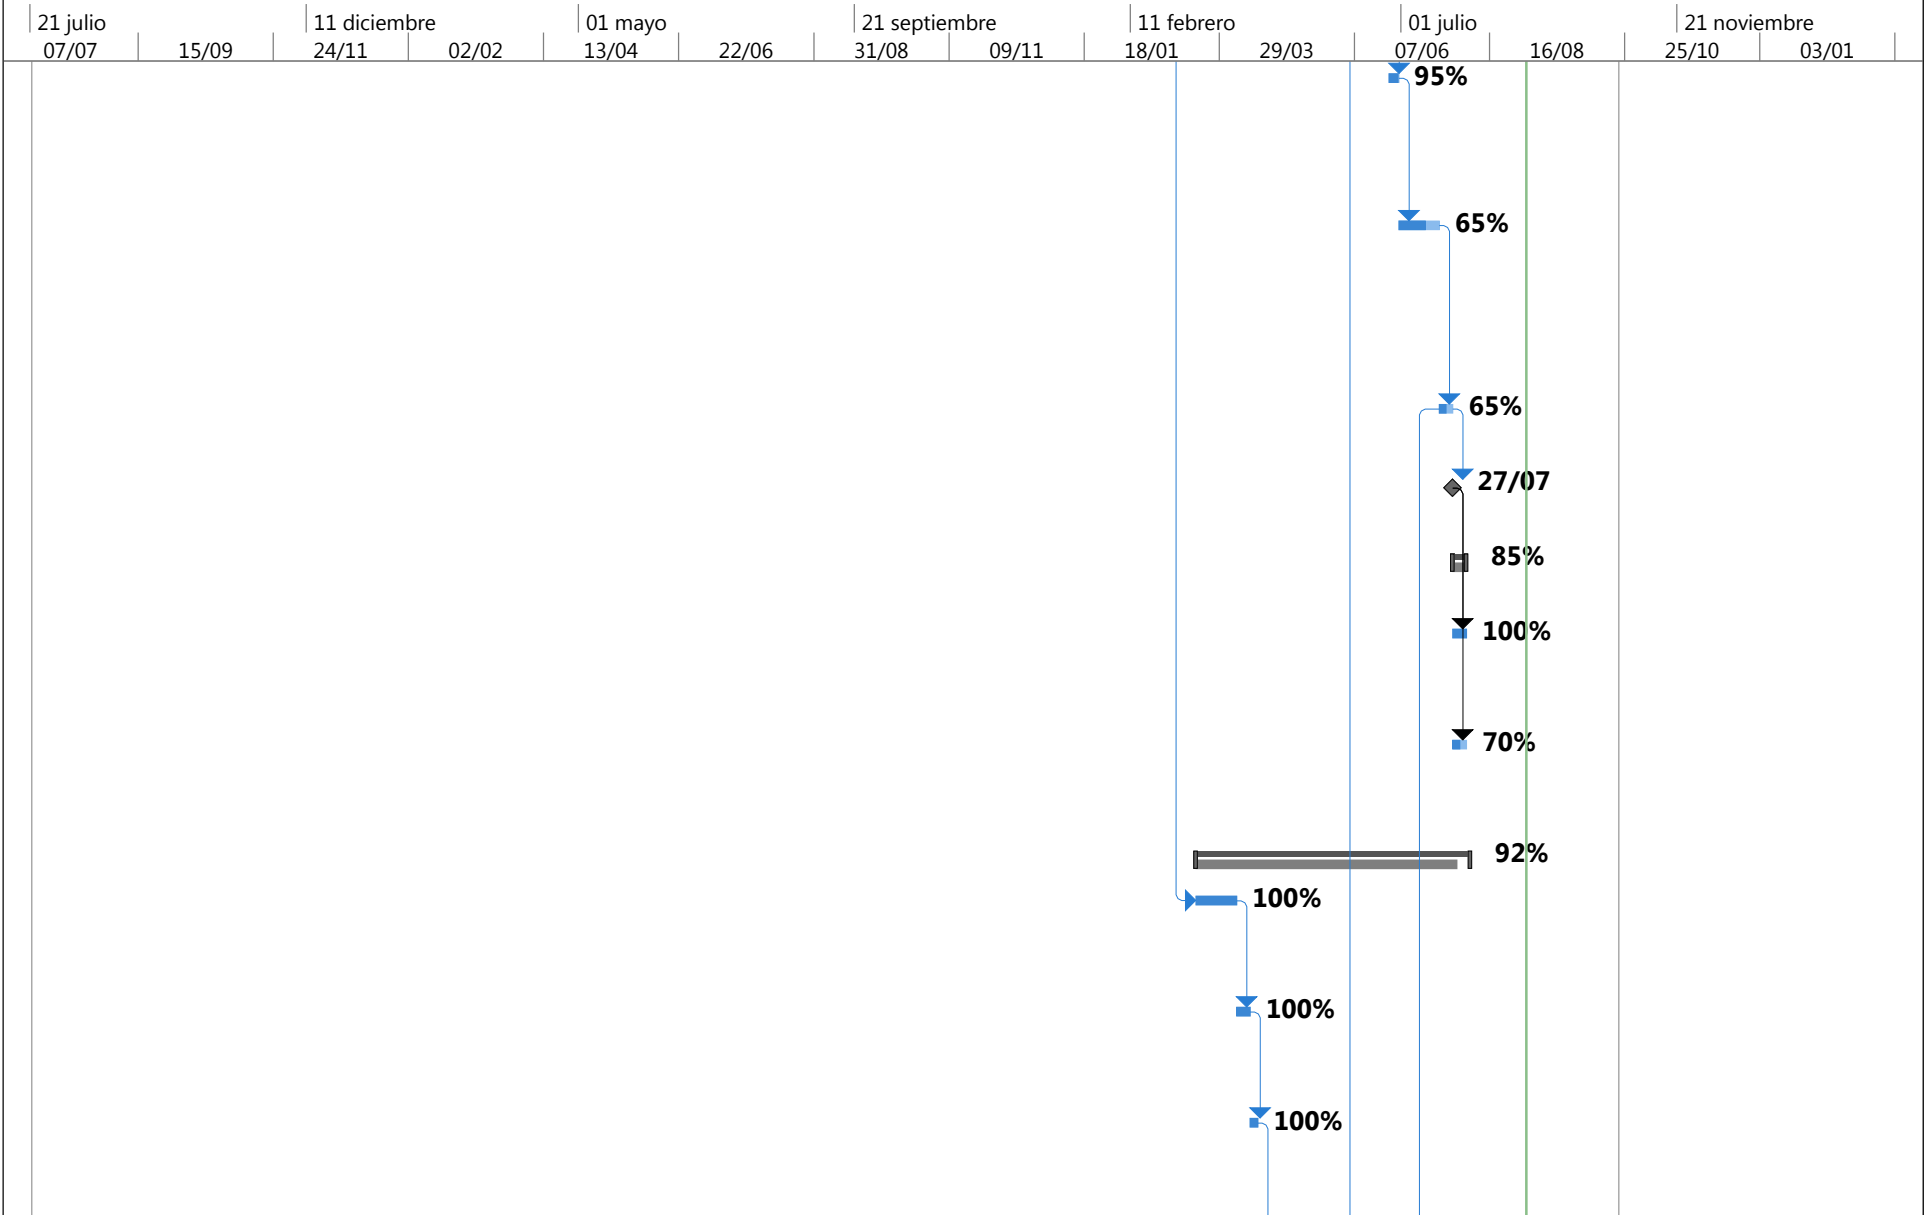


20150831 Declaraciones web

21 julio 07/07 15/09 11 diciembre 24/11 02/02 01 mayo 13/04 22/06 21 septiembre 31/08 09/11 11 febrero 18/01 29/03 01 julio 07/06 16/08 21 noviembre 25/10 03/01

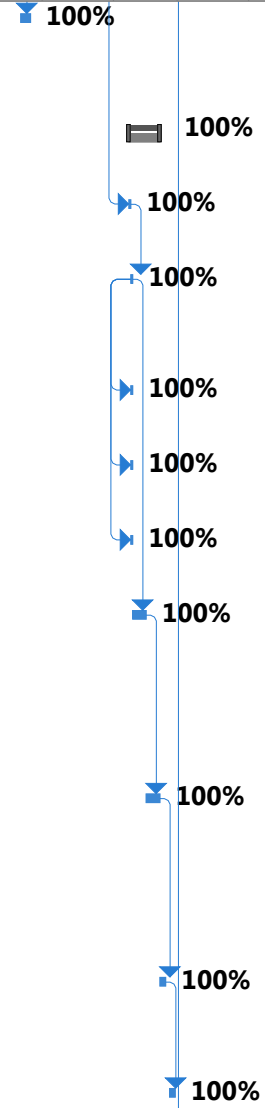


20150831 Declaraciones web

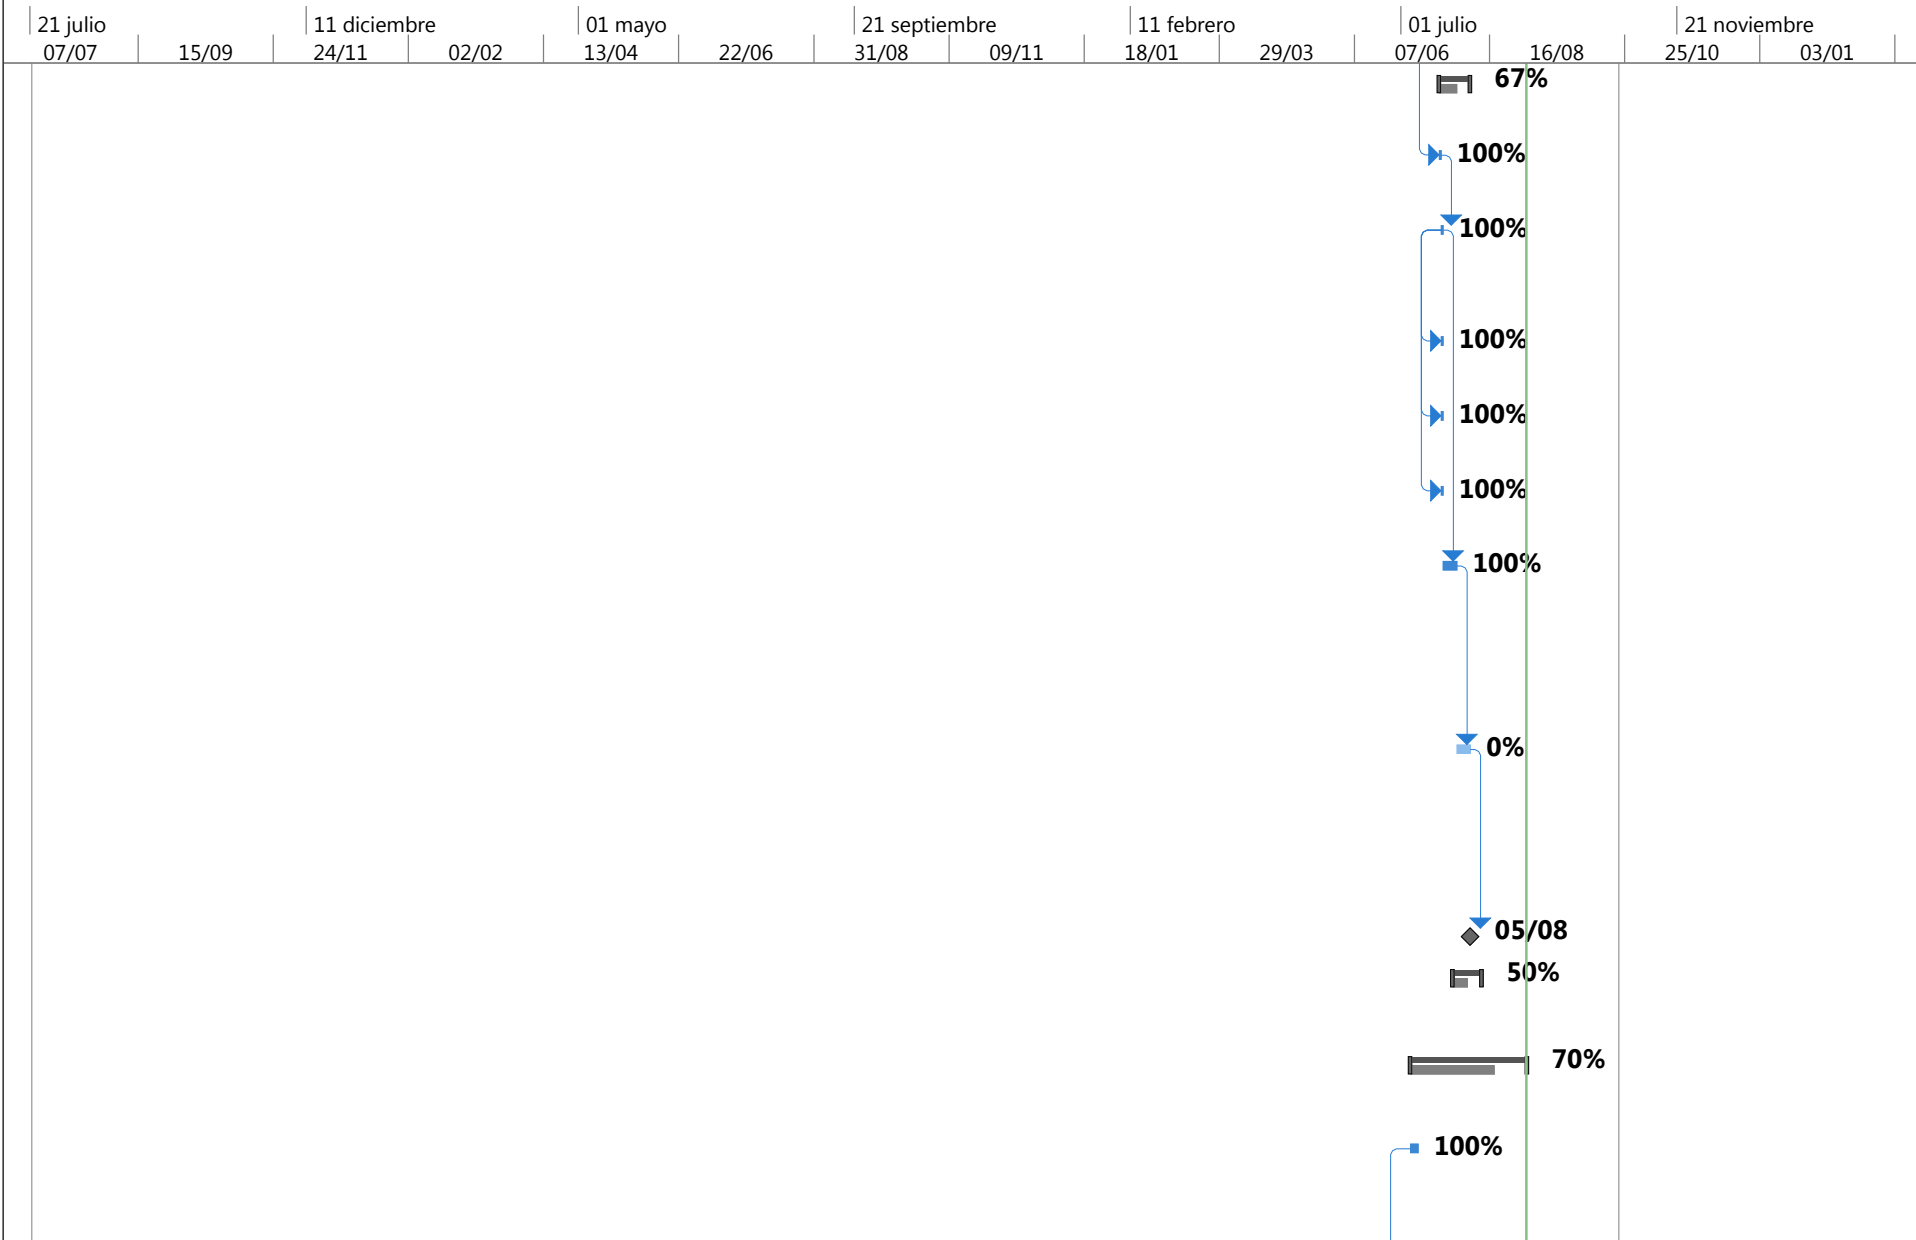


20150831 Declaraciones web

21 julio 07/07 | 15/09 | 11 diciembre 24/11 | 02/02 | 01 mayo 13/04 | 22/06 | 21 septiembre 31/08 | 09/11 | 11 febrero 18/01 | 29/03 | 01 julio 07/06 | 16/08 | 21 noviembre 25/10 | 03/01



20150831 Declaraciones web

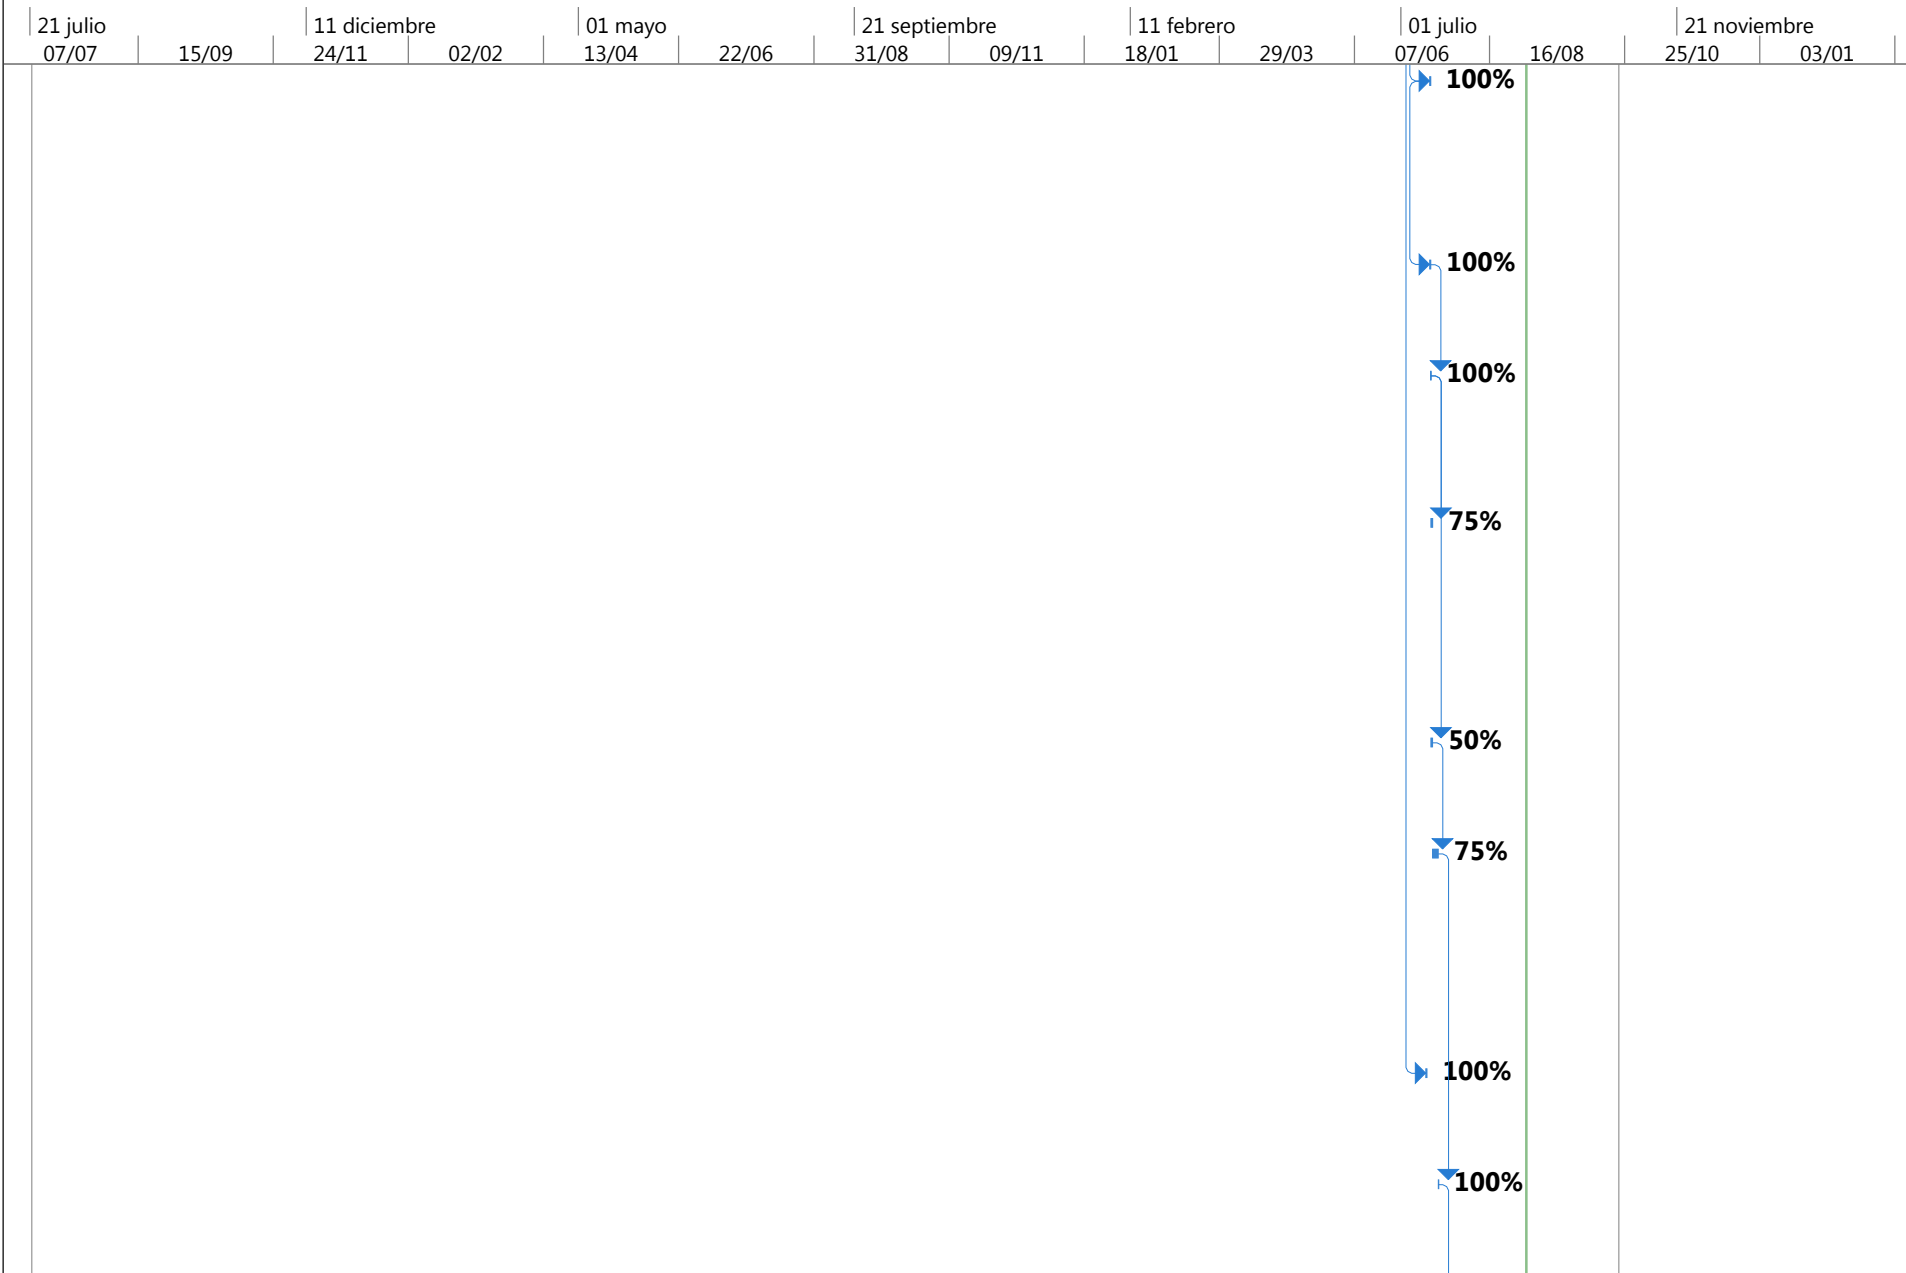

20150831 Declaraciones web

21 julio 07/07	15/09	11 diciembre 24/11	02/02	01 mayo 13/04	22/06	21 septiembre 31/08	09/11	11 febrero 18/01	29/03	01 julio 07/06	16/08	21 noviembre 25/10	03/01
-------------------	-------	-----------------------	-------	------------------	-------	------------------------	-------	---------------------	-------	-------------------	-------	-----------------------	-------

100%

100%

35%

50%

23/07


35%

20150831 Declaraciones web


21 julio 07/07	15/09	11 diciembre 24/11	02/02	01 mayo 13/04	22/06	21 septiembre 31/08	09/11	11 febrero 18/01	29/03	01 julio 07/06	16/08	21 noviembre 25/10	03/01
-------------------	-------	-----------------------	-------	------------------	-------	------------------------	-------	---------------------	-------	-------------------	-------	-----------------------	-------




20150831 Declaraciones web

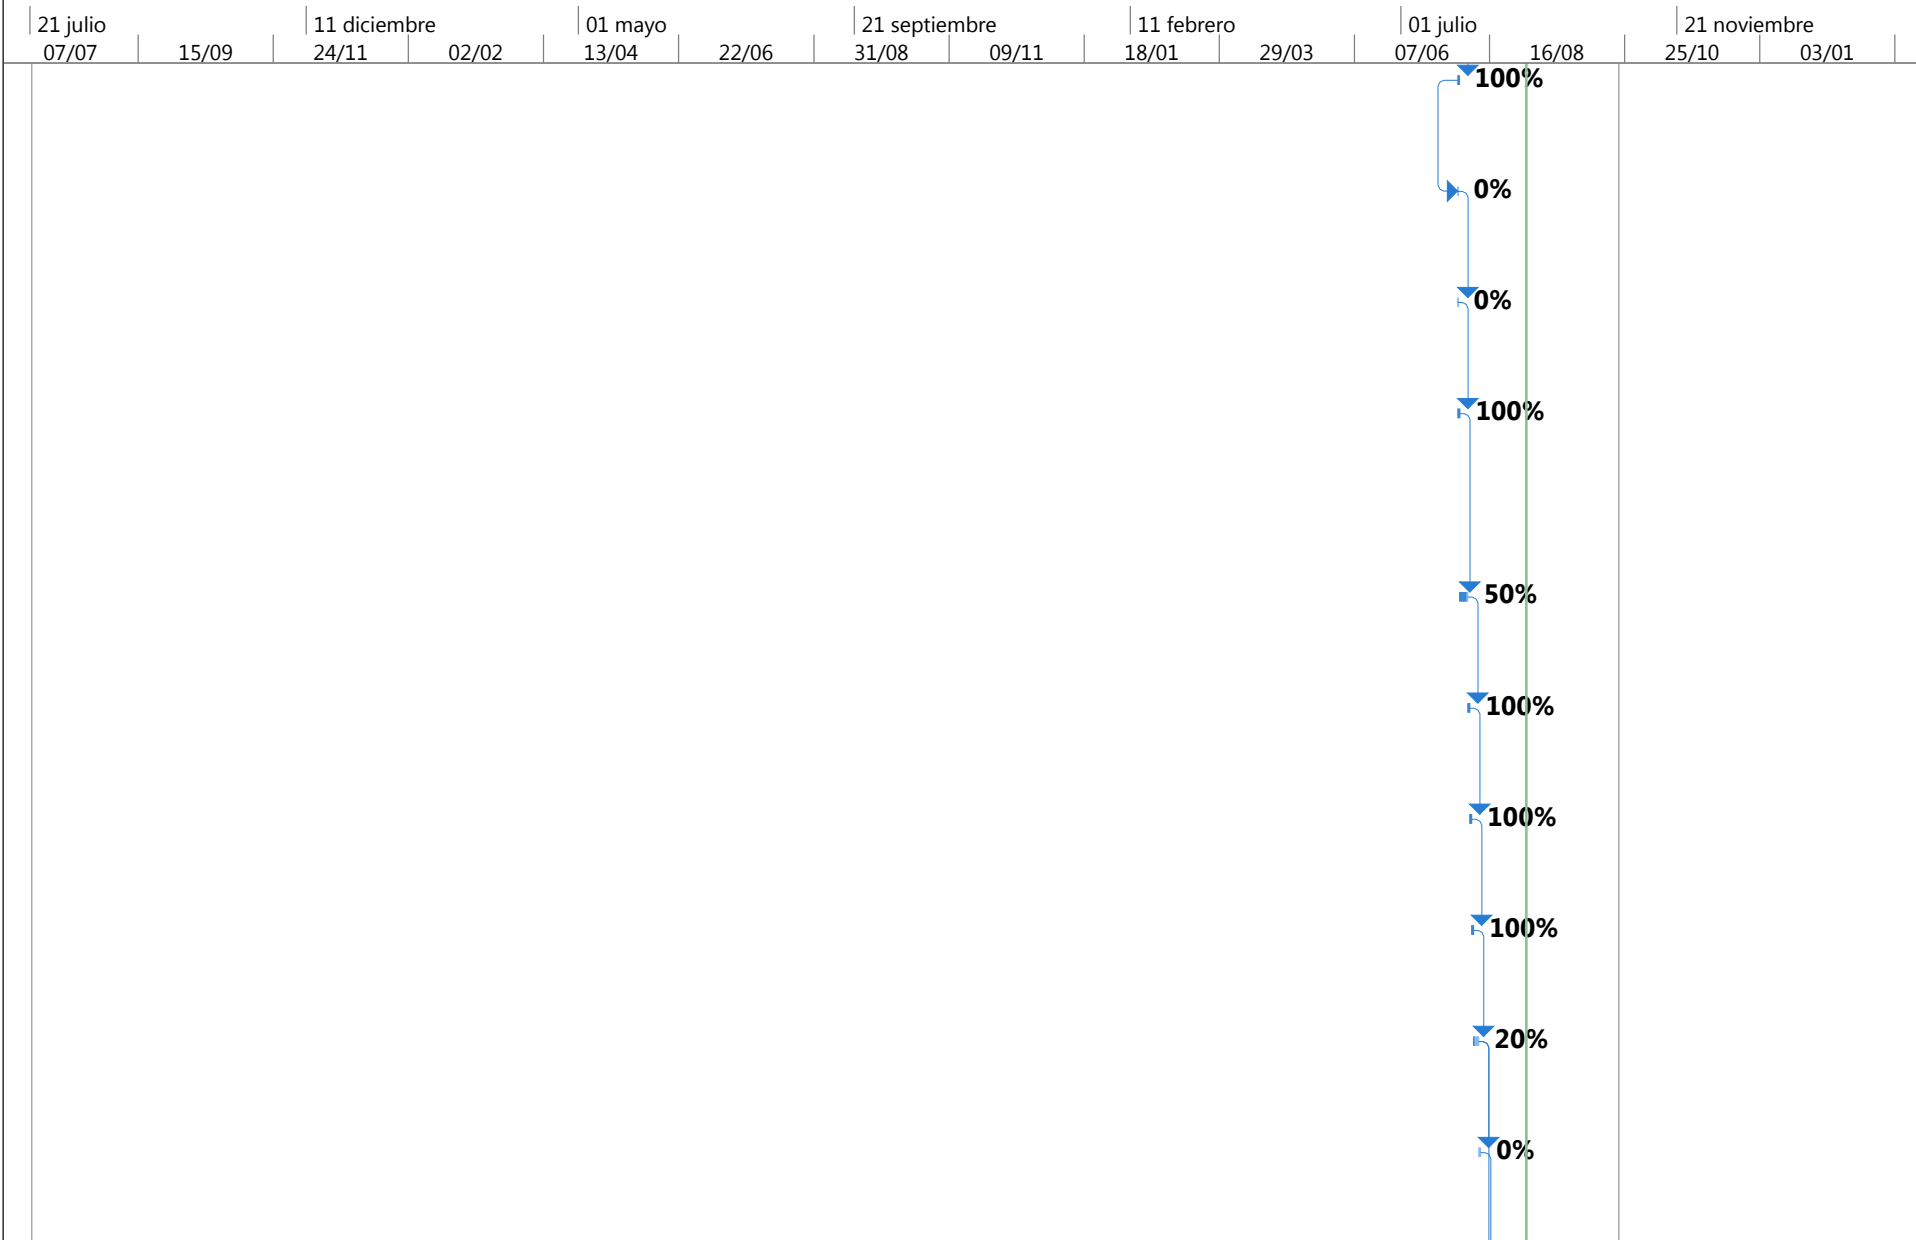


20150831 Declaraciones web

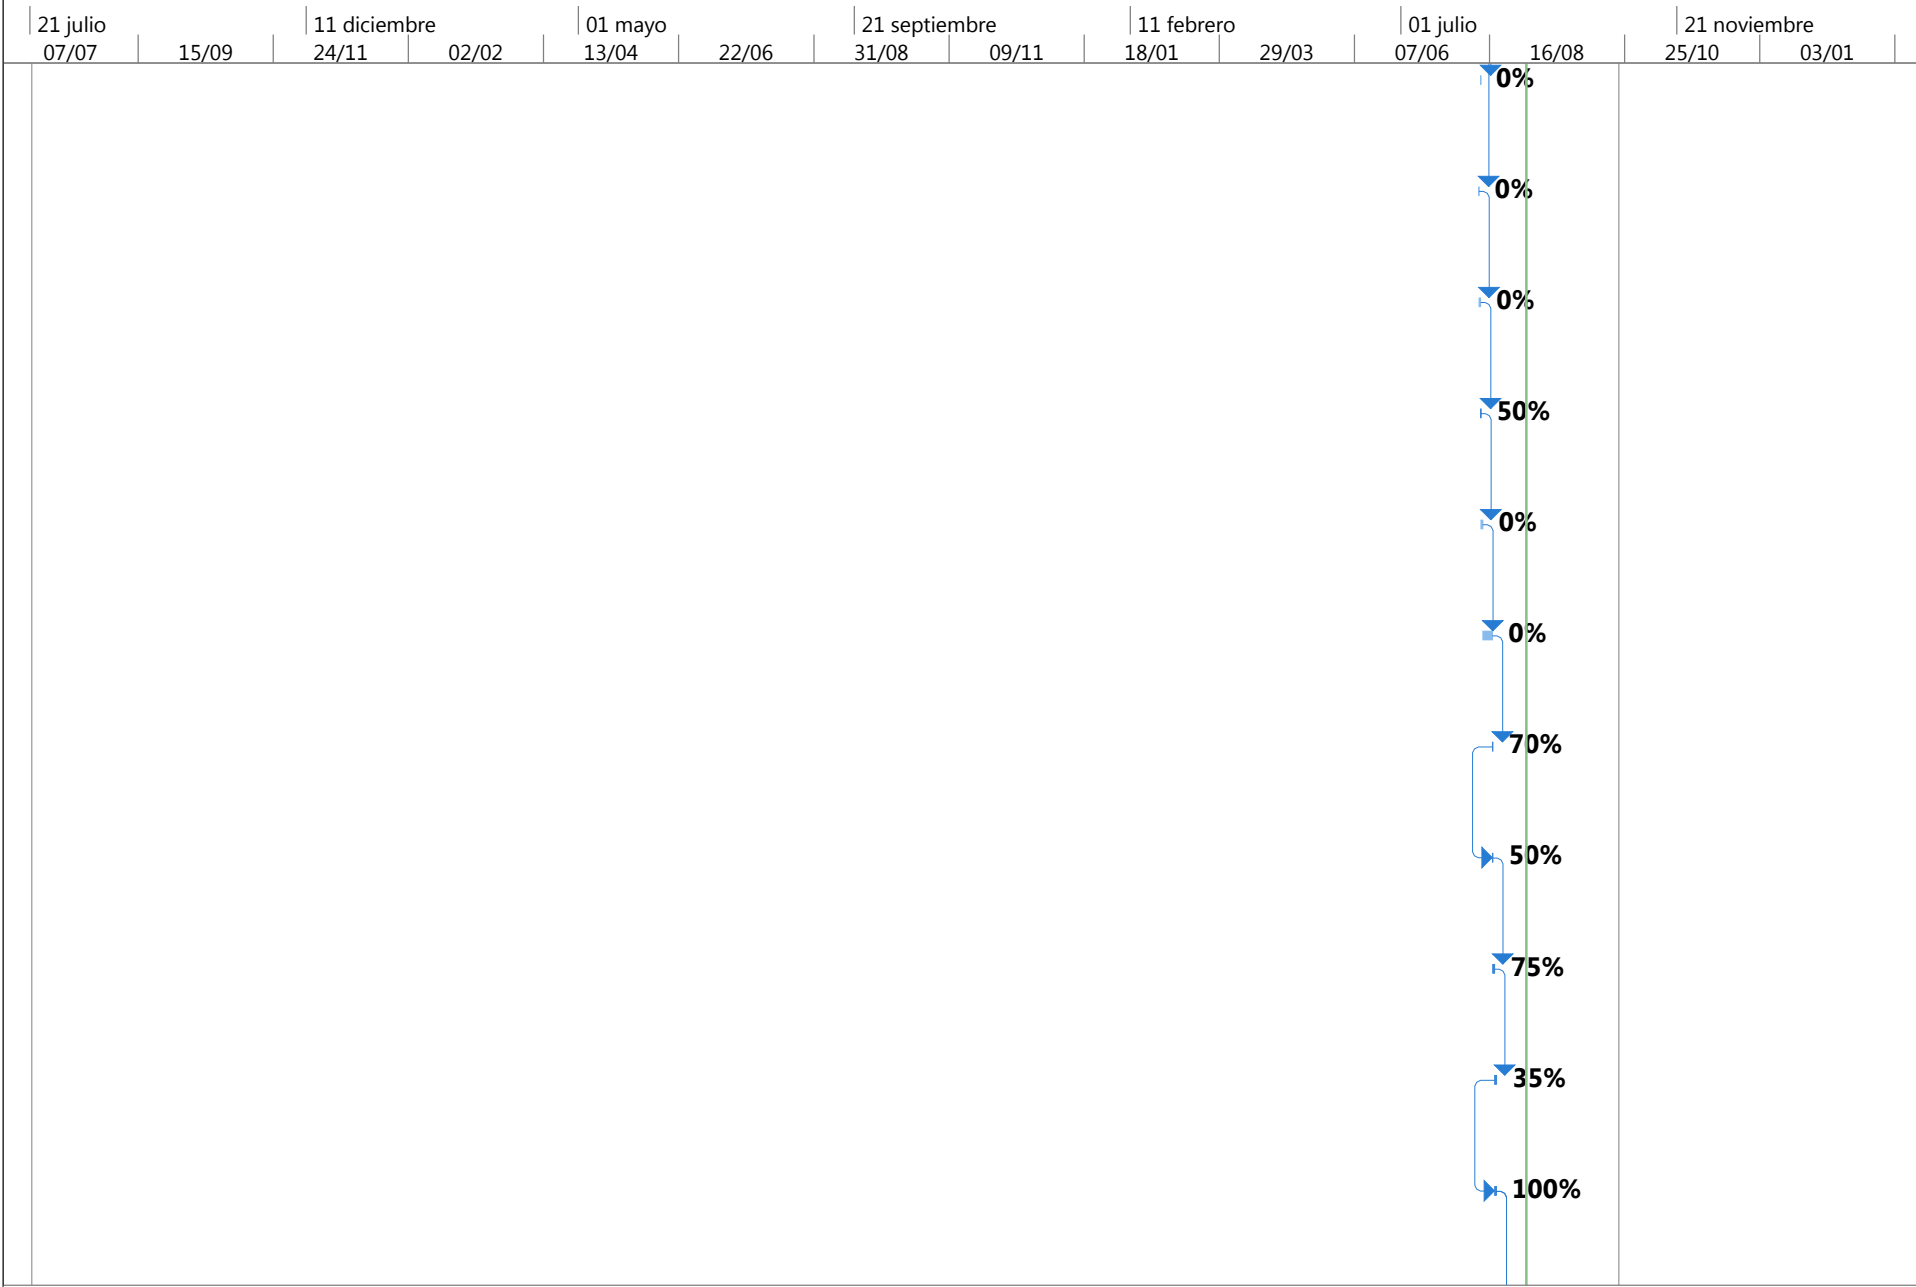


20150831 Declaraciones web

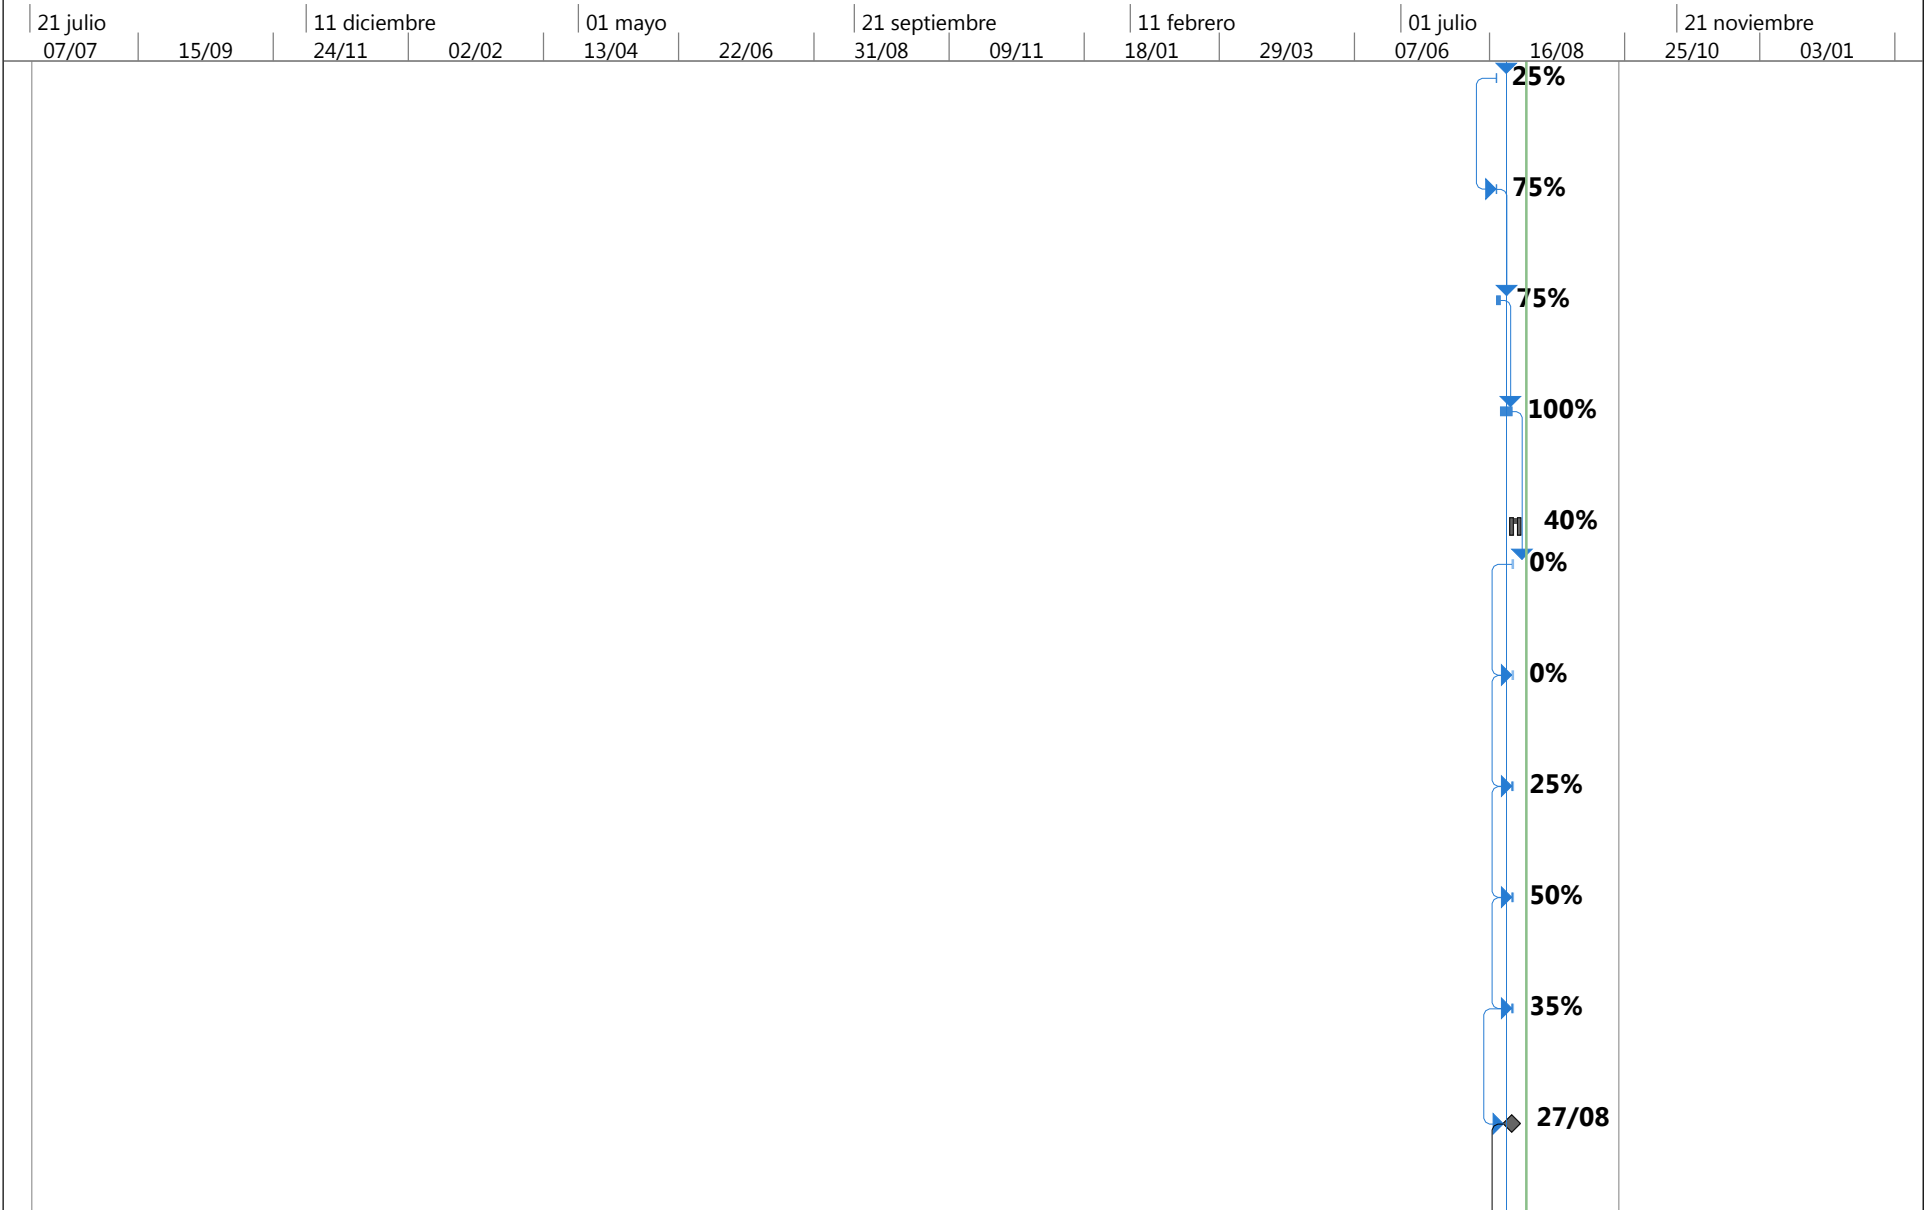

20150831 Declaraciones web

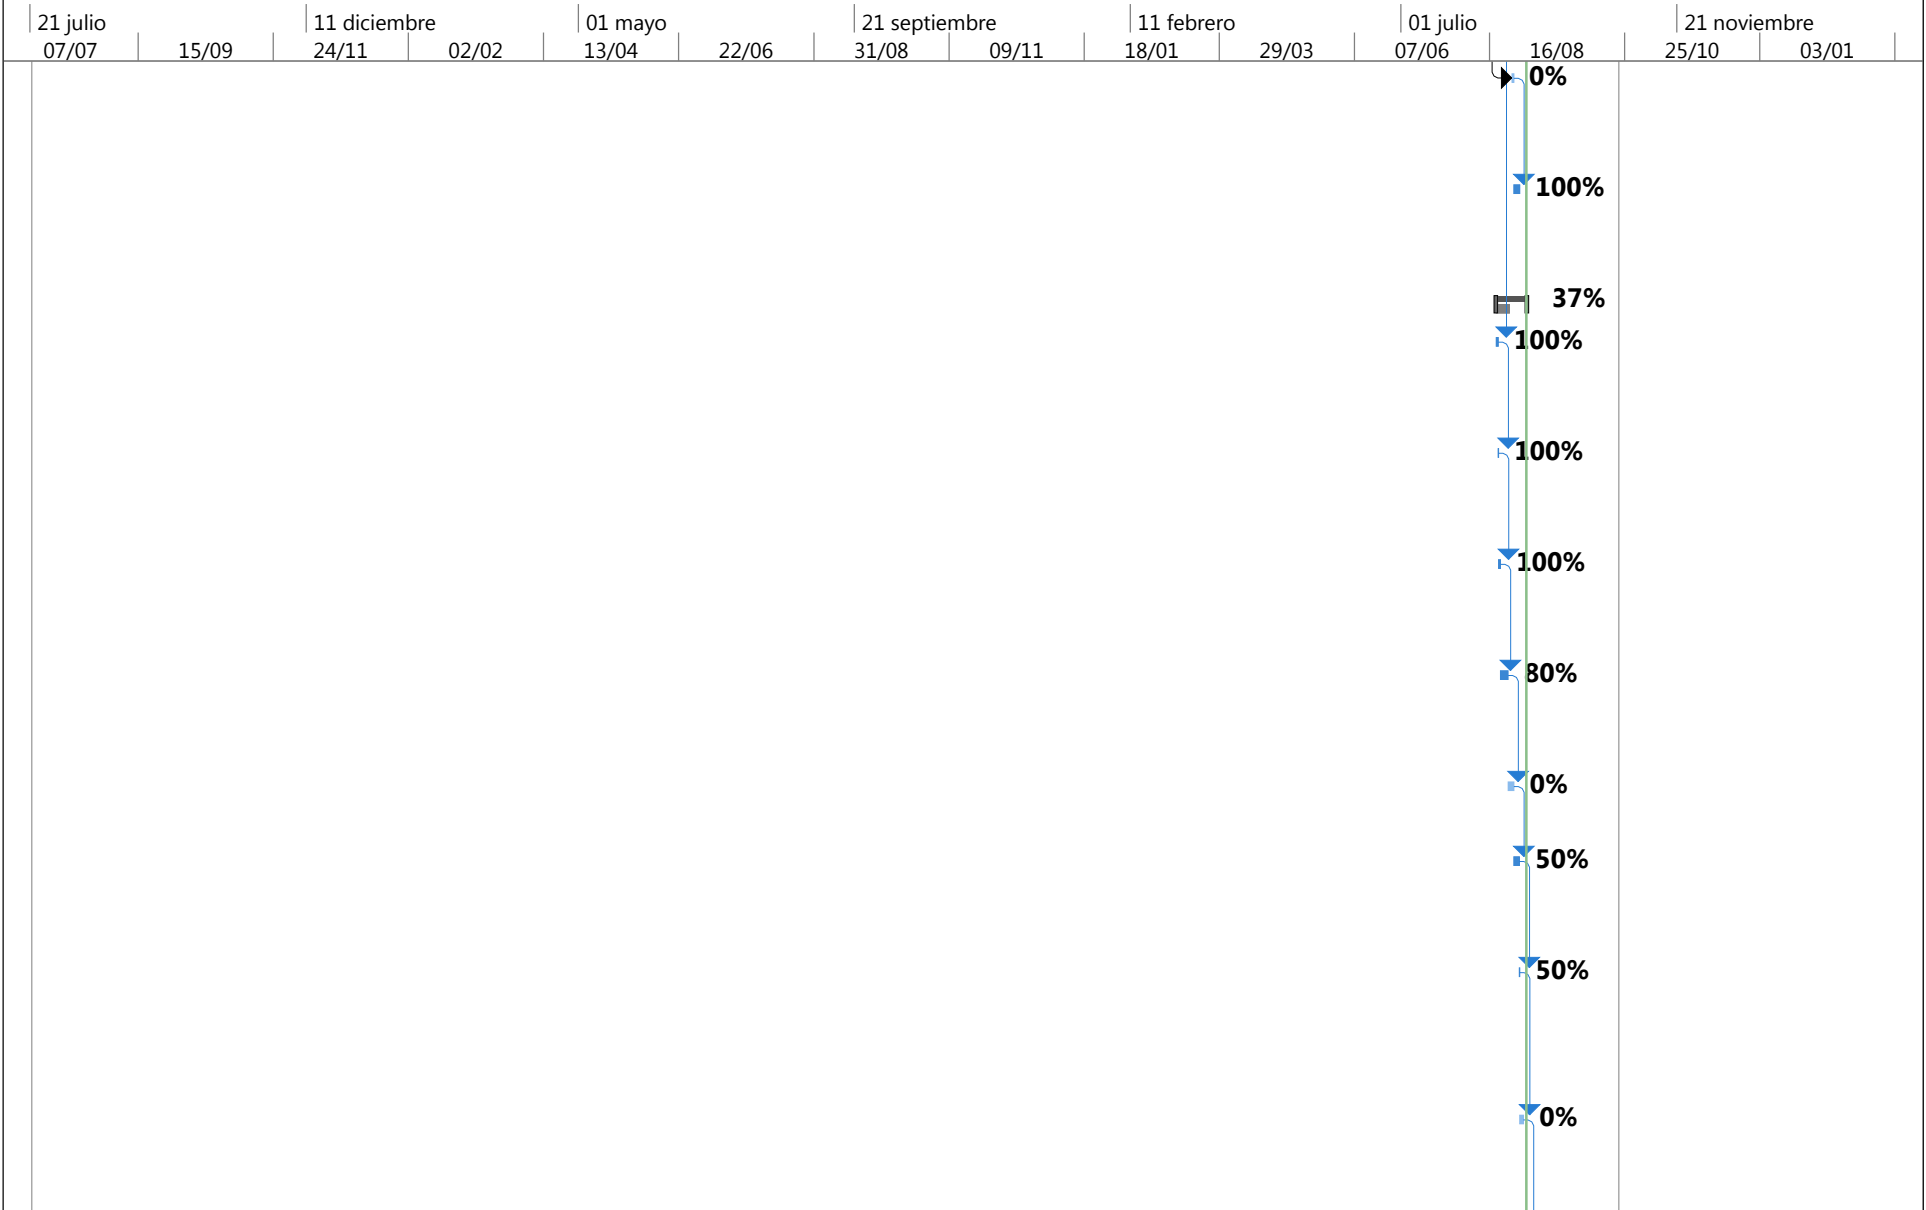

20150831 Declaraciones web

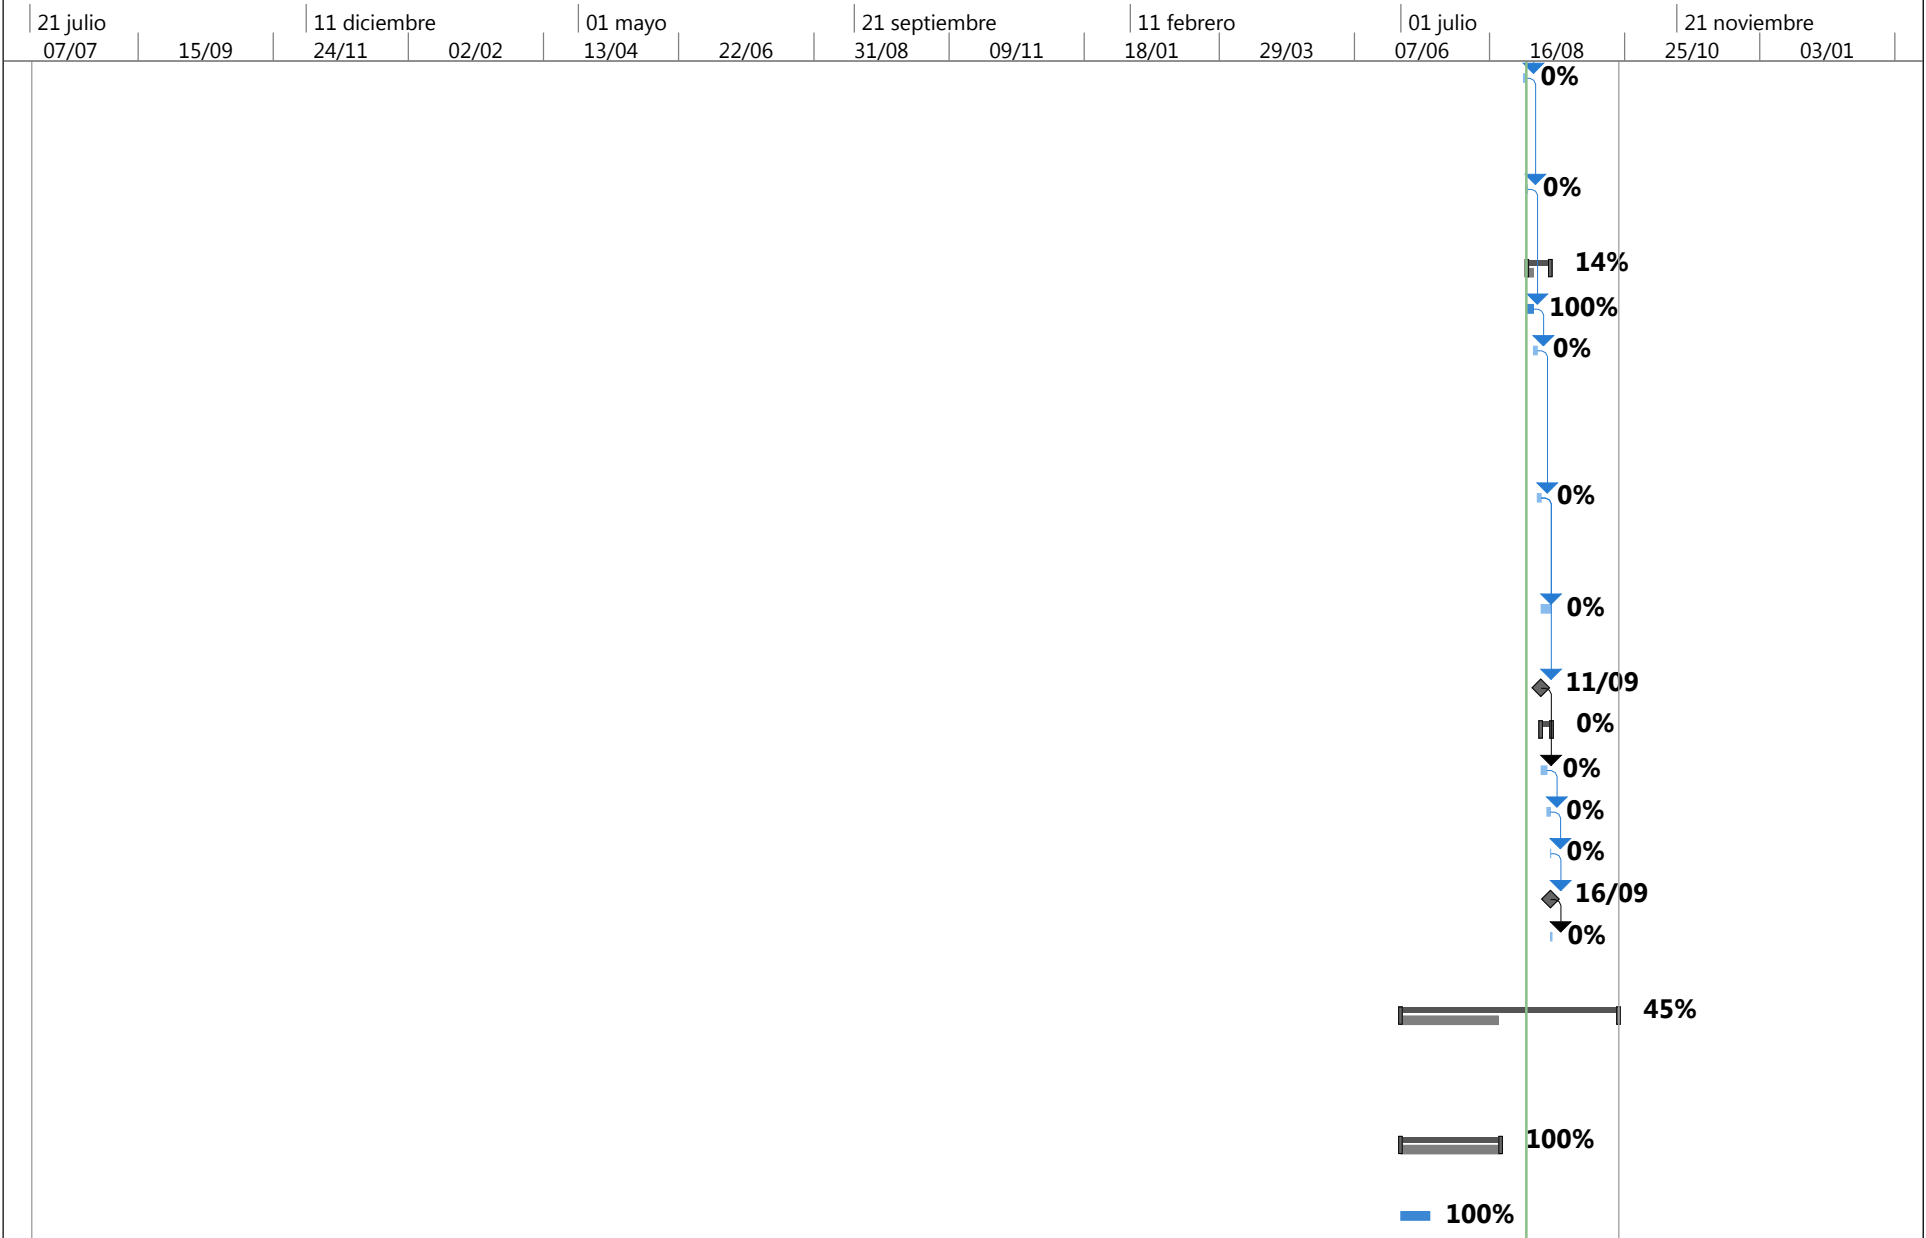

20150831 Declaraciones web

