





























20151021 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	
0	  	20151021 Declaraciones web	552,63	28.938	lun	mié			100%	28/04
			días horas		22/07/13	21/10/15				
1		P1: Cargar catálogos y realizar su mantenimiento	161,63	1.041	lun	mié			100%	
			días horas		22/07/13	12/03/14				
2		Análisis y diseño producto 1	39 días	618 horas	lun 22/07/13	mar 17/09/13			100%	
3	 	1-Inventariar los catálogos en BD TD@	10 días	80 horas	lun 22/07/13	mar 06/08/13		S-COM3 RO	100%	
4	 	1-Análisis de catálogos y su carga	8 días	128 horas	mié 07/08/13	lun 19/08/13	3	S-COM4 PO;S-COM3	100%	
5		1-Revisión, ajustes y aprobación	16 horas	16 horas	mar 20/08/13	mié 21/08/13	4	Mercedes Rapso	100%	
6	 	1-Diseño de catálogos y su carga	17 días	272 horas	jue 22/08/13	vie 13/09/13	5	S-COM4 PO;DP-S-COM	100%	
7		1-Revisión, ajustes y aprobación	16 horas	32 horas	lun 16/09/13	mar 17/09/13	6	S-COM4 PO;Mercedes	100%	
8		1-Administración contraparte S-COM	90 horas	90 horas	lun 22/07/13	jue 08/08/13		DP-S-COM	100%	
9		1-Análisis y diseño aprobados Producto 1: Cargar catálogos y realizar su mantenimiento	0 días	0 horas	mar 17/09/13	mar 17/09/13	7	Mercedes Rapso	100%	
10		Construcción producto 1	122,63 días	423 horas	mié 18/09/13	mié 12/03/14			100%	
38		Prod 2: Formulario dinámico e Impuesto de Renta	175 días	3.624	mié	mié			100%	
			horas		28/08/13	14/05/14				
39		Análisis y diseño producto 2	82 días	1.568 horas	mié 28/08/13	vie 20/12/13			100%	
40	 	2-Investigar llenado offline	6 días	48 horas	mié 28/08/13	jue 05/09/13	37FC-137	S-COM3 RO	100%	
41		2-Preanálisis formulario dinámico	7 días	56 horas	jue 05/09/13	lun 16/09/13	40	S-COM3 RO	100%	
42	 	2-Análisis de formulario dinámico e impuesto de renta	30 días	480 horas	lun 23/09/13	lun 04/11/13	41FC+5 días	S-COM3 RO;S-COM4	100%	
43		2-Revisión, ajustes y aprobación del análisis	5 días	120 horas	lun 04/11/13	lun 11/11/13	42	Luis F. Coronado;S-CO	100%	

20151021 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	
										28/04
44		2-Prototipo del generador de formularios dinámicos	5 días	80 horas	lun 04/11/13	lun 11/11/13	42	S-COM1 AM;S-COM3	100%	
45		2-Diseño del formulario dinámico e impuesto de renta	24 días	384 horas	lun 11/11/13	vie 13/12/13	44	S-COM4 PO;S-COM3	100%	
46		2-Revisión, ajustes y aprobación del diseño	5 días	200 horas	vie 13/12/13	vie 20/12/13	45	S-COM4 PO;S-COM3	100%	
47		2-Administración Revisión del documento de análisis y diseño contraparte S-COM, Reuniones de seguimiento con contraparte técnica y el administrador del proyecto. Seguimiento de tareas del equipo de trabajo de S-COM	25 días	200 horas	lun 11/11/13	lun 16/12/13	44	DP-S-COM	100%	
48		2-Análisis y diseño aprobados Producto 2: Formulario dinámico e impuesto de renta	0 días	0 horas	vie 13/12/13	vie 13/12/13	45	Mercedes Rapso	100%	
49		Construcción producto 2	56 días	1.128 horas	vie 20/12/13	jue 13/03/14			100%	
50		2-Programar páginas para mantenimiento de formulario dinámico	25 días	200 horas	vie 20/12/13	mié 29/01/14	39	S-COM3 RO	100%	
51		2-Formulario dinámico, validaciones por javascript, pintar controles c#, llamado a WCF Genérico	25 días	200 horas	vie 20/12/13	mié 29/01/14	39	S-COM1 AM	100%	
52		2-WCF Renta, creación de interfaz y estándar para todos los WCF de	25 días	200 horas	vie 20/12/13	mié 29/01/14	39	S-COM4 PO	100%	
53		2-Administración revisión del cumplimiento de tareas del equipo de trabajo de S-COM, reuniones con contrapartes técnicas y usuarios.	25 días	200 horas	vie 20/12/13	mié 29/01/14	39	DP-S-COM	100%	
54		2-Pruebas de calidad S-COM	3 sem.	120 horas	mar 18/02/14	lun 10/03/14	50FC+4 días	S-COM2 LU	100%	
55		2-Acompañamiento y ajustes	7 días	112 horas	vie 28/02/14	lun 10/03/14	54FC-7 días	DP-S-COM;S-C	100%	
56		2-Acompañamiento Josue	3 días	24 horas	vie 28/02/14	mar 04/03/14	54FC-7 días	S-COM3 RO	100%	
57		2-Consulta de declaraciones presentadas	1 sem	40 horas	mié 05/03/14	mar 11/03/14	56	S-COM3 RO	100%	

20151021 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
58		2-Pruebas de calidad S-COM Consulta declaraciones	2 días	16 horas	mié 12/03/14	jue 13/03/14	57	S-COM2 LU	100%	
59		2-Acompañamiento y ajustes consulta declaraciones	2 días	16 horas	mié 12/03/14	jue 13/03/14	57	S-COM3 RO	100%	
60		Pruebas producto 2	37 días	928 horas	vie 14/03/14	mié 14/05/14			100%	
61		Preparación y Trasferencia de conocimiento	4 días	64 horas	vie 14/03/14	mié 19/03/14	58	S-COM1 AM;DP-S-COM	100%	
62		2-Pruebas TI Hacienda	3 sem.	240 horas	jue 20/03/14	mié 09/04/14	61	Mercedes Rap	100%	
63		2-Acompañamiento y ajustes	3 sem.	240 horas	jue 20/03/14	mié 09/04/14	61	S-COM1 AM;S	100%	
64		2-Presentación al usuario experto	3 días	24 horas	jue 10/04/14	mar 22/04/14	63	S-COM1 AM;DP-S-COM	100%	
65		2-Pruebas expertas	3 sem.	120 horas	nié 23/04/14	mié 14/05/14	64	Jose Antonio M	100%	
66		2-Acompañamiento y ajustes	3 sem.	240 horas	nié 23/04/14	mié 14/05/14	64	S-COM1 AM;S	100%	
67		2-Producto 2 aprobado: Formulario dinámico e Impuesto de Renta	0 días	0 horas	mié 14/05/14	mié 14/05/14	66	Isabel Delgado;Luis F.	100%	
68		P21: Rutina Cálculo de Intereses	49,5 días	436 horas	lun 17/03/14	mar 03/06/14			100%	
69		21-Análisis	3 días	24 horas	lun 17/03/14	mié 19/03/14	58FC+1 día	S-COM2 LU	100%	
70		21-Revisión por parte de hacienda análisis	2 días	16 horas	jue 20/03/14	vie 21/03/14	69	Randy-Hacienc	100%	
71		21-Ajustes análisis	1 día	8 horas	lun 24/03/14	lun 24/03/14	70	S-COM2 LU	100%	
72		21-Diseño	3 días	24 horas	mar 25/03/14	jue 27/03/14	70;71	S-COM2 LU	100%	
73		21-Revisión por parte de hacienda diseño	2 días	16 horas	vie 28/03/14	lun 31/03/14	72	Randy-Hacienc	100%	
74		21-Ajustes diseño	1 día	8 horas	mar 01/04/14	mar 01/04/14	73	S-COM2 LU	100%	
75		21-Elaborar plan de pruebas	5 días	40 horas	mié 02/04/14	mar 08/04/14	73;74	Isabel Delgadc	100%	
76		21-Desarrollo	13,5 días	108 horas	nié 02/04/14	mar 29/04/14			100%	
77		21-Rutina Cálculo de intereses	9 días	72 horas	nié 02/04/14	mar 22/04/14	74	S-COM2 LU	100%	
78		21- Integrar rutina con WCF	4 horas	4 horas	nié 23/04/14	mié 23/04/14	77	S-COM2 LU	100%	
79		21-Pruebas técnicas	4 días	32 horas	nié 23/04/14	mar 29/04/14	78	S-COM2 LU	100%	


















20151021 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
80		21-Pruebas usuario	14 días	144 horas	mar 29/04/14	mar 20/05/14			100%	
81		21-Preparación y Trasferencia de conocimiento	2 días	16 horas	mar 29/04/14	vie 02/05/14	79	S-COM2 LU	100%	
82		21-Pruebas usuario TI	4 días	32 horas	vie 02/05/14	jue 08/05/14	81	Randy-Hacienc	100%	
83		21-Acompañamiento Pruebas TI	4 días	32 horas	mar 06/05/14	lun 12/05/14	81FC+2 días	S-COM2 LU	100%	
84		21-Pruebas usuario experto	4 días	32 horas	lun 12/05/14	vie 16/05/14	82;83	Isabel Delgad	100%	
85		21-Acompañamiento Pruebas Usuario experto	4 días	32 horas	mié 14/05/14	mar 20/05/14	82FC+2 días;83FC+2	S-COM2 LU	100%	
86		21-Documentación	10 días	48 horas	mar 20/05/14	mar 03/06/14			100%	
87		21-Manual técnico	2 días	16 horas	mar 20/05/14	jue 22/05/14			100%	
92		21-Revisión por parte de hacienda	4 días	8 horas	jue 22/05/14	mié 28/05/14	91	Randy-Hacienc	100%	
93		21-Corrección y ajustes	1 día	8 horas	mié 28/05/14	jue 29/05/14	92	S-COM2 LU	100%	
94		21-Revisión por parte de hacienda II	2 días	8 horas	jue 29/05/14	lun 02/06/14	92;93	Randy-Hacienc	100%	
95		21-Corrección y ajustes II	1 día	8 horas	lun 02/06/14	mar 03/06/14	94	S-COM2 LU	100%	
96		21-Aprobación producto	0 días	0 horas	mar 03/06/14	mar 03/06/14	94;95	Luis F. Coronar	100%	
97		P3: Consulta a Datos del Contribuyente y acceso intranet	167 días	1.864 horas	mar 03/06/14	mié 11/02/15			100%	
98		Análisis Producto 3	25 días	472 horas	mar 03/06/14	mar 08/07/14		1d	100%	
99		3-Creación de documento de análisis	10 días	80 horas	mar 03/06/14	mar 17/06/14	96	S-COM2 LU	100%	
100		3-Revisión por parte de hacienda	2 sem.	80 horas	mar 17/06/14	mar 01/07/14	99	Adriana-Hacie	100%	
101		3-Acompañamiento y Ajustes S-COM	2 sem.	80 horas	jue 19/06/14	jue 03/07/14	99FC+2 días	S-COM2 LU	100%	
102		3-Revisión por parte de hacienda II	2 días	16 horas	jue 03/07/14	lun 07/07/14	100;101	Adriana-Hacie	100%	
103		3-Acompañamiento y Ajustes S-COM II	2 días	16 horas	vie 04/07/14	mar 08/07/14	100FC+1 día;101FC+1	S-COM2 LU	100%	

20151021 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
104		3-Aprobación análisis	0 días	0 horas	mar 08/07/14	mar 08/07/14	103	Adriana-Hacie	100%	
105		Diseño Producto 3	36 días	324 horas	mar 08/07/14	lun 01/09/14			100%	
115		3-Elaborar plan de pruebas	1 sem	40 horas	lun 01/09/14	lun 08/09/14	114	Isabel Delgado	100%	
116		Desarrollo Producto 3	53 días	424 horas	lun 01/09/14	vie 14/11/14			100%	
130		Pruebas	50 días	476 horas	vie 14/11/14	vie 06/02/15			100%	
131		3-Preparación y Trasferencia de conocimiento	3 días	24 horas	vie 14/11/14	mié 19/11/14	124	S-COM2 LU	100%	
132		3--Pruebas TI Hacienda	3 sem.	120 horas	mié 19/11/14	mié 10/12/14	131	Adriana-Hacie	100%	
133		3- Crear script de pruebas TI	0 días	0 horas	vie 21/11/14	vie 21/11/14	131FC+2 día	Adriana-Hacie	100%	
134		3-Acompañamiento y ajustes	3 sem.	60 horas	vie 21/11/14	vie 12/12/14	131FC+2 día	S-COM2 LU[5C	100%	
135		3-Presentación al usuario experto	6 días	24 horas	vie 12/12/14	lun 05/01/15	134	S-COM2 LU[5C	100%	
136		3--Pruebas expertas	4 sem.	160 horas	lun 05/01/15	lun 02/02/15	135	Jose Antonio Madriz	100%	
137		3-Acompañamiento y ajustes	2 sem.	40 horas	mié 07/01/15	mié 21/01/15	135FC+2 días	S-COM2 LU[50%]	100%	
138		3- Pruebas expertas II	4 días	32 horas	lun 02/02/15	vie 06/02/15	136	Jose Antonio Madriz	100%	
139		3- Acompañamiento y ajustes II	2 días	16 horas	mié 04/02/15	vie 06/02/15	138CC+2 días	S-COM2 LU	100%	
140		Documentación	15 días	128 horas	mié 21/01/15	mié 11/02/15			100%	
141		Manual técnico	7 días	56 horas	mié 21/01/15	vie 30/01/15			100%	
146		3-Revisión por parte de hacienda	1 sem	40 horas	vie 30/01/15	vie 06/02/15	145	Adriana-Hacie	100%	
147		3-Corrección y ajustes	2 días	16 horas	vie 06/02/15	mar 10/02/15	146	S-COM2 LU	100%	
148		3-Revisión por parte de hacienda II	1 día	8 horas	mar 10/02/15	mié 11/02/15	146;147	Adriana-Hacie	100%	
































20151021 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	
										28/04
149		3-Corrección y ajustes II	1 día	8 horas	mar 10/02/15	mié 11/02/15	146;147	S-COM2 LU	100%	
150		3-Producto 3 aprobado	0 días	0 horas	mié 11/02/15	mié 11/02/15	149	Mercedes Rapso	100%	
151		P4: Acceso de usuarios Contribuyentes y buzón	192,5 días	3.176 horas	jue 15/05/14	vie 27/02/15			100%	
152		Análisis Producto 4	23 días	368 horas	jue 15/05/14	lun 16/06/14			100%	
159		Diseño Producto 4	35 días	632 horas	mar 17/06/14	mié 06/08/14			100%	
169		4-Elaborar plan de pruebas	1 sem	40 horas	vie 16/01/15	vie 23/01/15	194FC+2 días	Isabel Delgado	100%	
170		Construcción Producto 4	66 días	896 horas	jue 07/08/14	lun 10/11/14			100%	
189		Pruebas Producto 4	87,5 días	992 horas	lun 06/10/14	mié 18/02/15			100%	
199		4- Documentación	32 días	248 horas	mié 14/01/15	vie 27/02/15			100%	
209		4-Producto 4 aprobado: Acceso al portal y buzón	0 días	0 horas	mié 18/02/15	mié 18/02/15	198	Miguel-Hacien	100%	
210		P19: Ajustes Conectividad para que funcione con nueva plataforma, sólo ajustes para conectar con nueva BD y quitar TD@	231,5 días	1.696 horas	lun 24/03/14	mié 11/03/15			100%	
211		19-Análisis	6 días	24 horas	jue 15/05/14	jue 22/05/14	67	DP-S-COM[50	100%	
212		19-Revisión por parte de hacienda análisis	4 días	16 horas	vie 23/05/14	mié 28/05/14	211	Michael-Hacie	100%	
213		19-Ajustes análisis	2 días	8 horas	jue 29/05/14	vie 30/05/14	212	DP-S-COM[50	100%	
214		19-Diseño	8 días	32 horas	lun 02/06/14	mié 11/06/14	212;213	DP-S-COM[50	100%	
215		19-Revisión por parte de hacienda diseño	8 días	32 horas	jue 12/06/14	lun 23/06/14	214	Michael-Hacie	100%	

20151021 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	
										28/04
216		19-Ajustes diseño	1 día	4 horas	mar 24/06/14	mar 24/06/14	215	DP-S-COM[50%	100%	
217		19-Elaborar plan de pruebas	1 sem	40 horas	mar 03/02/15	mar 10/02/15	227	Michael-Hacie	100%	
218		19-Desarrollo	197,38 días	1.280 horas	mar 24/03/14	jue 22/01/15			100%	
223		19-Pruebas usuario	24 días	176 horas	mié 14/01/15	mar 17/02/15			100%	
224		19-Preparación y Tránsito de conocimiento	2 días	8 horas	mié 14/01/15	vie 16/01/15	194	DP-S-COM[50%	100%	
225		19-Pruebas usuario TI	10 días	40 horas	vie 16/01/15	vie 30/01/15	224	Michael-Hacie	100%	
226		19- Crear script de pruebas TI	0 días	0 horas	mar 20/01/15	mar 20/01/15	224FC+2 día	Michael-Hacie	100%	
227		19-Acompañamiento Pruebas TI	10 días	40 horas	mar 20/01/15	mar 03/02/15	224FC+2 día	DP-S-COM[50%	100%	
228		19-Pruebas usuario TI II	10 días	80 horas	mar 03/02/15	mar 17/02/15	225;227	Gustavo-Hacie	100%	
229		19-Acompañamiento Pruebas Usuario TI II	2 días	8 horas	jue 05/02/15	lun 09/02/15	225FC+2 días;227FC+	DP-S-COM[50%	100%	
230		19-Documentación	16 días	84 horas	mar 17/02/15	mié 11/03/15			100%	
231		19-Manual técnico	10 días	40 horas	mar 17/02/15	mar 03/03/15			100%	
236		19-Revisión por parte de hacienda	4 días	16 horas	mar 03/03/15	lun 09/03/15	235	Michael-Hacie	100%	
237		19-Corrección y ajustes	4 días	16 horas	mar 03/03/15	lun 09/03/15	235	DP-S-COM[50%	100%	
238		19-Revisión por parte de hacienda II	1 día	4 horas	lun 09/03/15	mar 10/03/15	236;237	Michael-Hacie	100%	
239		19-Corrección y ajustes II	2 días	8 horas	lun 09/03/15	mié 11/03/15	236;237	DP-S-COM[50%	100%	
240		19-Aprobación producto	0 días	0 horas	mié 11/03/15	mié 11/03/15	238;239	Luis F. Coronar	100%	
241		P5: Paquete de Impuesto General sobre las ventas y retenciones	162 días	1.372,1 horas	jue 15/05/14	jue 15/01/15			100%	
242		5-Formulario ventas	157 días	624 horas	jue 15/05/14	jue 08/01/15			100%	
243		5-Análisis	3 días	24 horas	jue 15/05/14	lun 19/05/14	67	Randy-Hacienc	100%	
244		5-Revisión por parte de hacienda análisis	2 días	16 horas	mar 20/05/14	mié 21/05/14	243	Mercedes Rap	100%	
245		5-Ajustes análisis	1,33 días	8 horas	jue 22/05/14	vie 23/05/14	244	Randy-Hacienc	100%	
246		5-Diseño	5,33 días	32 horas	vie 23/05/14	vie 30/05/14	245	Randy-Hacienc	100%	
247		5-Revisión por parte de hacienda diseño	1 día	8 horas	vie 30/05/14	lun 02/06/14	246	Mercedes Rap	100%	
248		5-Ajustes diseño	1 día	8 horas	lun 02/06/14	mar 03/06/14	247	Randy-Hacienc	100%	

















20151021 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	
										28/04
249		5-Elaborar plan de pruebas	1 sem	40 horas	mar 03/06/14	mar 10/06/14	248	Jose Antonio Madriz	100%	
250		5-Desarrollo	70,73 días	80 horas	mar 10/06/14	mar 23/09/14			100%	
254		5-Pruebas usuario	67,6 días	320 horas	mar 23/09/14	jue 08/01/15			100%	
255		5-Pruebas usuario TI	5 días	40 horas	mar 23/09/14	mar 30/09/14	253	Mercedes Rap	100%	
256		5- Crear script de pruebas ventas TI	0 días	0 horas	jue 25/09/14	jue 25/09/14	253FC+2 día	Mercedes Rap	100%	
257		5-Acompañamiento Pruebas TI	20 días	40 horas	mar 23/09/14	mar 21/10/14	253	Randy-Hacienc	100%	
258	 	5-Pruebas usuario experto	10 días	80 horas	lun 17/11/14	vie 28/11/14	255;257	Isabel Delgadc	100%	
259		5. MODIFICACIONES I	5 días	40 horas	lun 17/11/14	vie 21/11/14	255;257	Randy-Hacienc	100%	
260		5-Pruebas usuario II	10 días	80 horas	vie 12/12/14	jue 08/01/15	258;259	Katia Vargas	100%	
261		5-Acompañamiento pruebas usuario II	5 días	40 horas	lun 08/12/14	vie 12/12/14	258;259	Randy-Hacienc	100%	
262		5-Aprobación producto	0 días	0 horas	jue 08/01/15	jue 08/01/15	260;261	Isabel Delgadc	100%	
263		5-Documentación ventas	8 días	88 horas	mar 04/11/14	vie 14/11/14			100%	
264		5-Manual técnico	5 días	40 horas	mar 04/11/14	mar 11/11/14			100%	
269		5-Revisión por parte de hacienda	2 días	16 horas	mar 11/11/14	jue 13/11/14	268	Mercedes Rap	100%	
270		5-Corrección y ajustes	2 días	16 horas	mar 11/11/14	jue 13/11/14	268	Randy-Hacienc	100%	
271		5-Revisión por parte de hacienda II	1 día	8 horas	jue 13/11/14	vie 14/11/14	269;270	Mercedes Rap	100%	
272		5-Corrección y ajustes II	1 día	8 horas	jue 13/11/14	vie 14/11/14	269;270	Randy-Hacienc	100%	
273	 	5- Aprobacion documentacion producto ventas	0 días	0 horas	jue 08/01/15	jue 08/01/15	260	Mercedes Rapso	100%	
274		5-Formulario retenciones	162 días	748,1 horas	jue 15/05/14	jue 15/01/15			100%	
275	 	5-Análisis retenciones	7 días	56 horas	jue 15/05/14	vie 23/05/14	67	Yeudin-Hacien	100%	
276		5-Revisión y ajustes análisis retenciones	2 días	16 horas	lun 26/05/14	mar 27/05/14	275	Mercedes Rap	100%	
277		5-Diseño retenciones	12 días	96 horas	mié 28/05/14	jue 12/06/14	276	Yeudin-Hacien	100%	
278		5-Revisión y ajustes análisis retenciones	4 días	32 horas	vie 13/06/14	mié 18/06/14	277	Mercedes Rap	100%	
279		5-Elaborar plan de pruebas retenciones	1 sem	40 horas	jue 19/06/14	mié 25/06/14	278	Jose Antonio Madriz	100%	
280		5-Desarrollo retenciones	16 días	136 horas	jue 19/06/14	jue 10/07/14			100%	
285		5- Pruebas usuario retenciones	121 días	300,1 horas	vie 11/07/14	jue 15/01/15			100%	
286		5-Pruebas usuario TI retenciones	10 días	80 horas	vie 11/07/14	jue 24/07/14	284	Pamela-Hacier	100%	















20151021 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
287	✓	5- Crear script de pruebas retenciones	0 días	0 horas	lun 14/07/14	lun 14/07/14	284FC+2 día	Pamela-Hacier	100%	
288	✓	5-Acompañamiento Pruebas TI retenciones	5 días	40 horas	vie 11/07/14	jue 17/07/14	284	Yeudin-Hacien	100%	
289	✓	5-Pruebas usuario experto retenciones II	15 días	60,1 horas	vie 12/12/14	jue 15/01/15	286;288		100%	
290	✓	5-Acompañamiento Pruebas Usuario experto retenciones II	15 días	120 horas	vie 12/12/14	jue 15/01/15	286;288	Yeudin-Hacien	100%	
291	✓	5- Documentación retenciones	11 días	72 horas	mar 05/08/14	mié 20/08/14			100%	
292	✓	5- Manual técnico retenciones	5 días	40 horas	mar 05/08/14	lun 11/08/14			100%	
297	✓	5- Revisión por parte de hacienda retenciones	1 día	8 horas	jue 14/08/14	jue 14/08/14		Mercedes Rapso	100%	
298	✓	5- Corrección y ajustes retenciones	1 día	8 horas	lun 18/08/14	lun 18/08/14	297	Yeudin-Hacien	100%	
299	✓	5-Revisión por parte de hacienda II retenciones	1 día	8 horas	mar 19/08/14	mar 19/08/14	298	Mercedes Rapso	100%	
300	✓	5-Corrección y ajustes II retenciones	1 día	8 horas	mié 20/08/14	mié 20/08/14	299	Yeudin-Hacien	100%	
301	✓	5-Aprobación producto retenciones	0 días	0 horas	jue 15/01/15	jue 15/01/15	290	Jose Antonio M	100%	
302	✓	P6: Rutinas y consulta contribuyente	67,5 días	952 horas	lun 26/01/15	jue 07/05/15			100%	
303	✓	Análisis Producto 6	9 días	72 horas	lun 26/01/15	jue 05/02/15			100%	
310	✓	Diseño Producto 6	11 días	100 horas	mié 11/02/15	jue 26/02/15			100%	
311	✓	6-Creación documento diseño	2 días	32 horas	mié 11/02/15	vie 13/02/15	309;150	S-COM2 LU;S-COM3 RO	100%	
312	✓	6-Creación prototipo	0 días	0 horas	vie 13/02/15	vie 13/02/15	311	S-COM2 LU;S-COM3 RO	100%	
313	✓	6-Revisión por parte de hacienda de documento de diseño	0,9 sem.	36 horas	vie 13/02/15	vie 20/02/15	311	Luis F. Coronado	100%	
314	✓	6-Presentación prototipo S-COM	0 horas	0 horas	vie 13/02/15	vie 13/02/15	312	S-COM2 LU;S-COM3 RO	100%	

20151021 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
315		6-Presentación prototipo	0 horas	0 horas	vie 13/02/15	vie 13/02/15	312	Jose Antonio Madriz; Luis F. Coronado; Mar Zeledón; Merce Rapso	100%	
316		6-Ajustes Documento de diseño y prototipo	0 días	0 horas	vie 20/02/15	vie 20/02/15	313;314;315	S-COM2 LU; S-COM3 RO	100%	
317		6-Revisión por parte de hacienda de documento de diseño II	2 días	16 horas	vie 20/02/15	mar 24/02/15	316	Luis F. Coronado	100%	
318		6-Ajustes Documento de diseño y prototipo II	1 día	16 horas	mié 25/02/15	jue 26/02/15	317	S-COM2 LU; S-COM3 RO	100%	
319		6-Aprobación diseño	0 días	0 horas	jue 26/02/15	jue 26/02/15	317;318	Luis F. Coronado; Merce Rapso	100%	
320		6-Elaborar plan de pruebas	1 sem	40 horas	jue 19/03/15	jue 26/03/15	328CC	Jose Antonio Madriz	100%	
321		Desarrollo Producto 6	15,5 días	220 horas	jue 26/02/15	jue 19/03/15			100%	
322	 	6-Crear vistas para acceder nueva estructura de datos	5 días	40 horas	jue 26/02/15	jue 05/03/15	319	S-COM4 PO	100%	
323		6-Consultar datos maestros del contribuyente	4 días	32 horas	jue 05/03/15	mié 11/03/15	322	S-COM4 PO	100%	
324	 	6-Reporte de declaraciones (reporting)	15,5 días	124 horas	jue 26/02/15	jue 19/03/15	319	S-COM3 RO	100%	
325		6-Pruebas técnicas	3 días	24 horas	mié 11/03/15	lun 16/03/15	323	S-COM4 PO	100%	
326		Pruebas 6	20 días	328 horas	lun 16/03/15	lun 20/04/15			100%	
327		6-Preparación y Tránsito de conocimiento	3 días	24 horas	lun 16/03/15	jue 19/03/15	325	S-COM2 LU	100%	
328		6-Pruebas TI Hacienda	5 días	40 horas	jue 19/03/15	jue 26/03/15	327	Luis F. Coronado	100%	

20151021 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
329		6- Crear script de pruebas TI	0 días	0 horas	lun 23/03/15	lun 23/03/15	327FC+2 días	Luis F. Coronado	100%	
330		6-Acompañamiento y ajustes	5 días	80 horas	lun 23/03/15	lun 06/04/15	327FC+2 días	S-COM2 LU;S-COM3 RO	100%	
331		6-Presentación al usuario experto	1 día	16 horas	lun 06/04/15	mar 07/04/15	328;330	S-COM2 LU;S-COM3 RO	100%	
332		6-Pruebas expertas	7 días	56 horas	mar 07/04/15	jue 16/04/15	331	Jose Antonio Madriz	100%	
333		6-Acompañamiento y ajustes	7 días	112 horas	jue 09/04/15	lun 20/04/15	331FC+2 días	S-COM2 LU;S-COM3 RO	100%	
334		Documentación 6	12 días	192 horas	lun 20/04/15	jue 07/05/15			100%	
335		Manual técnico 6	5 días	48 horas	lun 20/04/15	lun 27/04/15			100%	
340		6-Manual de usuario	4 días	32 horas	mar 21/04/15	lun 27/04/15	339	S-COM3 RO	100%	
341		6-Revisión por parte de hacienda	4 días	32 horas	lun 27/04/15	lun 04/05/15	340;338	Luis F. Coronado	100%	
342		6-Corrección y ajustes	4 días	64 horas	mar 28/04/15	mar 05/05/15	340FC+1 día	S-COM2 LU;S-COM3 RO	100%	
343		6-Revisión por parte de hacienda II	1 día	8 horas	mar 05/05/15	mié 06/05/15	341;342	Luis F. Coronado	100%	
344		6-Corrección y ajustes II	1 día	8 horas	mié 06/05/15	jue 07/05/15	341FC+1 día;342FC+1	S-COM2 LU	100%	
345		6-Producto 6 aprobado	0 días	0 horas	jue 16/04/15	jue 16/04/15	332	Luis F. Coronado;Mer Rapso	100%	
346		P7: Descargar y subir archivo xml	202,8 días	1.763,2 horas	jue 15/05/14	vie 13/03/15			100%	


























20151021 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
347		7-Análisis	3 sem.	120 horas	jue 15/05/14	mié 04/06/14	67	Fabio-Haciend	100%	
348		7-Diseño	4 sem.	160 horas	jue 05/06/14	mié 02/07/14	347	Fabio-Haciend	100%	
349		7-Elaborar plan de pruebas	1 sem	40 horas	lun 09/02/15	lun 16/02/15	360	Isabel Delgado	100%	
350		7-Desarrollo	138,8 días	1.080 horas	jue 03/07/14	lun 02/02/15			100%	
351		7-Horas Acompañamiento	1 sem	40 horas	mar 15/07/14	lun 21/07/14	348;164	S-COM1 AM	100%	
352		7-Preparación de especificaciones del XML	20 días	160 horas	jue 03/07/14	vie 01/08/14	348	Fabio-Haciend	100%	
353		7-Archivos de ayuda fuera de línea	25 días	200 horas	lun 04/08/14	lun 08/09/14	352	Fabio-Haciend	100%	
354		7-Generación de XML	25 días	200 horas	mar 09/09/14	mar 14/10/14	353	Fabio-Haciend	100%	
355		7-Subir XML	40 días	320 horas	mié 15/10/14	mar 09/12/14	354	Fabio-Haciend	100%	
356		7-Pruebas técnicas	20 días	160 horas	mié 10/12/14	lun 02/02/15	355	Fabio-Haciend	100%	
357		7-Pruebas usuario	22,4 días	235,2 horas	lun 02/02/15	jue 05/03/15			100%	
358		7-Pruebas usuario TI	14,4 días	115,2 horas	lun 02/02/15	lun 23/02/15	356	Mercedes Rapso	100%	
359		7- Crear script de pruebas TI	0 días	0 horas	mié 04/02/15	mié 04/02/15	356FC+2 días	Mercedes Rapso	100%	
360		7-Acompañamiento Pruebas TI	5 días	40 horas	lun 02/02/15	lun 09/02/15	356	Fabio-Haciend	100%	
361		7-Pruebas usuario experto	8 días	40 horas	lun 23/02/15	jue 05/03/15	358;360		100%	
362		7-Acompañamiento Pruebas Usuario experto	5 días	40 horas	lun 23/02/15	lun 02/03/15	358;360	Fabio-Haciend	100%	
363		7-Documentación	11 días	128 horas	jue 26/02/15	vie 13/03/15			100%	

20151021 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
374		7-Aprobación producto	0 días	0 horas	lun 02/03/15	lun 02/03/15	362	Luis F. Coronado;Mer Rapso	100%	
375		P8: Formularios, simplificada modelo 105 Simplificada Renta y ventas	222,3 días	2.152 horas	jue 15/05/14	vie 17/04/15			100%	
376		Formulario 105 renta	178 días	1.100 h...	e 15/05/14	ie 06/02/15			100%	
377		8-Análisis 105 renta	10 días	40 horas	e 15/05/14	ie 28/05/14	67	Michael-Hac	100%	
378		8-Revisión y ajustes análisis 105 re	6 días	48 horas	e 29/05/14	ue 05/06/14	377	Pamela-Haci	100%	
379		8-Diseño 105 renta	15 días	60 horas	e 06/06/14	ue 26/06/14	378	Michael-Hac	100%	
380		8-Revisión y ajustes diseño105 ren	5 días	40 horas	e 27/06/14	ue 03/07/14	379	Pamela-Haci	100%	
381		8-Elaborar plan de pruebas 105 rer	1 sem	40 horas	e 04/07/14	ue 10/07/14	380	Katia Vargas	100%	
382		Desarrollo	31 días	272 horas	e 04/07/14	ie 20/08/14			100%	
383		8-Acompañamiento S-COM	12 días	24 horas	e 04/07/14	jun 21/07/14	380	DP-S-COM[2	100%	
384		8-Configuración Formulario	8 horas	8 horas	e 04/07/14	ie 04/07/14	380	Michael-Hac	100%	
385		8-Programación DLL	10 días	80 horas	n 07/07/14	ie 18/07/14	384	Michael-Hac	100%	
386		8-Pruebas técnicas	20 días	160 horas	n 21/07/14	ie 20/08/14	385	Michael-Hac	100%	
387		Pruebas usuario	111 días	600 horas	e 21/08/14	ie 06/02/15			100%	
388		8-Pruebas usuario TI	10 días	80 horas	e 21/08/14	ie 03/09/14	386	Pamela-Haci	100%	
389		8-Crear script de pruebas renta TI	0 días	0 horas	vie 22/08/14	vie 22/08/14	386FC+2 día	Pamela-Haci	100%	
390		8-Acompañamiento Pruebas TI	10 días	80 horas	e 21/08/14	ie 03/09/14	386	Michael-Hac	100%	
391		8-Pruebas usuario experto I	3 sem.	120 horas	n 10/11/14	ie 28/11/14	388;390	Katia Vargas	100%	
392		8-Acompañamiento Pruebas Usu	3 sem.	120 horas	n 01/12/14	ie 19/12/14	391	Michael-Hac	100%	
393		8-Pruebas usuario experto II	3 sem.	120 horas	lun 05/01/15	vie 23/01/15	392	Katia Vargas	100%	
394		8-Acompañamiento Pruebas Usuario e	2 sem.	80 horas	lun 26/01/15	vie 06/02/15	393	Michael-Hac	100%	
395		8-Aprobación producto 105 renta	0 días	0 horas	e 06/02/15	ie 06/02/15	394	Katia Vargas	100%	
396		Formulario 105 ventas	106 días	988 horas	e 21/08/14	ie 30/01/15			100%	



20151021 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	
397		8-Análisis 105 ventas	10 días	80 horas	jue 21/08/14	mié 03/09/14	301	Mercedes Rapso	100%	28/04
398		8-Revisión y ajustes análisis 105 ventas	3 días	24 horas	e 04/09/14	un 08/09/14	397	Pamela-Haci	100%	
399		8-Diseño 105 ventas	5 días	40 horas	mar 09/09/14	mar 16/09/14	398	Mercedes Rapso	100%	
400		8-Revisión y ajustes diseños 105 ventas	5 días	40 horas	é 17/09/14	ar 23/09/14	399	Pamela-Haci	100%	
401		8-Elaborar plan de pruebas 105 ventas	1 sem	40 horas	é 24/09/14	ar 30/09/14	400	Katia Vargas	100%	
402		Desarrollo	31 días	308 horas	é 24/09/14	ié 05/11/14			100%	
403		8-Acompañamiento S-COM	15 días	60 horas	é 24/09/14	ar 14/10/14	400	DP-S-COM[5	100%	
404		8-Configuración Formulario	8 horas	8 horas	é 24/09/14	ié 24/09/14	400	Michael-Hac	100%	
405		8-Programación DLL	10 días	80 horas	e 25/09/14	ié 08/10/14	404	Michael-Hac	100%	
406		8-Pruebas técnicas	20 días	160 horas	e 09/10/14	ié 05/11/14	405	Michael-Hac	100%	
407		Pruebas usuario	52 días	456 horas	e 06/11/14	ie 30/01/15			100%	
408		8-Pruebas usuario TI	10 días	80 horas	e 06/11/14	ié 19/11/14	406	Pamela-Haci	100%	
409		8- Crear script de pruebas ventas TI	0 días	0 horas	vie 07/11/14	vie 07/11/14	406FC+2 día	Pamela-Haci	100%	
410		8-Acompañamiento Pruebas TI	5 días	40 horas	e 06/11/14	ié 12/11/14	406	Michael-Hac	100%	
411		8-Pruebas usuario experto I	10 días	80 horas	e 20/11/14	ié 03/12/14	408;410	Katia Vargas	100%	
412		8-Acompañamiento Pruebas Usuario e	12 días	96 horas	e 04/12/14	ie 19/12/14	411	Michael-Hac	100%	
413		8-Pruebas usuario experto II	10 días	80 horas	lun 05/01/15	vie 16/01/15	412	Katia Vargas	100%	
414		8-Acompañamiento Pruebas Usuario e	10 días	80 horas	lun 19/01/15	vie 30/01/15	413	Michael-Hac	100%	
415		8-Documentación	49,3 días	64 horas	n 02/02/15	ie 17/04/15			100%	
416		8-Manual técnico	45,3 días	32 horas	n 02/02/15	un 13/04/15			100%	
421		8-Manual	0 días	0 horas	n 13/04/15	un 13/04/15	420		100%	
422		8-Revisión por parte de hacienda	1 día	8 horas	n 13/04/15	ar 14/04/15	421	Randy-Hacie	100%	
423		8-Corrección y ajustes	1 día	8 horas	r 14/04/15	ié 15/04/15	422	Michael-Hac	100%	
424		8-Revisión por parte de hacienda I	1 día	8 horas	é 15/04/15	ue 16/04/15	423	Randy-Hacie	100%	
425		8-Corrección y ajustes II	1 día	8 horas	e 16/04/15	ie 17/04/15	424	Michael-Hac	100%	

20151021 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
426	✓	8-Aprobación producto	0 días	0 horas	e 30/01/15	vie 30/01/15	414	Katia Vargas	100%	
427	✓	P9: Conciliación bancaria	112 días	1.048 horas	mié 26/11/14	vie 22/05/15			100%	
428	✓	Análisis Producto 9	7,5 días	90 horas	mié 26/11/14	vie 05/12/14			100%	
429	✓	9-Creación de documento de análisis	3 días	36 horas	mié 26/11/14	vie 28/11/14		S-COM5 RR;DP-S-COM	100%	
430	✓	9-Revisión por parte de hacienda	2 días	16 horas	lun 01/12/14	mar 02/12/14	429	Michael-Hacie	100%	
431	✓	9-Ajustes S-COM	2 días	24 horas	mar 02/12/14	mié 03/12/14	429FC+1 día	S-COM5 RR;DP-S-COM	100%	
432	✓	9-Revisión por parte de hacienda II	1 día	8 horas	jue 04/12/14	jue 04/12/14	430;431	Michael-Hacie	100%	
433	✓	9-Ajustes S-COM II	4 horas	6 horas	vie 05/12/14	vie 05/12/14	432	S-COM5 RR;DP-S-COM	100%	
434	✓	9-Aprobación análisis	0 días	0 horas	vie 05/12/14	vie 05/12/14	432;433	Michael-Hacie	100%	
435	✓	Diseño Producto 9	9 días	90 horas	vie 05/12/14	jue 18/12/14			100%	
436	✓	9-Creación documento diseño	3 días	36 horas	vie 05/12/14	mié 10/12/14	434	S-COM5 RR;DP-S-COM	100%	
437	✓	9-Revisión por parte de hacienda de documento de diseño	2 días	16 horas	jue 11/12/14	vie 12/12/14	436	Michael-Hacie	100%	
438	✓	9-Ajustes Documento de diseño	2 días	24 horas	lun 15/12/14	mar 16/12/14	437	S-COM5 RR;DP-S-COM	100%	
439	✓	9-Revisión por parte de hacienda de documento de diseño II	1 día	8 horas	mié 17/12/14	mié 17/12/14	438	Michael-Hacie	100%	
440	✓	9-Ajustes Documento de diseño y prototipo II	4 horas	6 horas	jue 18/12/14	jue 18/12/14	439	S-COM5 RR;DP-S-COM	100%	
441	✓	9-Aprobación diseño	0 horas	0 horas	jue 18/12/14	jue 18/12/14	440	Michael-Hacie	100%	
442	✓	9-Elaborar plan de pruebas	5 días	40 horas	mar 05/05/15	lun 11/05/15	454	Katia Vargas	100%	
443	✓	Desarrollo Producto 9	31 días	292 horas	jue 18/12/14	vie 13/02/15			100%	



















20151021 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
444		9-Migración de proceso de conciliación bancaria, tanto masiva como diaria	3 días	24 horas	jue 18/12/14	mar 06/01/15	441	S-COM5 RR	100%	
445		9-Migración de Consulta de notas de débito y crédito	3 días	24 horas	mar 06/01/15	vie 09/01/15	444	S-COM5 RR	100%	
446		9-Migración de Consulta de declaraciones por nota	6 días	24 horas	jue 18/12/14	vie 09/01/15	441	DP-S-COM[50	100%	
447		9-Ajustes para integrar con acceso y roles de ATV	20 días	160 horas	vie 09/01/15	vie 06/02/15	445	S-COM5 RR	100%	
448		9-Pruebas Técnicas	5 días	60 horas	vie 06/02/15	vie 13/02/15	447;446	S-COM5 RR;DP-S-COM[100%	
449		Pruebas 9	64,5 días	428 horas	vie 13/02/15	vie 22/05/15			100%	
450		9-Preparación y Trasferencia de conocimiento	2 días	24 horas	vie 13/02/15	mar 17/02/15	448	S-COM5 RR;DP-S-COM[100%	
451		9-Pruebas TI Hacienda	8 días	64 horas	mar 17/02/15	vie 27/02/15	450	Michael-Hacie	100%	
452		9- Creacion de script de pruebas TI	0 días	0 horas	jue 26/02/15	jue 26/02/15	450	Michael-Hacie	100%	
453		9-Acompañamiento y ajustes	10 días	120 horas	jue 19/02/15	jue 05/03/15	450FC+2 días	S-COM5 RR;DP-S-COM[100%	
454		9-Presentación al usuario experto	1 día	8 horas	lun 04/05/15	lun 04/05/15	451;453	S-COM5 RR	100%	
455		9-Pruebas expertas	7 días	56 horas	mar 05/05/15	mié 13/05/15	454	Katia Vargas	100%	
456		9-Acompañamiento y ajustes	5 días	60 horas	jue 07/05/15	mié 13/05/15	454FC+2 días	S-COM5 RR;DP-S-COM[100%	
457		9- Pruebas expertas II	7 días	56 horas	jue 14/05/15	vie 22/05/15	456	Jose Antonio Madriz	100%	
458		9- Acompañamiento y ajustes II	5 días	40 horas	lun 18/05/15	vie 22/05/15	457CC+2 días	S-COM5 RR	100%	
459		Documentación 9	11 días	108 horas	mar 17/03/15	mié 08/04/15			100%	
460		Manual técnico 9	3 días	32 horas	mar 17/03/15	vie 20/03/15			100%	
461		9-Prerrequisitos	1 día	8 horas	mar 17/03/15	mié 18/03/15	456	S-COM1 AM	100%	




















20151021 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
462		9-Operación	1 día	8 horas	mié 18/03/15	jue 19/03/15	461	S-COM1 AM	100%	
463		9-BD	1 día	8 horas	jue 19/03/15	vie 20/03/15	462	S-COM1 AM	100%	
464		9-Otros	2 días	8 horas	mar 17/03/15	jue 19/03/15	456	DP-S-COM[50	100%	
465		9-Revisión por parte de hacienda	3 días	24 horas	vie 20/03/15	mié 25/03/15	464;463	Michael-Hacie	100%	
466		9-Corrección y ajustes	2 días	24 horas	mié 25/03/15	vie 27/03/15	465	S-COM5 RR;DP-S-COM[100%	
467		9-Revisión por parte de hacienda II	2 días	16 horas	vie 27/03/15	mar 07/04/15	466	Michael-Hacie	100%	
468		9-Corrección y ajustes II	1 día	12 horas	mar 07/04/15	mié 08/04/15	467	S-COM5 RR;DP-S-COM[100%	
469		9-Producto 9 aprobado	0 días	0 horas	vie 22/05/15	vie 22/05/15	458	Katia Vargas	100%	
470		P10: Formularios solidario	172 días	1.856 horas	lun 03/11/14	mié 22/07/15			100%	
471		Preformulario	117 días	624 horas	lun 03/11/14	mié 06/05/15			100%	
489		10-Formulario	152 días	1.232 horas	lun 01/12/14	mié 22/07/15			100%	
490		10- Analisis Formulario	10 días	80 horas	lun 01/12/14	vie 12/12/14		S-COM2 LU	100%	
491		10-Revision analisis formulario	2 días	16 horas	lun 15/12/14	mar 16/12/14	490	Randy-Hacienc	100%	
492		10-Ajustes analisis formulario	2 días	16 horas	mié 17/12/14	jue 18/12/14	491	S-COM2 LU	100%	
493		10-revision ajustes analisis formulario	1 día	8 horas	vie 19/12/14	vie 19/12/14	492	Randy-Hacienc	100%	
494		10- Diseño Formulario	13 días	104 horas	lun 05/01/15	mié 21/01/15	493	S-COM2 LU	100%	
495		10- Revision diseño Formulario	3 días	24 horas	jue 22/01/15	lun 26/01/15	494	Randy-Hacienc	100%	
496		10-Ajustes Diseño formulario	2 días	16 horas	mar 27/01/15	mié 28/01/15	495	S-COM2 LU	100%	
497		10- Revision ajustes formulario	1 día	8 horas	jue 29/01/15	jue 29/01/15	496	Randy-Hacienc	100%	
498		10- Desarrollo Formulario	56 días	448 horas	vie 30/01/15	vie 24/04/15			100%	













20151021 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	
										28/04
499		10- Crear formulario ISO	5 días	40 horas	vie 30/01/15	jue 05/02/15	497	S-COM2 LU	100%	
500		10-Mostrar formulario	7 días	56 horas	vie 06/02/15	lun 16/02/15	499	S-COM2 LU	100%	
501		10-Mostrar fincas registradas	7 días	56 horas	mar 17/02/15	mié 25/02/15	500	S-COM2 LU	100%	
502		10-Seleccionar fincas y periodo	5 días	40 horas	jue 26/02/15	mié 04/03/15	501	S-COM2 LU	100%	
503		10-Mostrar declaracion	5 días	40 horas	jue 05/03/15	mié 11/03/15	502	S-COM2 LU	100%	
504		10-Validar declaracion (DLL)	10 días	80 horas	jue 12/03/15	mié 25/03/15	503	S-COM2 LU	100%	
505		10-Guardar datos formulario en BD	5 días	40 horas	jue 26/03/15	mié 08/04/15	504	S-COM2 LU	100%	
506		10-Pruebas técnicas	12 días	96 horas	jue 09/04/15	vie 24/04/15	505	S-COM2 LU	100%	
507		Pruebas usuario	56 días	400 horas	lun 27/04/15	mar 14/07/15			100%	
514		10-Documentación	62 días	112 horas	lun 27/04/15	mié 22/07/15			100%	
525		10-Aprobación producto	0 días	0 horas	mar 14/07/15	mar 14/07/15	513	Lorena Lopez	100%	
526		P11: Planillas	126 días	960 horas	mié 12/11/14	jue 28/05/15			100%	
527		Análisis Producto 11	15 días	120 horas	mié 12/11/14	mar 02/12/14			100%	
534		Diseño Producto 11	17 días	136 horas	mié 03/12/14	jue 08/01/15			100%	
541		11-Elaborar plan de pruebas	1 sem	40 horas	mar 05/05/15	lun 11/05/15	549	Jose Antonio Madriz	100%	
542		Desarrollo Producto 11	35 días	280 horas	mié 21/01/15	mar 10/03/15			100%	
546		Pruebas 11	71 días	272 horas	mié 11/02/15	jue 28/05/15			100%	
547		11-Preparación y Trasferencia de conocimiento	3 días	24 horas	mié 11/02/15	vie 13/02/15	543	Kendall-Hacier	100%	
548		11-Pruebas TI Hacienda	2 sem.	80 horas	lun 16/02/15	vie 27/02/15	547	Miguel-Hacien	100%	
549		11-Presentación al usuario experto	1 día	8 horas	lun 04/05/15	lun 04/05/15		Kendall-Hacier	100%	



20151021 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
550		11-Pruebas expertas	2 sem.	80 horas	vie 15/05/15	jue 28/05/15	549FC+8 día	Katia Vargas	100%	
551		11-Acompañamiento y ajustes	2 sem.	80 horas	mar 05/05/15	lun 18/05/15	549	Kendall-Hacier	100%	
552		Documentación 11	14 días	112 horas	mar 17/03/15	vie 10/04/15			100%	
553		Manual técnico 11	8 días	64 horas	mar 17/03/15	jue 26/03/15			100%	
554		Prerrequisitos 11	1 día	8 horas	mar 17/03/15	mar 17/03/15	551	Kendall-Hacier	100%	
555		Operación 11	2 días	16 horas	mié 18/03/15	jue 19/03/15	554	Kendall-Hacier	100%	
556		BD 11	2 días	16 horas	vie 20/03/15	lun 23/03/15	555	Kendall-Hacier	100%	
557		Otros 11	3 días	24 horas	mar 24/03/15	jue 26/03/15	556	Kendall-Hacier	100%	
558		Manual de usuario 11	2 días	16 horas	vie 27/03/15	lun 06/04/15	557	Kendall-Hacier	100%	
559		Revisión por parte de hacienda 11	1 día	8 horas	mar 07/04/15	mar 07/04/15	558	Miguel-Hacier	100%	
560		Corrección y ajustes 11	1 día	8 horas	mié 08/04/15	mié 08/04/15	559	Kendall-Hacier	100%	
561		Revisión por parte de hacienda II 11	1 día	8 horas	jue 09/04/15	jue 09/04/15	560	Miguel-Hacier	100%	
562		Corrección y ajustes II 11	1 día	8 horas	vie 10/04/15	vie 10/04/15	561	Kendall-Hacier	100%	
563		11-Producto aprobado	0 días	0 horas	lun 18/05/15	lun 18/05/15	551	Katia Vargas;Merced Rapso	100%	
564		P13: Procesos	120 días	1.120 horas	lun 17/11/14	lun 25/05/15			100%	
565		Análisis Producto 13	11 días	96 horas	lun 17/11/14	lun 01/12/14			100%	
572		Diseño Producto 13	17 días	136 horas	mar 02/12/14	mié 07/01/15			100%	
579		13-Elaborar plan de pruebas	1 sem	40 horas	mié 06/05/15	mar 12/05/15	589	Jose Antonio Madriz	100%	
580		Desarrollo Producto 13	53,6 días	400 horas	lun 08/12/14	jue 05/03/15			100%	

20151021 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
581		13-Cargar deudas calculadas por la administración	6 sem.	240 horas	lun 08/12/14	jue 05/02/15	578	Yeudin-Hacien	100%	
582		13-Procesar pagos por otros medios	3 sem.	120 horas	vie 06/02/15	jue 26/02/15	581	S-COM5 RR	100%	
583		13-Integrar montos recaudados Web-Estadísticas	0 días	0 horas	lun 05/01/15	lun 05/01/15			100%	
584		Pruebas técnicas	1 sem	40 horas	vie 27/02/15	jue 05/03/15	581;582	Yeudin-Hacien	100%	
585		Pruebas 13	47 días	336 horas	vie 06/03/15	mar 19/05/15			100%	
586		13-Preparación y Tránsito de conocimiento	1 día	8 horas	vie 06/03/15	vie 06/03/15	584	Yeudin-Hacien	100%	
587		13-Pruebas TI Hacienda	2 sem.	80 horas	lun 09/03/15	vie 20/03/15	586	Luis F. Coronado	100%	
588		13-Acompañamiento y ajustes	2 sem.	80 horas	lun 09/03/15	vie 20/03/15	586	Yeudin-Hacien	100%	
589		13-Presentación al usuario experto	1 día	8 horas	mar 05/05/15	mar 05/05/15		Yeudin-Hacien	100%	
590		13-Pruebas expertas	2 sem.	80 horas	mié 06/05/15	mié mar 19/05/15	589	Jose Antonio Madriz	100%	
591		13-Acompañamiento y ajustes	2 sem.	80 horas	mié 06/05/15	mié mar 19/05/15	589	Yeudin-Hacien	100%	
592		Documentación 13	14 días	112 horas	mié 06/05/15	lun 25/05/15			100%	
593		Manual técnico 13	8 días	64 horas	mié 06/05/15	vie 15/05/15			100%	
594		Prerrequisitos 13	1 día	8 horas	mié 06/05/15	mié 06/05/15	589	Yeudin-Hacien	100%	
595		Operación 13	2 días	16 horas	jue 07/05/15	vie 08/05/15	594	Yeudin-Hacien	100%	
596		BD 13	2 días	16 horas	lun 11/05/15	mar 12/05/15	595	Yeudin-Hacien	100%	
597		Otros 13	3 días	24 horas	mié 13/05/15	vie 15/05/15	596	Yeudin-Hacien	100%	
598		Manual de usuario 13	2 días	16 horas	lun 18/05/15	mar 19/05/15	597	Yeudin-Hacien	100%	


20151021 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
599		Revisión por parte de hacienda 13	1 día 8 horas		mié 20/05/15	mié 20/05/15	598	Luis F. Coronado	100%	
600		Corrección y ajustes 13	1 día 8 horas		jue 21/05/15	jue 21/05/15	599	Yeudin-Hacien	100%	
601		Revisión por parte de hacienda II 13	1 día 8 horas		vie 22/05/15	vie 22/05/15	600	Luis F. Coronado	100%	
602		Corrección y ajustes II 13	1 día 8 horas		lun 25/05/15	lun 25/05/15	601	Yeudin-Hacien	100%	
603		13-Producto 13 aprobado	0 días 0 horas		lun 25/05/15	lun 25/05/15	602		100%	
604		P14: Migración de datos (desarrollo y pruebas)	117 días 1.512,8 horas		mar 16/12/14	jue 18/06/15			100%	
605		14 Elaboración de plan de migración	10 días 640 horas		mar 16/12/14	lun 12/01/15		BD-hacienda;E F. Coronado;Mer	100%	
606		14: Analisis	5 días 44 horas		mar 13/01/15	lun 19/01/15	605;272	Randy-Hacien Rapso;S-COM	100%	
607		14: Revision Analisis	2 días 19,2 horas		mar 20/01/15	mié 21/01/15	606	Adriana-Hacien F. Coronado;Mer Rapso	100%	
608		14:Diseño	2 días 32 horas		jue 22/01/15	vie 23/01/15	607	Adriana-Hacien RO	100%	
609		14: Revision Diseño	2 días 41,6 horas		jue 29/01/15	vie 30/01/15	608	Adriana-Hacien F. Coronado;Mer Rapso	100%	
610		14: Desarrollo	31 días 520 horas		lun 02/02/15	lun 16/03/15			100%	
620		14: Pruebas Técnicas	8 días 64 horas		mar 17/03/15	jue 26/03/15	617	Adriana-Hacien	100%	
621		14: Pruebas ciclo I del usuario	4 días 32 horas		vie 27/03/15	mié 08/04/15	620	Katia Vargas	100%	
622		14 Acompañamiento	0 sem. 0 horas		mar 17/03/15	mar 17/03/15	620CC	DP-S-COM[25	100%	

20151021 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
623		14. Pruebas ciclo II del usuario	4 días	0 horas	lun 15/06/15	jue 18/06/15			100%	
624		14 Migración de datos	3 días	120 horas	mié 15/04/15	vie 17/04/15	621	BD-hacienda;k Vargas;Luis F.	100%	
625		14 Finaliza Migracion (desarrollo y pruebas)	0 días	0 horas	vie 17/04/15	vie 17/04/15	624	DP-S-COM;Kat Vargas;Luis F. Coronado;Mer Rapso	100%	
626		P14.0 Instalación ambiente de calidad	32,94 días	347,9 horas	vie 23/01/15	mar 10/03/15			100%	
627		14.0 Configuración de servidores físicos	12 días	128 horas	vie 23/01/15	lun 09/02/15			100%	
628		14.0 Respaldo de configuración de tarjetas de red	4 días	32 horas	vie 23/01/15	mié 28/01/15		Johnny Herrera	100%	
629		14.0 Revisión del almacenamiento (despresentar y presentar nuevos	1 día	8 horas	jue 29/01/15	jue 29/01/15	628	Johnny Herrera	100%	
630		14.0 Eliminar cluster existente	1 día	8 horas	vie 30/01/15	vie 30/01/15	629	Johnny Herrera	100%	
631		14.0 Sacar equipo del dominio	1 día	8 horas	vie 30/01/15	vie 30/01/15	629	Fabiola León	100%	
632		14.0 Formateo e instalación de equipos	2 días	16 horas	lun 02/02/15	mar 03/02/15	631	Johnny Herrera	100%	
633		14.0 Ejecutar actualizaciones del equipo (firmware y S.O.)	2 días	16 horas	lun 02/02/15	mar 03/02/15	631	Fabiola León	100%	
634		14.0 Instalación de roles y características a nivel de SO	1 día	8 horas	mié 04/02/15	mié 04/02/15	633	Johnny Herrera	100%	
635		14.0 Configuración de tarjetas de red	3 días	24 horas	jue 05/02/15	lun 09/02/15	634	Johnny Herrera	100%	
636		14.0 Incluir equipo al dominio	1 día	8 horas	vie 06/02/15	vie 06/02/15	635CC+1 día	Johnny Herrera	100%	
637		14.0 Configuración de servidores físicos aprobada	0 días	0 horas	lun 09/02/15	lun 09/02/15	635		100%	
638		14.0 Creación y configuración de ambiente de virtualización	5,5 días	52,4 horas	mar 10/02/15	mar 17/02/15			100%	














20151021 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
639		14.0 Instalación y definición de equipo virtual base	1 día	8 horas	mar 10/02/15	mar 10/02/15	637	Johnny Herrera	100%	
640		14.0 Configuración de tarjetas de red	0,5 días	4 horas	mié 11/02/15	mié 11/02/15	639	Johnny Herrera	100%	
641		14.0 Ejecutar actualizaciones del equipo (firmware y SO)	1 día	8 horas	mié 11/02/15	jue 12/02/15	640	Johnny Herrera	100%	
642		14.0 Instalación de roles y características a nivel de SO	1 día	8 horas	jue 12/02/15	vie 13/02/15	641	Johnny Herrera	100%	
643		14.0 Incluir equipo al dominio	1 día	0,4 horas	vie 13/02/15	lun 16/02/15	642	Johnny Herrera	100%	
644		14.0 Solicitud y creación de políticas y permisos	2 días	16 horas	vie 13/02/15	mar 17/02/15	642	Johnny Herrera[5%];P Vargas[95%]	100%	
645		14.0 Solicitud y apertura de puertos	1 día	8 horas	vie 13/02/15	lun 16/02/15	642	Johnny Herrera[5%];P Vargas[95%]	100%	
646		14.0 Ambiente virtual aprobado	0 días	0 horas	lun 16/02/15	lun 16/02/15	645		100%	
647		14.0 Instalación de base de datos	9,44 días	67,5 horas	lun 16/02/15	vie 27/02/15			100%	
648		14.0 Recopilar características actuales de la Instancia y Base de datos de desarrollo	1,44 días	11,5 horas	lun 16/02/15	mar 17/02/15			100%	
649	 	14.0 Copiar medios de instalación en el servidor destino	3 horas	3 horas	lun 16/02/15	lun 16/02/15	646	Carlos Hernandez	100%	
650	 	14.0 Enviar correo para solicitar características que deben ser	30 mins	0,5 horas	lun 16/02/15	lun 16/02/15	649	Carlos Hernandez	100%	
651	 	14.0 Ejecutar Herramienta Upgrade Advisor para verificar compatibilidad	1 día	8 horas	lun 16/02/15	mar 17/02/15	650	Carlos Hernandez	100%	
652	 	14.0 Instalar Instancia Standalone	5,25 días	42 horas	mar 17/02/15	mié 25/02/15			100%	
653	 	14.0 Solicitar los permisos del AD a los usuarios de instalación y servicio	2 días	16 horas	mar 17/02/15	jue 19/02/15	651	Carlos Hernandez	100%	

20151021 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
654		14.0 Definir el nombre de instancia (Según estándar)	30 mins	0,5 horas	jue 19/02/15	jue 19/02/15	653	Carlos Hernandez	100%	
655		14.0 Instalar SQL Server 2014 y las características inventariadas y aplicar	2 días	16 horas	vie 20/02/15	lun 23/02/15	654	Carlos Hernandez	100%	
656		14.0 Configuración inicial de la memoria de la instancia	30 mins	0,5 horas	mar 24/02/15	mar 24/02/15	655	Carlos Hernandez	100%	
657		14.0 Configurar características particulares de la instancia	1 día	8 horas	mar 24/02/15	mié 25/02/15	656	Carlos Hernandez	100%	
658		14.0 Configurar nuevo puerto de escucha para la instancia	30 mins	0,5 horas	mié 25/02/15	mié 25/02/15	657	Carlos Hernandez	100%	
659		14.0 Verificar inicio y detención de servicios en sus distintas formas	30 mins	0,5 horas	mié 25/02/15	mié 25/02/15	658	Carlos Hernandez	100%	
660		14.0 Ejecutar todas las tareas a realizar de acuerdo al análisis de	0 días	0 horas	mié 25/02/15	mié 25/02/15	659	Carlos Hernandez	100%	
661		14.0 Migración de (Base de) Datos	1,75 días	14 horas	mié 25/02/15	jue 26/02/15			100%	
662		14.0 Realizar respaldo de la(s) BD del ambiente de pruebas funcionales	1 hora	1 hora	mié 25/02/15	mié 25/02/15	660	Carlos Hernandez	100%	
663		14.0 Restaurar la BD en el nuevo servidor	1 hora	1 hora	mié 25/02/15	mié 25/02/15	662	Carlos Hernandez	100%	
664		14.0 Migrar y ajustar Jobs (si aplica)	0 horas	0 horas	mié 25/02/15	mié 25/02/15	663	Carlos Hernandez	100%	
665		14.0 Migrar y ajustar DTS (Si aplica)	0 días	0 horas	mié 25/02/15	mié 25/02/15	664	Carlos Hernandez	100%	
666		14.0 Ajustar SP si tienen la instancia anterior hardcoded (si aplica)	0 días	0 horas	mié 25/02/15	mié 25/02/15	665	Carlos Hernandez	100%	
667		14.0 Ajustar el firewall	3 horas	3 horas	mié 25/02/15	mié 25/02/15	666	Carlos Hernandez	100%	
668		14.0 Validar las propiedades de: Recovery Model (Full) y Compatibility	30 mins	0,5 horas	mié 25/02/15	mié 25/02/15	667	Carlos Hernandez	100%	
669		14.0 Ajustar de usuarios de conexión y base de datos	4 horas	4 horas	mié 25/02/15	jue 26/02/15	668	Carlos Hernandez	100%	













20151021 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
670		14.0 Validar usuarios, accesos y roles	4 horas	4 horas	jue 26/02/15	jue 26/02/15	669	Carlos Hernandez	100%	
671		14.0 Asegurarse de que no existan usuarios que no deben estar. El rol de	30 mins	0,5 horas	jue 26/02/15	jue 26/02/15	670	Carlos Hernandez	100%	
672		14.0 Vaciar el Primary	0 días	0 horas	jue 26/02/15	jue 26/02/15	671	Carlos Hernandez	100%	
673		14.0 Base de datos calidad instalada	0 días	0 horas	vie 27/02/15	vie 27/02/15	672		100%	
674		14.0 Instalación de aplicaciones Web	3 días	24 horas	vie 27/02/15	mié 04/03/15	673	Luis F. Coronado	100%	
675		14.0 Pruebas de conexión entre capas	3 días	60 horas	mié 04/03/15	lun 09/03/15	674	Luis F. Coronado[50%] Hernandez;Joh Herrera	100%	
676		14.0 Publicación del sitio web	1 día	16 horas	lun 09/03/15	mar 10/03/15	675	Carlos Hernandez;Lui F. Coronado	100%	
677		14.0 Aprobación del ambiente y aplicaciones, calidad	0 días	0 horas	mar 10/03/15	mar 10/03/15	676	Mercedes Rapso	100%	
678		P14.1 Pruebas integrales	50 días	912 horas	mar 19/05/15	jun 27/07/15			100%	
679		Pruebas de integración I ciclo	24 días	464 horas	mar 19/05/15	vie 19/06/15			100%	
680		14.1 Elaboración de plan de pruebas	4 días	32 horas	mar 19/05/15	vie 22/05/15	551	Katia Vargas	100%	
681		14.1 Preparación de los datos	4 días	32 horas	lun 25/05/15	jue 28/05/15	680	Katia Vargas[25%];C Hernandez[25%] F.	100%	
682		14.1 Pruebas	3 sem.	360 horas	lun 25/05/15	vie 12/06/15	625;458;551	Katia Vargas;Isabel Delgado;Jose Antonio Madriz	100%	














20151021 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
683		14.1 Acompañamiento y ajustes	1 sem	40 horas	lun 15/06/15	vie 19/06/15	681;682	S-COM4 PO	100%	
684		14.1 Finalizacion I ciclo de pruebas	0 días	0 horas	vie 19/06/15	vie 19/06/15	683	Katia Vargas	100%	
685		Pruebas de integración II ciclo	26 días	448 horas	lun 22/06/15	lun 27/07/15			100%	
686		14.1 Elaboración de plan de pruebas II	3 días	24 horas	lun 22/06/15	mié 24/06/15	684	Katia Vargas	100%	
687		14.1 Preparación de los datos II	3 días	24 horas	jue 25/06/15	lun 29/06/15	686	Katia Vargas[25%];C Hernandez[25%] F.	100%	
688		14.1 Pruebas II	3 sem.	360 horas	mar 30/06/15	lun 20/07/15	687	Katia Vargas;Isabel Delgado;Jose Antonio Madriz	100%	
689		14.1 Acompañamiento y ajustes II	1 sem	40 horas	mar 21/07/15	lun 27/07/15	688	S-COM4 PO	100%	
690		14.1 Finalizacion II ciclo de pruebas	0 días	0 horas	lun 27/07/15	lun 27/07/15	689	Katia Vargas	100%	
691		P14.1.1 Manual de usuario aplicación Web y adm	5 días	80 horas	mar 28/07/15	lun 03/08/15			100%	
692		Manual de usuario sitio web del contribuyente	1 sem	40 horas	mar 28/07/15	lun 03/08/15	690	Jenny Zeledon[50%]; Vargas[50%]	100%	
693		Manual de usuario sitio administrativo, opciones para el usuario experto	1 sem	40 horas	mar 28/07/15	lun 03/08/15	690	Katia Vargas[50%];J Zeledon[50%]	100%	
694		P14.2 Pruebas de Estrés	96 días	448 horas	mar 17/03/15	mié 05/08/15			100%	
695		14.2 Comprobar herramientas automatizadas	10 días	80 horas	mar 17/03/15	lun 06/04/15	680CC	Luis F. Coronado[50%] Rapso[50%]	100%	

20151021 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
696	 	14.2 Determinar escenarios	5 días	40 horas	mar 07/04/15	lun 13/04/15	695	Luis F. Coronado[50%] Rapso[50%]	100%	
697		14.2 Crear archivos de datos según escenarios	4 días	32 horas	mar 14/04/15	vie 17/04/15	696	Luis F. Coronado[50%] Rapso[50%]	100%	
698		14.2 Crear scripts de pruebas	5 días	40 horas	lun 20/04/15	vie 24/04/15	697	Luis F. Coronado[50%] Rapso[50%]	100%	
699		14.2 Prueba de estrés ciclo I	12 días	104 horas	lun 15/06/15	mar 30/06/15			100%	
700		14.2 Obtener estado de BD I	1 día	8 horas	lun 15/06/15	lun 15/06/15	683CC	Carlos Hernandez	100%	
701		14.2 Ejecutar prueba ciclo I	1 día	8 horas	mar 16/06/15	mar 16/06/15	700	Luis F. Coronado[50%] Rapso[50%]	100%	
702		14.2 Monitoreo de red I	1 día	8 horas	mar 16/06/15	mar 16/06/15	701CC	Marie C. Herrera	100%	
703		14.2 Monitoreo de base de datos I	1 día	8 horas	mar 16/06/15	mar 16/06/15	701CC	Carlos Hernandez	100%	
704		14.2 Monitoreo de servidores I	1 día	8 horas	mar 16/06/15	mar 16/06/15	701CC	Johnny Herrera	100%	
705		14.2 Revision de resultados I	1 sem	32 horas	mié 17/06/15	mar 23/06/15	701	Carlos Hernandez[20%] Herrera[20%]; F. Coronado[20%]	100%	
706		14.2 Correcciones I	1 sem	32 horas	mié 24/06/15	mar 30/06/15	705	Carlos Hernandez[20%] Herrera[20%]; F. Coronado[20%]	100%	














20151021 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	
										28/04
707		14.2 Actualizar script de pruebas	3 días	24 horas	mié 01/07/15	vie 03/07/15	706	Carlos Hernandez[50%] Rapso[50%]	100%	
708		14.2 Actualizar archivos de datos	3 días	24 horas	lun 06/07/15	mié 08/07/15	707	Carlos Hernandez[50%] Rapso[50%]	100%	
709		14.2 Pruebas de estrés ciclo II	12 días	104 horas	mar 21/07/15	mié 05/08/15			100%	
710		14.2 Obtener estado de BD II	1 día	8 horas	mar 21/07/15	mar 21/07/15	689CC	Carlos Hernandez	100%	
711		14.2 Ejecutar prueba ciclo II	1 día	8 horas	mié 22/07/15	mié 22/07/15	710	Luis F. Coronado[50%] Rapso[50%]	100%	
712		14.2 Monitoreo de red II	1 día	8 horas	mié 22/07/15	mié 22/07/15	711CC	Marie C. Herrera	100%	
713		14.2 Monitoreo de base de datos II	1 día	8 horas	mié 22/07/15	mié 22/07/15	711CC	Carlos Hernandez	100%	
714		14.2 Monitoreo de servidores II	1 día	8 horas	mié 22/07/15	mié 22/07/15	711CC	Johnny Herrera	100%	
715		14.2 Revision de resultados II	1 sem	32 horas	jue 23/07/15	mié 29/07/15	711	Carlos Hernandez[20%] Herrera[20%]; F. Coronado[20%]	100%	
716		14.2 Correcciones II	1 sem	32 horas	jue 30/07/15	mié 05/08/15	715	Carlos Hernandez[20%] Herrera[20%]; F. Coronado[20%]	100%	
717		<i>14.2 Pruebas de estrés aprobadas</i>	<i>0 días</i>	<i>0 horas</i>	<i>mié 05/08/15</i>	<i>mié 05/08/15</i>	<i>716</i>		<i>100%</i>	
718		P18: Documentación de sistemas de información	11 días	72 horas	mar 28/07/15	mar 11/08/15			100%	











20151021 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
719		Manual de instalación	2 días	0 horas	mar 28/07/15	mié 29/07/15	690		100%	
720		Manual de operación	2 días	0 horas	jue 30/07/15	vie 31/07/15	719		100%	
721		Consolidación de toda la documentación	1 sem	40 horas	lun 03/08/15	vie 07/08/15	720	S-COM2 LU	100%	
722		Revisión de la documentación	2 días	32 horas	lun 10/08/15	mar 11/08/15	721	Luis F. Coronado;Mer Rapso	100%	
723		Aprobación de la documentación	0 días	0 horas	mar 11/08/15	mar 11/08/15	722	Luis F. Coronado;Mer Rapso	100%	
724		P15: Instalación ambiente de producción y aplicaciones	43,94 días	1.081 horas	lun 06/07/15	jue 03/09/15			100%	
725		Configuración de servidores físicos (Formateo e instalación de equipos para BD)	4 días	32 horas	lun 06/07/15	jue 09/07/15		Johnny Herrera	100%	
726		Creación y configuración de ambiente de virtualización	16 días	272 horas	lun 06/07/15	lun 27/07/15			100%	
727		Asignar almacenamiento para virtuales y para BD	5 días	80 horas	lun 06/07/15	vie 10/07/15	725CC	Fabiola León;Diego Gómez	100%	
728		Asignar perfiles de red a servidores	2 días	32 horas	lun 13/07/15	mar 14/07/15	727	Jorge Umañan;Wenc Rodriguez	100%	
729		Agregar nombres de hosts al AD y DNS's	2 días	16 horas	mié 15/07/15	jue 16/07/15	728	Pablo Vargas	100%	
730		Crear los closters de VmWare	2 días	32 horas	mié 15/07/15	jue 16/07/15	728	Jorge Umañan;Wenc Rodriguez	100%	
731		Definición de alias y zonas	2 días	32 horas	vie 17/07/15	lun 20/07/15	730	Fabiola León;Diego Gómez	100%	












20151021 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
732		Creación de plantillas para las capas web y aplicativos	2 días	32 horas	mar 21/07/15	mié 22/07/15	731	Jorge Umañan;Wen Rodriguez	100%	
733		Creación de OU's	2 días	16 horas	jue 23/07/15	vie 24/07/15	732	Pablo Vargas	100%	
734		Asignación de Ips	2 días	0 horas	jue 23/07/15	vie 24/07/15	732		100%	
735		Crear servidores web y aplicativos	2 días	16 horas	jue 23/07/15	vie 24/07/15	732	Diego Gómez	100%	
736		Incluir equipos al dominio	1 día	8 horas	lun 27/07/15	lun 27/07/15	735	Pablo Vargas	100%	
737		Agregar permisos, apertura de puertos	1 día	8 horas	lun 27/07/15	lun 27/07/15	735	Johnny Herrera	100%	
738		Instalación de base de datos	34,94 días	613 horas	mar 14/07/15	lun 31/08/15			100%	
739		Requerimientos para preparación de nueva instalación: instancia y base de datos SQL Server	10,63 días	182 horas	mar 14/07/15	mar 28/07/15			100%	
740		Validar información sobre los servicios de bases de datos que requiere el negocio que se instalen y algún otro componente en particular 0.5 days	4 horas	8 horas	jue 16/07/15	jue 16/07/15	737FC-8 días	Carlos Hernandez;Me Rapso	100%	
741		Definir según los requerimientos de negocio, las necesidades de equipo 0.5 days	4 horas	8 horas	jue 16/07/15	jue 16/07/15	740CC	Carlos Hernandez;Me Rapso	100%	
742	 	Definir según los requerimientos de servicios a instalar, las cuentas, usuarios y políticas requeridas para c/u	3 horas	6 horas	jue 16/07/15	jue 16/07/15	741	Carlos Hernandez;Me Rapso	100%	
743		Validar información sobre la configuración de la instancia a ser instalada: seguridad, modo recuperación, collection, procesos de carga, migración de datos	4 horas	8 horas	jue 16/07/15	vie 17/07/15	742	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	100%	

20151021 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
744	 	Validar alcance de las pruebas a realizar en ambiente de producción	4 horas	8 horas	jue 16/07/15	vie 17/07/15	742	Carlos Hernandez;Me Rapso	100%	
745	 	Revisar instancia y base de datos actual (calidad, homologación) para inventariar su condición, características, objetos, componentes de jobs, paquetes, migraciones datos, pr... 1 day	1 día	24 horas	vie 17/07/15	lun 20/07/15	744	Carlos Hernandez;Flo Espinoza;Merc Rapso	100%	
746	 	Definir distribución de recursos de nuevos equipos de base de datos	4 horas	8 horas	mar 14/07/15	mar 14/07/15	737FC-10 días	Carlos Hernandez;Jof Herrera	100%	
747		Definir configuración de la nueva instancia según la información validada	1 hora	2 horas	lun 20/07/15	lun 20/07/15	745	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	100%	
748		Definir: nombres de instancias, bases de datos, cluster SQL Serve. Dirección IP, puerto SQL, 0.5 days	3 horas	6 horas	lun 20/07/15	lun 20/07/15	747	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	100%	
749		Generar documentación con el detalle de los recursos requeridos para el equipo: servidores, almacenamiento, memoria, procesadores, servicios, usuarios, políticas, etc 2 days	2 días	32 horas	lun 20/07/15	mié 22/07/15	748	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	100%	
750		Generar documentación con el detalle de la configuración de la instancia y la base de datos: seguridad, modo recuperación, collection, filegroups, datafiles, distribución de almacenamiento, etc 2 days	6 horas	12 horas	mié 22/07/15	jue 23/07/15	749	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	100%	














20151021 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	
751	 	Generar la documentación de la instancia y base de datos actual (calidad, homologación) para inventar su condición, características, objetos, componentes de jobs 2 days	6 horas	12 horas	mié 22/07/15	jue 23/07/15	750CC	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	100%	28/04
752		Generar detalle de la instancia y base de datos actual para definir lo necesario para la nueva instancia 2 days	0 horas	0 horas	jue 23/07/15	jue 23/07/15	751	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	100%	
753	 	Enviar solicitudes a diferentes unidades para instalar agentes de: antivirus, respaldos, scom, entre otros 1 day	1 día	16 horas	jue 23/07/15	vie 24/07/15	752	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	100%	
754		Generar documento final con toda la información recopilada, validada y definida 3 days	1 día	16 horas	vie 24/07/15	lun 27/07/15	753	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	100%	
755		Desarrollar plan de implementación de instancia, bases de datos según información del documento generado 2 days	1 día	16 horas	lun 27/07/15	mar 28/07/15	754	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	100%	
756		Requerimientos para preparación de servidores	2 días	24 horas	mar 28/07/15	jue 30/07/15			100%	
757	 	Definir y enviar requerimientos de almacenamiento a la UAS	1 día	8 horas	mar 28/07/15	mié 29/07/15	755	Carlos Hernandez	100%	
758		Definir y enviar requerimiento de respaldos a la Unidad correspondiente (UAS, UGOT) 1 day	0 días	0 horas	mar 28/07/15	mar 28/07/15	757CC	Carlos Hernandez	100%	
759		Definir y enviar requerimiento de almacenamiento SWAP a la UAS 1 day	0 días	0 horas	mar 28/07/15	mar 28/07/15	757CC	Carlos Hernandez	100%	











20151021 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
760	 	Definir y enviar requerimiento de cuentas de servicio de SQL Server, respaldos y políticas requeridas a la UAS 1 day	0 días	0 horas	mar 28/07/15	mar 28/07/15	757CC	Carlos Hernandez	100%	
761		Definir y enviar requerimiento de instalación y configuración de agentes para el antivirus, scom y respaldos 1 day	0 días	0 horas	mar 28/07/15	mar 28/07/15	757CC	Carlos Hernandez	100%	
762	 	Definir y enviar requerimiento de firewall a la UAS y la UGRC 1 day	1 día	16 horas	mié 29/07/15	jue 30/07/15	757	Carlos Hernandez;Jof Herrera	100%	
763		Instalar y configurar Instancia de BD	20,31 días	361 horas	jue 30/07/15	jue 27/08/15			100%	
764		Copiar medios de instalación en cada uno de los nodos del cluster a instalar 1 day	4 horas	8 horas	jue 30/07/15	vie 31/07/15	762	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	100%	
765		Realizar Pruebas de Failover del cluster de windows 0.5 days	2 horas	4 horas	jue 30/07/15	jue 30/07/15	764CC	Carlos Hernandez;Jof Herrera	100%	
766		Mover todos los recursos al nodo A 0.1 days	30 mins	1 hora	jue 30/07/15	jue 30/07/15	765	Carlos Hernandez;Jof Herrera	100%	
767		Instalar el nodo A del cluster para la Instancia 1, tomando en consideración el plan y definiciones para la instancia 1 day	1 día	16 horas	jue 30/07/15	vie 31/07/15	766	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	100%	
768		Repetir los 2 puntos anteriores tantas veces como nodos tenga el cluster 5 days	2 días	32 horas	vie 31/07/15	mar 04/08/15	767	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	100%	
769		Instalar instancia para réplica (si aplica) 3 days	1 día	16 horas	mar 04/08/15	mié 05/08/15	768	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	100%	


20151021 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
770		Instalar servicios de SQL Server que no son Clusterizados si aplica 3 days	1 día	16 horas	mié 05/08/15	jue 06/08/15	769	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	100%	
771		Validar configuración de la instancia RPT y realizar los ajustes necesarios 2 days	1 día	16 horas	jue 06/08/15	vie 07/08/15	770	Carlos Hernandez;Jof Herrera	100%	
772		Probar la funcionalidad de los servicios: failover, detención, reinicio, cuentas correctas, etc	2 horas	4 horas	vie 07/08/15	lun 10/08/15	771	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	100%	
773		Ajustar el firewall (UAS)	0 días	0 horas	lun 10/08/15	lun 10/08/15	772	Carlos Hernandez;Jof Herrera	100%	
774		Probar y ajustar firewall hasta que funcione correctamente	0 horas	0 horas	lun 10/08/15	lun 10/08/15	773	Carlos Hernandez;Jof Herrera	100%	
775	 	Instalar o restaurar las bases de datos en cada instancia	4 horas	8 horas	lun 10/08/15	lun 10/08/15	772	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	100%	
776		Generar y guardar los scripts	4 horas	8 horas	lun 10/08/15	mar 11/08/15	775	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	100%	
777		Validar y ajustar las propiedades de las bases de datos	2 horas	4 horas	mar 11/08/15	mar 11/08/15	776	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	100%	
778		Realizar ajustes de primary, filegroups, datafiles, tempdb según plan de implementación	1 día	16 horas	mar 11/08/15	mié 12/08/15	777	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	100%	
779	 	Ejecutar proceso de migración de datos de TD@ desde 2011 a la fecha	3 días	48 horas	mié 12/08/15	lun 17/08/15	778	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	100%	
780		Crear los roles de usuario en las bases de datos	4 horas	8 horas	lun 17/08/15	lun 17/08/15	779	Carlos Hernandez;Me Rapso	100%	

20151021 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	
										28/04
781		Crear los usuarios que deben conectarse a cada base de datos	4 horas	8 horas	lun 17/08/15	lun 17/08/15	780CC	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	100%	
782		Validar y ajustar usuarios de conexión entre aplicaciones y base de datos	1 día	16 horas	lun 17/08/15	mar 18/08/15	781	Carlos Hernandez;Me Rapso	100%	
783		Validar usuarios, accesos, roles, y depurarlos	1 día	16 horas	mar 18/08/15	mié 19/08/15	782	Carlos Hernandez;Me Rapso	100%	
784		Cambio de contraseña	4 horas	8 horas	mar 18/08/15	mié 19/08/15	783CC	Diego Gómez;Flory Espinoza	100%	
785		Verificar antivirus, respaldos y scom, que estén activos y funcionando correctamente	4 horas	8 horas	mié 19/08/15	mié 19/08/15	784	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	100%	
786		Realizar pruebas de respaldo, restauraciones, incluyendo planes de mantenimiento	4 horas	4 horas	mié 19/08/15	mié 19/08/15	785CC	Carlos Hernandez	100%	
787		Validar conectividad de usuario con aplicación: Reporting, cargas, aplicación	2 días	32 horas	mié 19/08/15	vie 21/08/15	786	Carlos Hernandez;Me Rapso	100%	
788		Configurar Always ON, según plan de mantenimiento	4 días	64 horas	vie 21/08/15	jue 27/08/15	787	Carlos Hernandez;Joh Herrera	100%	
789		Mejoras en los datos	2 días	46 horas	jue 27/08/15	lun 31/08/15			100%	
790		Defragmentar índices	2 horas	4 horas	jue 27/08/15	vie 28/08/15	788	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	100%	
791		Generar scripts	2 horas	4 horas	jue 27/08/15	vie 28/08/15	790CC	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	100%	

20151021 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
792		Migrar y ajustar jobs	1 hora	2 horas	jue 27/08/15	vie 28/08/15	791CC	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	100%	
793		Migrar y ajustar paquetes	1 hora	2 horas	jue 27/08/15	vie 28/08/15	792CC	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	100%	
794		Validar y ajustar proced.	1 hora	2 horas	jue 27/08/15	vie 28/08/15	793CC	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	100%	
795		Depurar bases de datos	0 horas	0 horas	jue 27/08/15	jue 27/08/15	794CC	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	100%	
796		Ajustar filfactor y otras características	1 día	16 horas	jue 27/08/15	vie 28/08/15	795CC	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	100%	
797		Configurar réplica si aplica	1 día	16 horas	vie 28/08/15	lun 31/08/15	796	Carlos Hernandez;Flo Espinoza	100%	
798		Instalación de aplicaciones y prueba	11,5 días	164 horas	mié 19/08/15	jue 03/09/15			100%	
799		Instalar aplicaciones	1 día	16 horas	mié 19/08/15	jue 20/08/15	784	Johnny Herrera;Mercede Rapso	100%	
800		Realizar conexiones de las interfaces	4 horas	8 horas	jue 20/08/15	jue 20/08/15	799	Johnny Herrera;Mercede Rapso	100%	
801		Realizar pruebas de componentes	1 día	16 horas	jue 20/08/15	vie 21/08/15	800	Johnny Herrera;Mercede Rapso	100%	
802		Realizar pruebas de funcionalidad	2 días	32 horas	vie 21/08/15	mar 25/08/15	801	Johnny Herrera;Mercede Rapso	100%	
803		Realizar pruebas de replicacion	3 días	24 horas	mar 25/08/15	vie 28/08/15	802	Carlos Hernandez	100%	

20151021 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
804		Probar jobs y paquetes	4 horas	8 horas	vie 28/08/15	lun 31/08/15	803	Johnny Herrera;Mercede Rapso	100%	
805		Validar resultados de todas las pruebas	4 horas	12 horas	lun 31/08/15	lun 31/08/15	804	Carlos Hernandez;Jof Herrera;Mercede Rapso	100%	
806		Repetir pruebas no exitosas	2 días	32 horas	lun 31/08/15	mié 02/09/15	805	Carlos Hernandez;Jof Herrera	100%	
807		Documentar los ajustes realizados	1 día	16 horas	mié 02/09/15	jue 03/09/15	806	Carlos Hernandez;Jof Herrera	100%	
808		Desabilitar servicio de réplica si aplica y documentar	0 días	0 horas	jue 03/09/15	jue 03/09/15	807	Carlos Hernandez	100%	
809		P16: Migración de datos Producción	10,06 días	120 horas	e 04/09/15	h 05/10/15			100%	
810		Elaboración de plan de migración	1 día	8 horas	vie 04/09/15	lun 07/09/15	808	S-COM1 AM	100%	
811		Migración de datos	2 días	48 horas	lun 07/09/15	mié 09/09/15	810	Carlos Hernandez;Luis F. Coronado;Mercede Rapso	100%	
812		Revisión de la carga de datos	2 días	48 horas	mié 30/09/15	jue 01/10/15	811	Katia Vargas;Carlos Hernandez;Mercede Rapso	100%	
813		Revisión de respaldos generados	2 días	16 horas	vie 02/10/15	lun 05/10/15	812	Carlos Hernandez	100%	
814		Aprobación de la migración Produccion	0 días	0 horas	jue 01/10/15	jue 01/10/15	812	Katia Vargas	100%	
815		P17: Puesta en Producción	4,31 días	28 horas	e 11/09/15	h 05/10/15			100%	
816		Actualizar aplicaciones	1 día	16 horas	vie 11/09/15	lun 14/09/15	814	Johnny Herrera;Mercede Rapso	100%	
817		Pruebas de acceso a la aplicación	4 horas	4 horas	vie 02/10/15	vie 02/10/15	816	Katia Vargas	100%	








20151021 Declaraciones web

Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
818	✓	Pruebas de conexión a BD	4 horas	4 horas	vie 02/10/15	vie 02/10/15		Katia Vargas	100%	
819	✓	Aprobación de la puesta en producción	0 días	0 horas	vie 02/10/15	vie 02/10/15	818	Katia Vargas;M	100%	
820	✓	Habilitar acceso a Producción al público	2 horas	4 horas	lun 05/10/15	lun 05/10/15	817	Johnny Herrera;Merce Rapso	100%	
821	✓	P20. Capacitación, divulgación y comunicación para la puesta en producción	79 días	40 horas	mié 01/07/15	mié 21/10/15			100%	
822	✓	Fase 1. Complemento proceso integral de pruebas	38 días	40 horas	mié 01/07/15	vie 21/08/15			100%	
823	✓	Prueba focalizada con contadores	11 días	40 horas	mié 01/07/15	mié 15/07/15			100%	
824	✓	Elaborar instrucción para la conformación de grupos de capacitación en cada AATT	5 días	0 horas	lun 17/08/15	vie 21/08/15			100%	
825	✓	Capacitación en el uso de ATV a funcionarios de DSC y CIT	5 días	0 horas	lun 27/07/15	vie 31/07/15			100%	
826	✓	Capacitación en el uso de ATV a funcionarios de la subgerencias de Servicio al Contribuyente en las AATT	10 días	0 horas	lun 03/08/15	vie 14/08/15	825		100%	
827	✓	Elaborar instructivo con estructura del ATV como base para tutoriales	22 días	0 horas	lun 17/08/15	mié 16/09/15	826		100%	
828	✓	Elaboración de guías paso a paso	26 días	0 horas	vie 31/07/15	mié 14/10/15	827		100%	
829	✓	Fase 2. Divulgación, distribución de volantes y afiches	56 días	0 horas	lun 03/08/15	mié 21/10/15			100%	
830	✓	Identificar los grupos destinatarios de mensajes	5 días	0 horas	lun 03/08/15	vie 07/08/15	828CC		100%	
831	✓	Maestro de contribuyentes (masividad)	5 días	0 horas	lun 03/08/15	vie 07/08/15			100%	
832	✓	Identificar representantes legales	5 días	0 horas	lun 03/08/15	vie 07/08/15	831CC		100%	
833	✓	Identificar contadores o autorizados	5 días	0 horas	lun 03/08/15	vie 07/08/15	832CC		100%	

20151021 Declaraciones web


Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	28/04
834	✓	Comunicación por medio de mensajería de texto celular	5 días 0 horas		lun 10/08/15	vie 14/08/15	833		100%	
835	✓	Comunicación por medio de de correo electrónico	8 días 0 horas		mar 01/09/15	jue 10/09/15			100%	
836	✓	Anuncio en sitio Web	12 días 0 horas		lun 03/08/15	mar 18/08/15			100%	
837	✓	Distribución de volantes para la campaña	27 días 0 horas		jue 10/09/15	mié 21/10/15			100%	
838	✓	Impresión de los volantes	0 días 0 horas		jue 10/09/15	jue 10/09/15	835		100%	
839	✓	Distribución de los volantes a sucursales	21 días 0 horas		mar 22/09/15	mié 21/10/15	838		100%	
840	✓	Auncio en redes sociales	10 días 0 horas		lun 03/08/15	vie 14/08/15			100%	
841	✓	Pautas publicitarias	10 días 0 horas		vie 11/09/15	vie 25/09/15	838CC		100%	
842	✓	Conferencia de prensa	1 día 0 horas		lun 03/08/15	lun 03/08/15	841CC		100%	
843	✓	Actualización preguntas tributarias	11 días 0 horas		vie 11/09/15	lun 28/09/15	838CC		100%	
844	✓	Fase 3. Publicación de resolución sobre obligatoriedad del uso de la herramienta	1 día 0 horas		vie 11/09/15	vie 11/09/15			100%	
845	✓	Publicación de resolución sobre obligatoriedad, e incluir contingencia para el pago en D110	1 día 0 horas		vie 11/09/15	vie 11/09/15	838CC		100%	
846	✓	F4. Comunicación a bancos sobre los formularios que no se recepcionan en físico	1 día 0 horas		lun 14/09/15	lun 14/09/15			100%	
847	✓	Comunicar la resolución sobre obligatoriedad a bancos y cuales formularios se permite recibir	1 día 0 horas		lun 14/09/15	lun 14/09/15			100%	
848	✓	F5. Comunicación interna	12 días 0 horas		jue 30/07/15	vie 14/08/15			100%	
849	✓	Elaboración de capsulas informaticas	2 días 0 horas		jue 30/07/15	vie 31/07/15			100%	
850	✓	Revisión de capsulas informativas	2 días 0 horas		lun 03/08/15	mar 04/08/15	849		100%	
851	✓	Remisión de capsulas informativas	8 días 0 horas		mié 05/08/15	vie 14/08/15	850		100%	
852	✓	F6. Capacitación externa	21 días 0 horas		mar 01/09/15	mié 30/09/15			100%	

20151021 Declaraciones web


Id		Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% comple	
853	 	Capacitación a contadores públicos y privados, regionalmente	21 días	0 horas	mar 01/09/15	mié 30/09/15			100%	28/04
854	  	Adm Seguimiento a Proyecto S-COM	359 días	924 horas	mié 12/03/14	mié 02/09/15			100%	
932	 	Reunión Seguimiento Contrato	359 días	312 horas	e 13/03/14	je 03/09/15			100%	

20151021 Declaraciones web

21 julio 07/07	15/09	11 diciembre 24/11	02/02	01 mayo 13/04	22/06	21 septiembre 31/08	09/11	11 febrero 18/01	29/03	01 julio 07/06	16/08	21 noviembre 25/10	03/01
-------------------	-------	-----------------------	-------	------------------	-------	------------------------	-------	---------------------	-------	-------------------	-------	-----------------------	-------

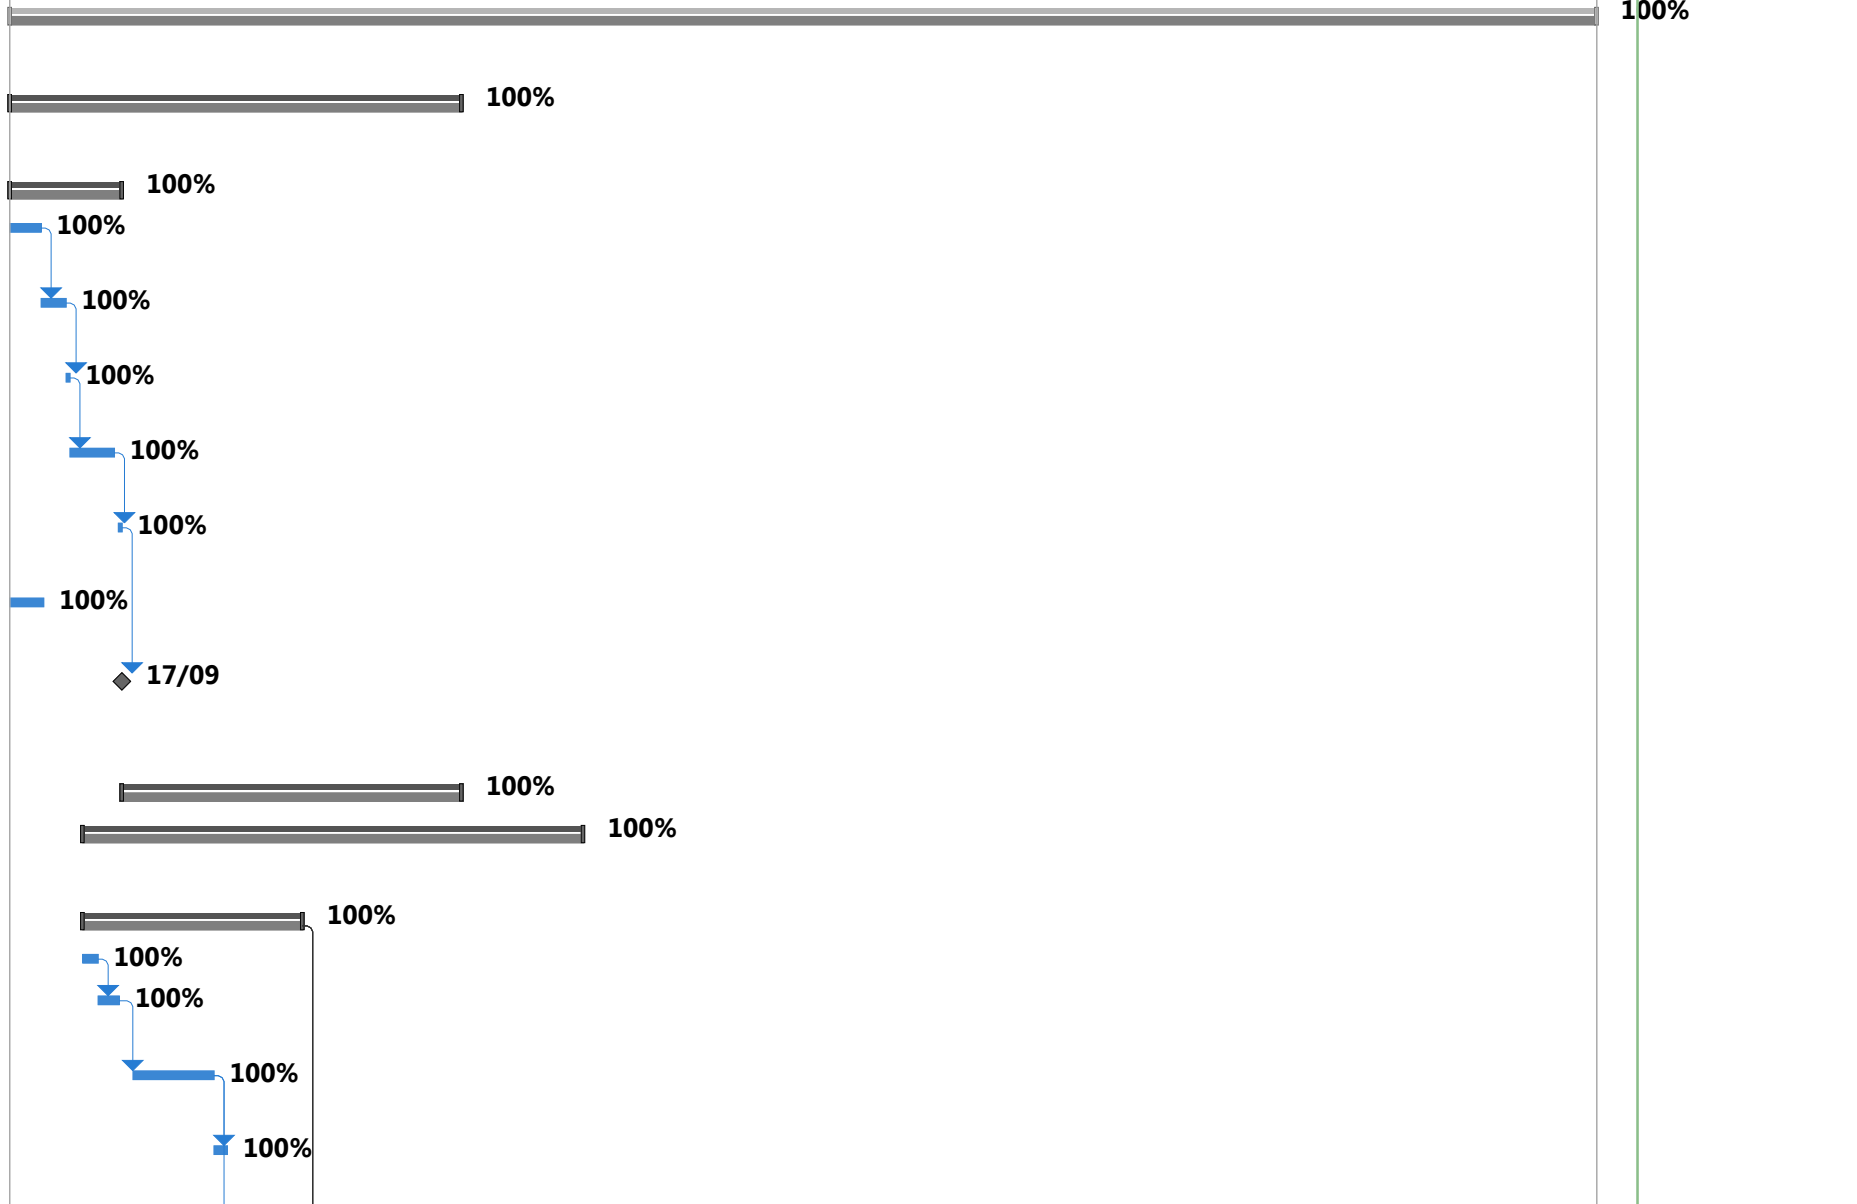


20151021 Declaraciones web

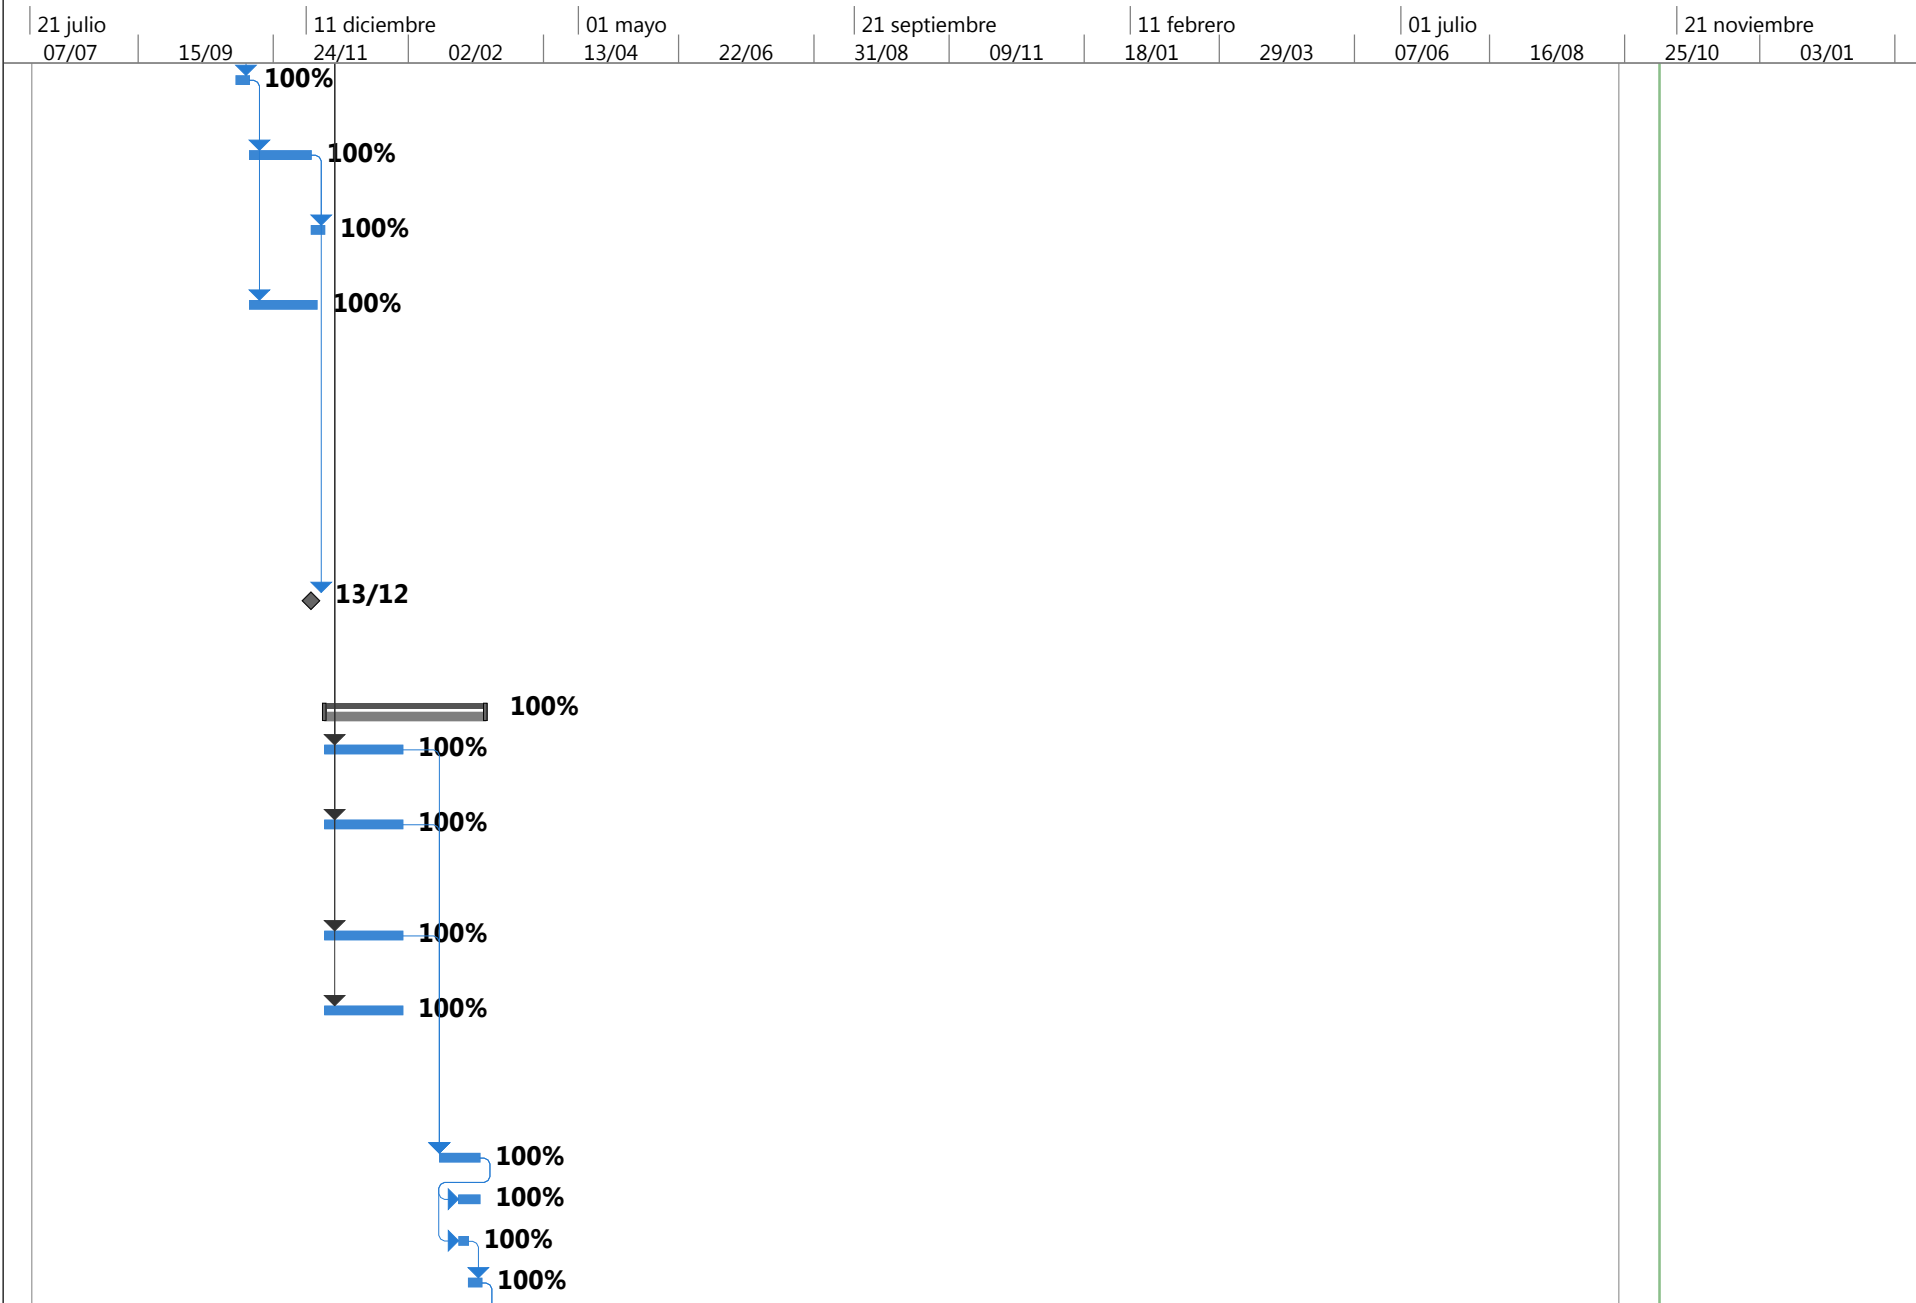


20151021 Declaraciones web

21 julio 07/07 | 15/09 | 11 diciembre 24/11 | 02/02 | 01 mayo 13/04 | 22/06 | 21 septiembre 31/08 | 09/11 | 11 febrero 18/01 | 29/03 | 01 julio 07/06 | 16/08 | 21 noviembre 25/10 | 03/01

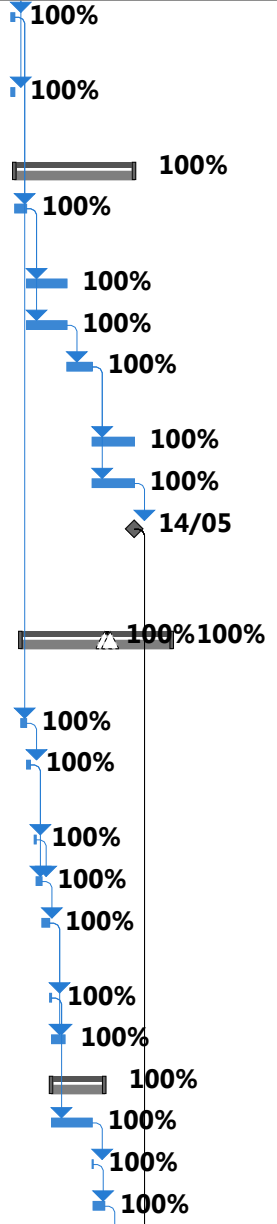


20151021 Declaraciones web

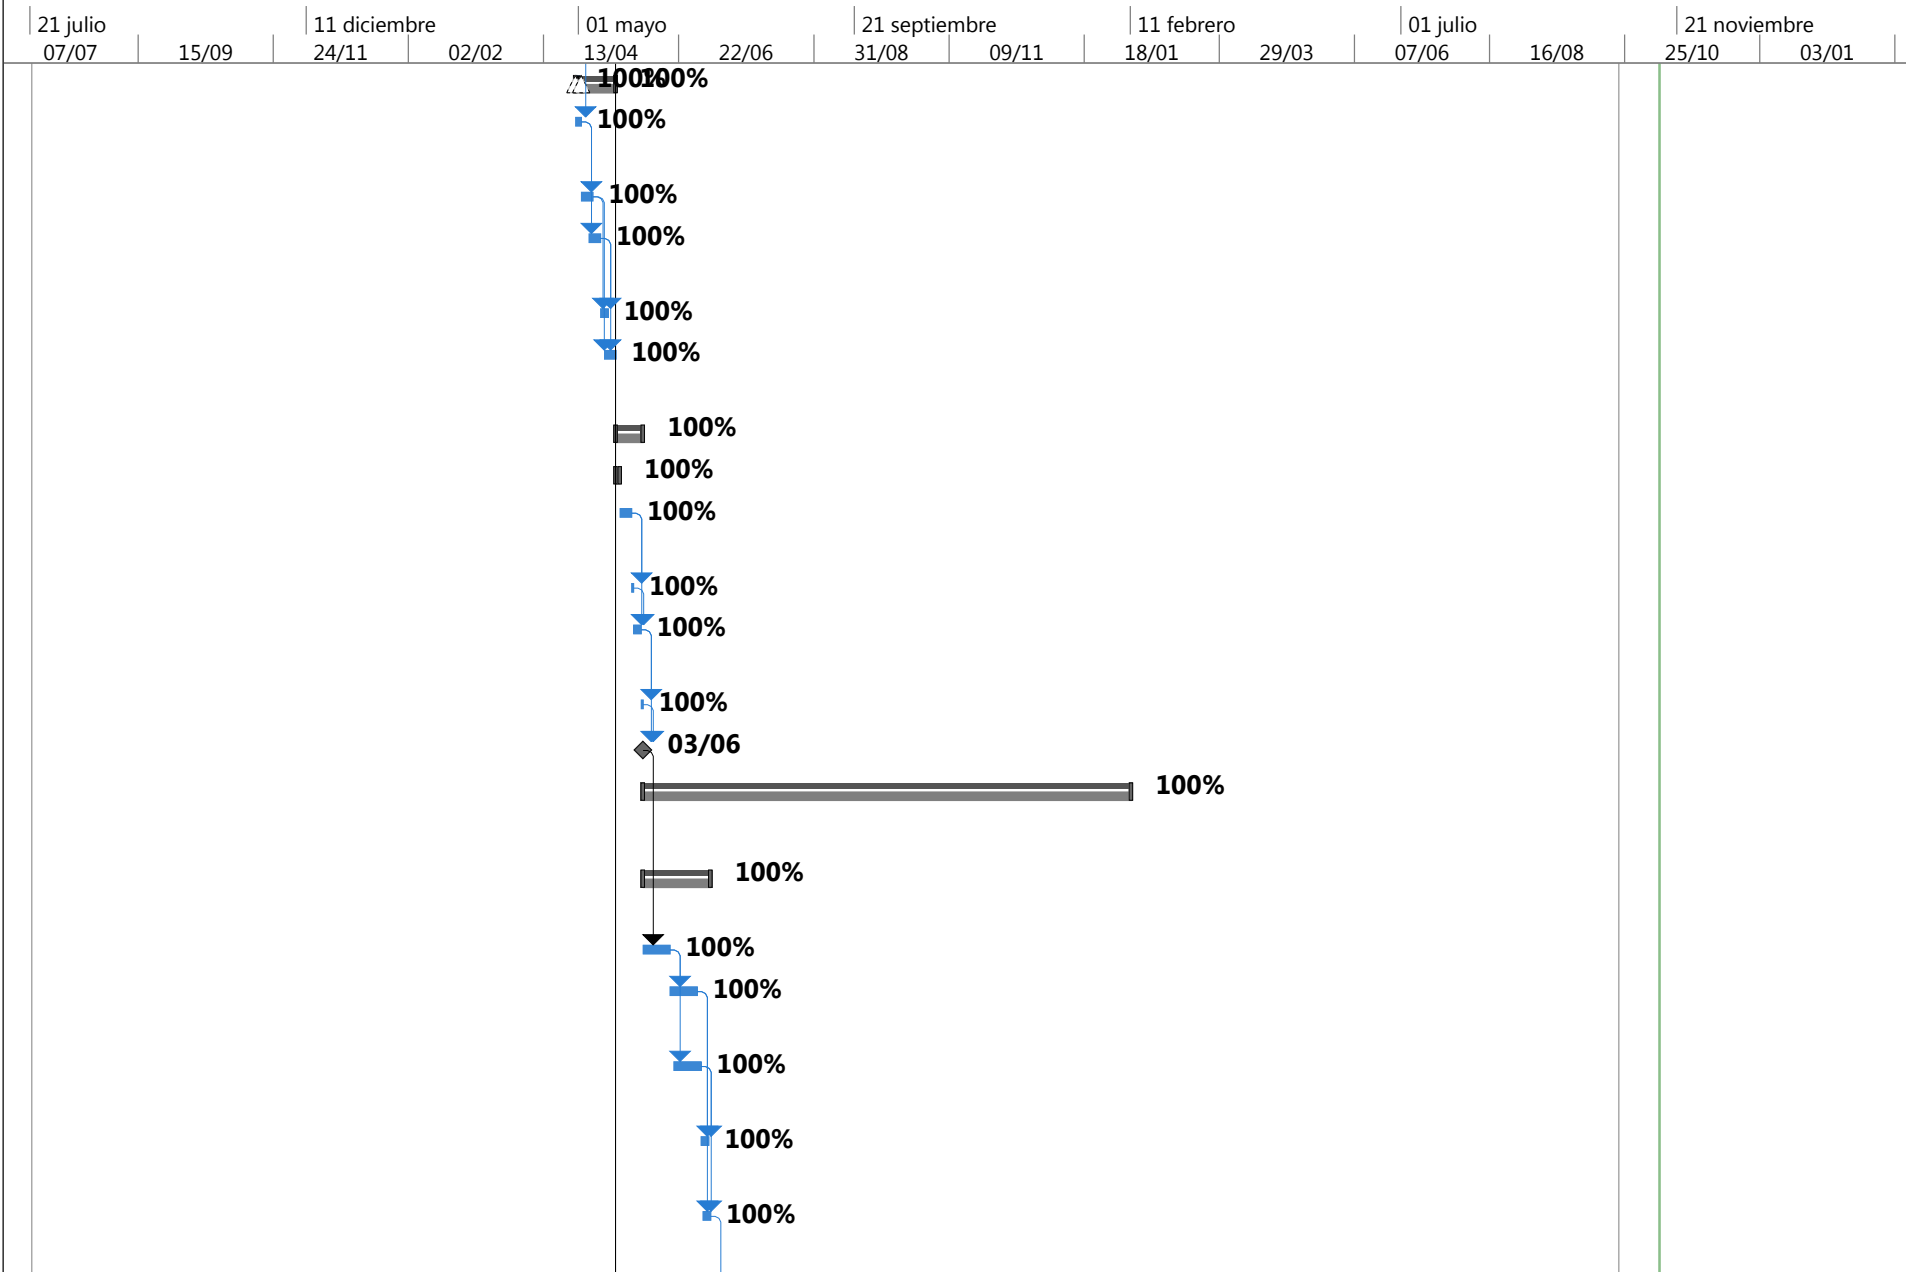


20151021 Declaraciones web


21 julio 07/07 15/09 11 diciembre 24/11 02/02 01 mayo 13/04 22/06 21 septiembre 31/08 09/11 11 febrero 18/01 29/03 01 julio 07/06 16/08 21 noviembre 25/10 03/01

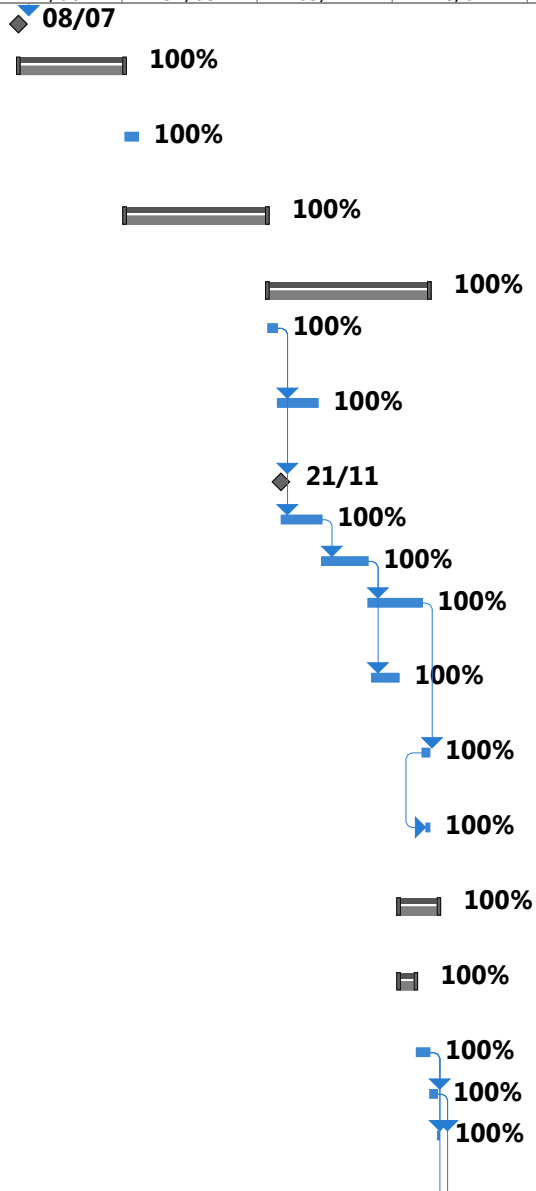

20151021 Declaraciones web

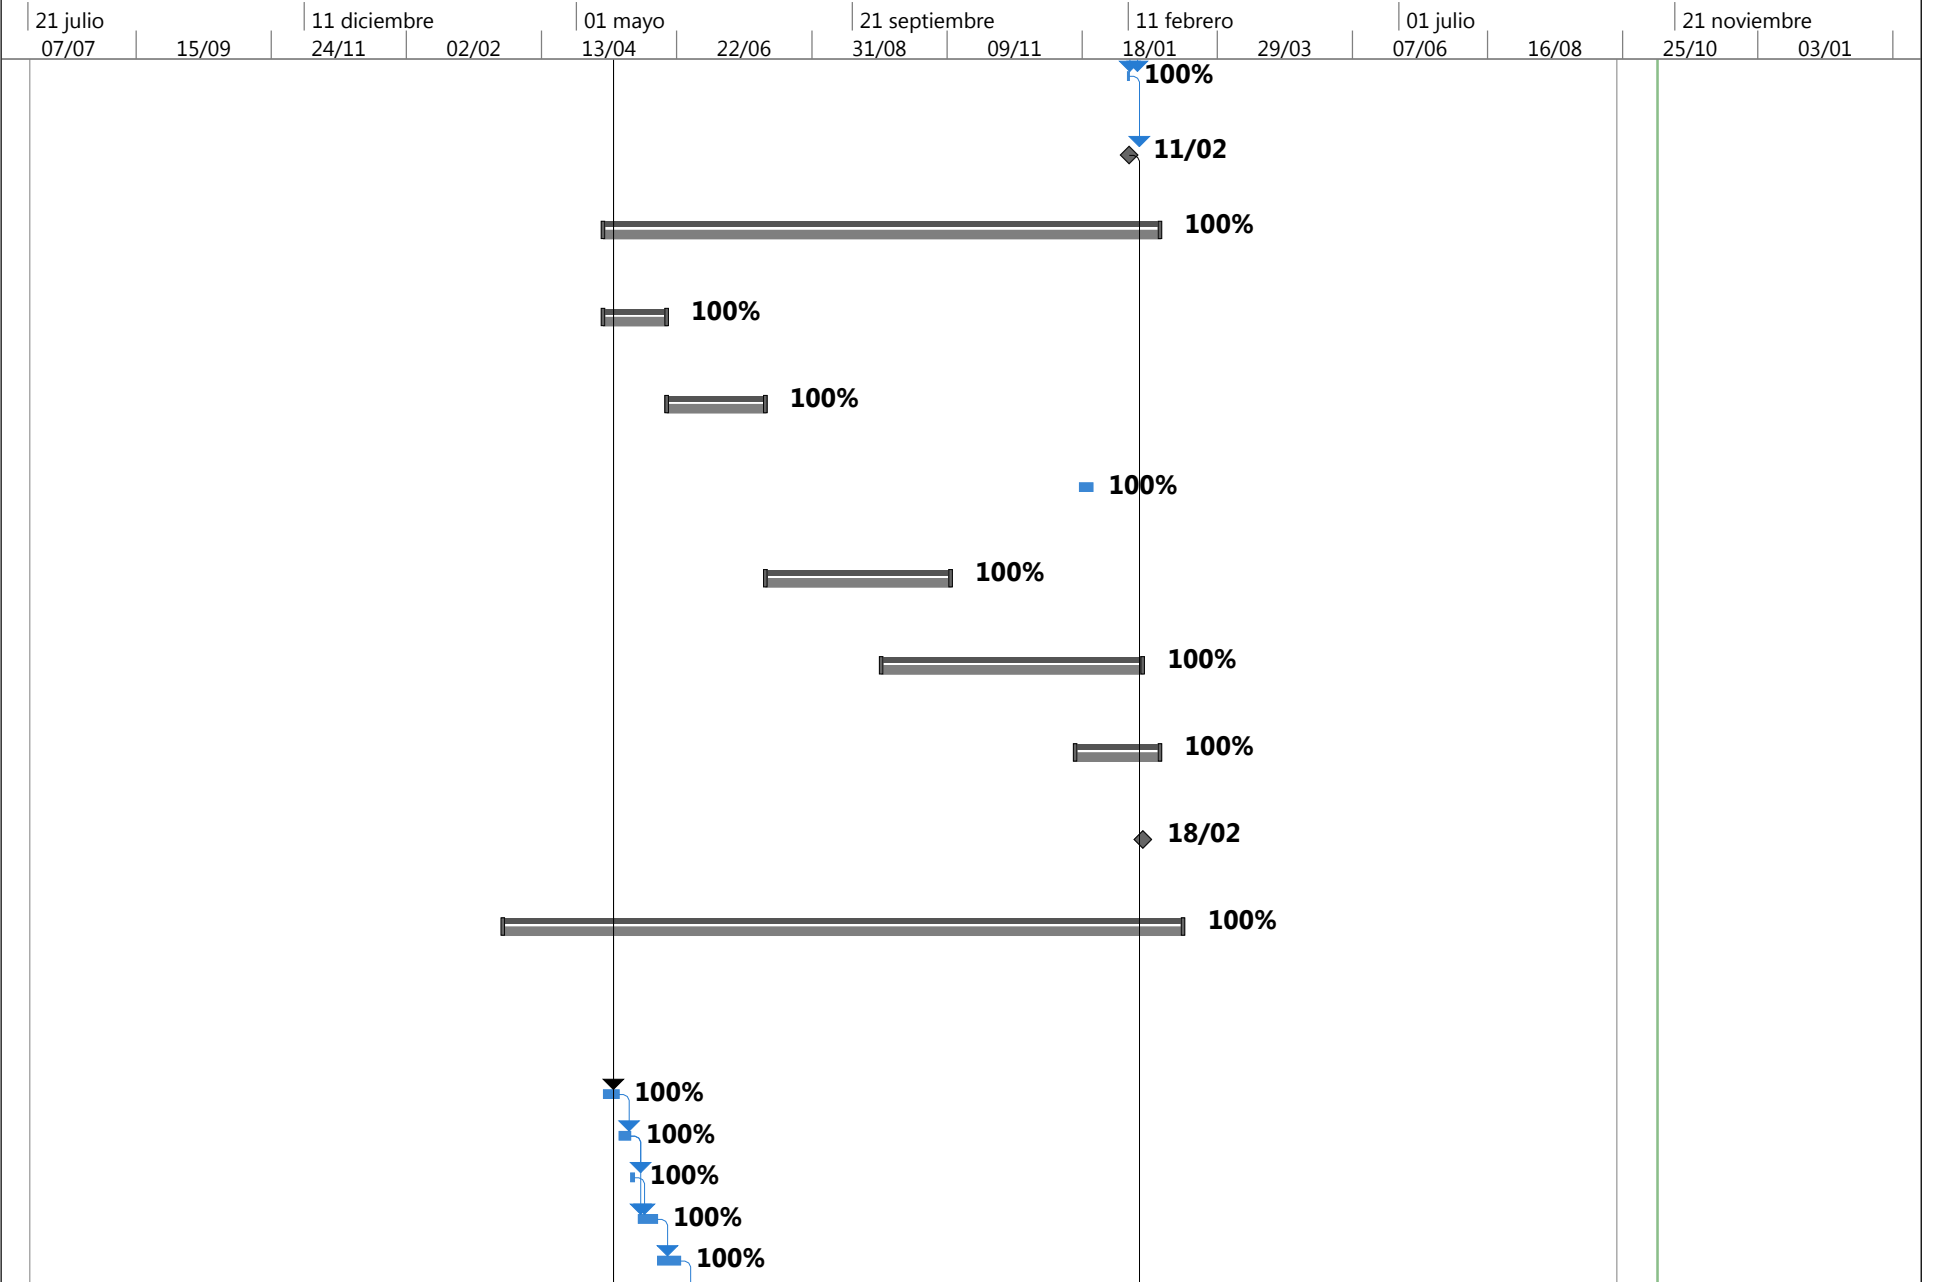


20151021 Declaraciones web

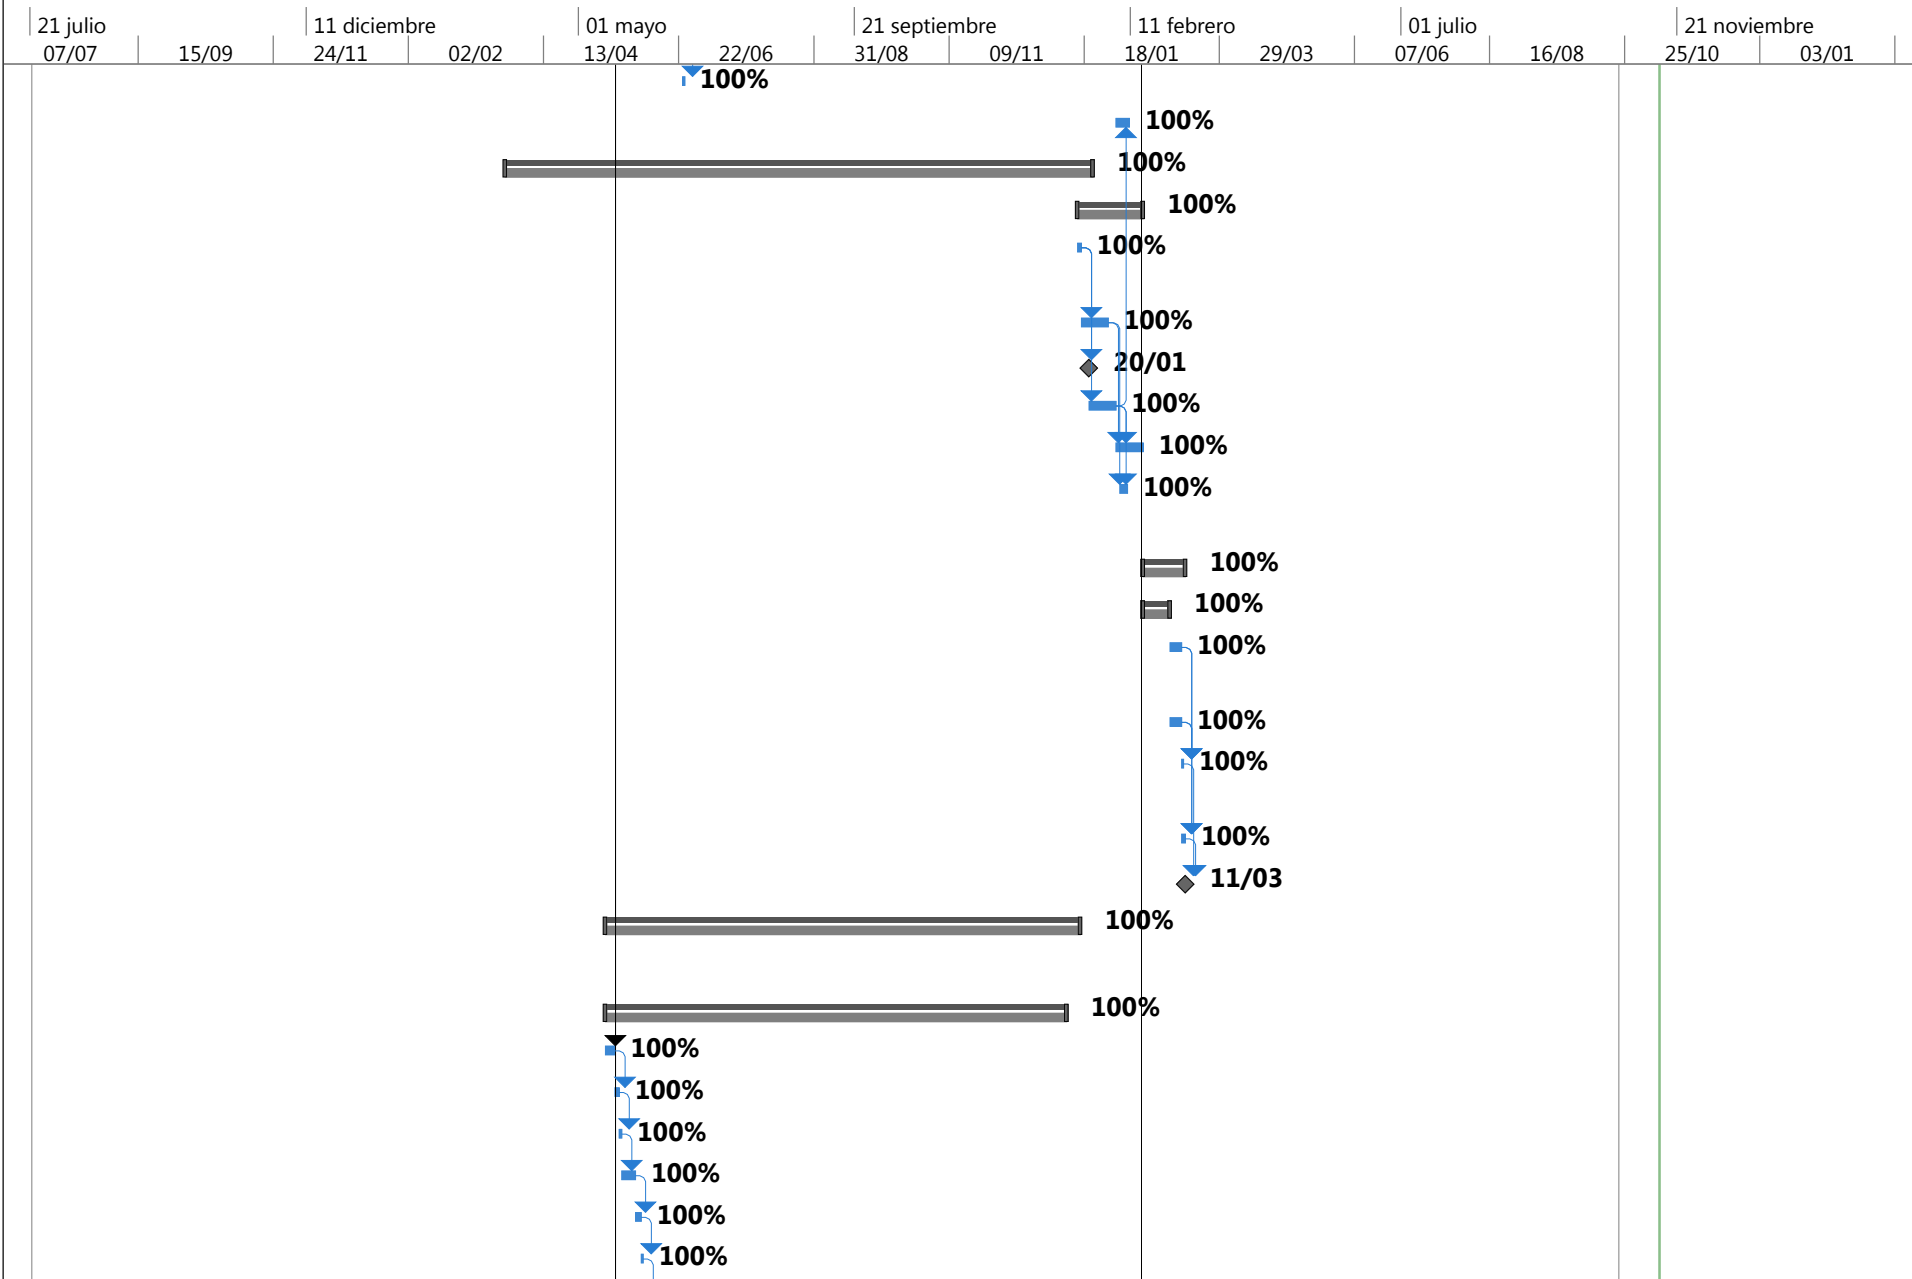


20151021 Declaraciones web

21 julio 07/07	15/09	11 diciembre 24/11	02/02	01 mayo 13/04	22/06	21 septiembre 31/08	09/11	11 febrero 18/01	29/03	01 julio 07/06	16/08	21 noviembre 25/10	03/01
-------------------	-------	-----------------------	-------	------------------	-------	------------------------	-------	---------------------	-------	-------------------	-------	-----------------------	-------

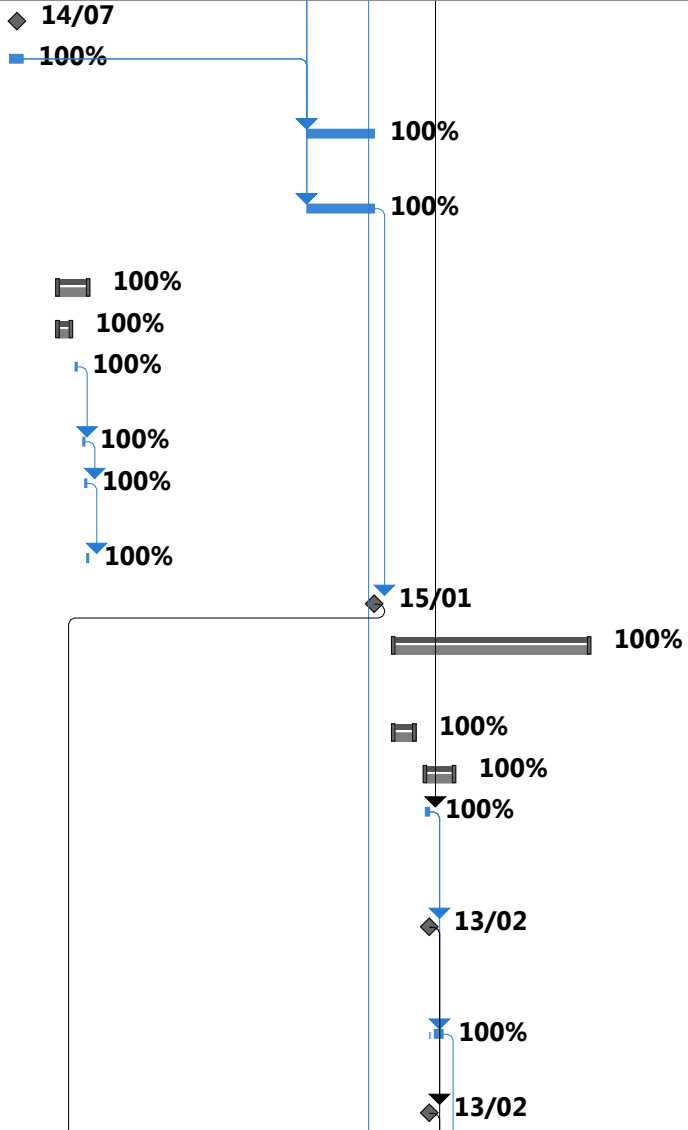


20151021 Declaraciones web


21 julio 07/07 15/09 11 diciembre 24/11 02/02 01 mayo 13/04 22/06 21 septiembre 31/08 09/11 11 febrero 18/01 29/03 01 julio 07/06 16/08 21 noviembre 25/10 03/01




20151021 Declaraciones web

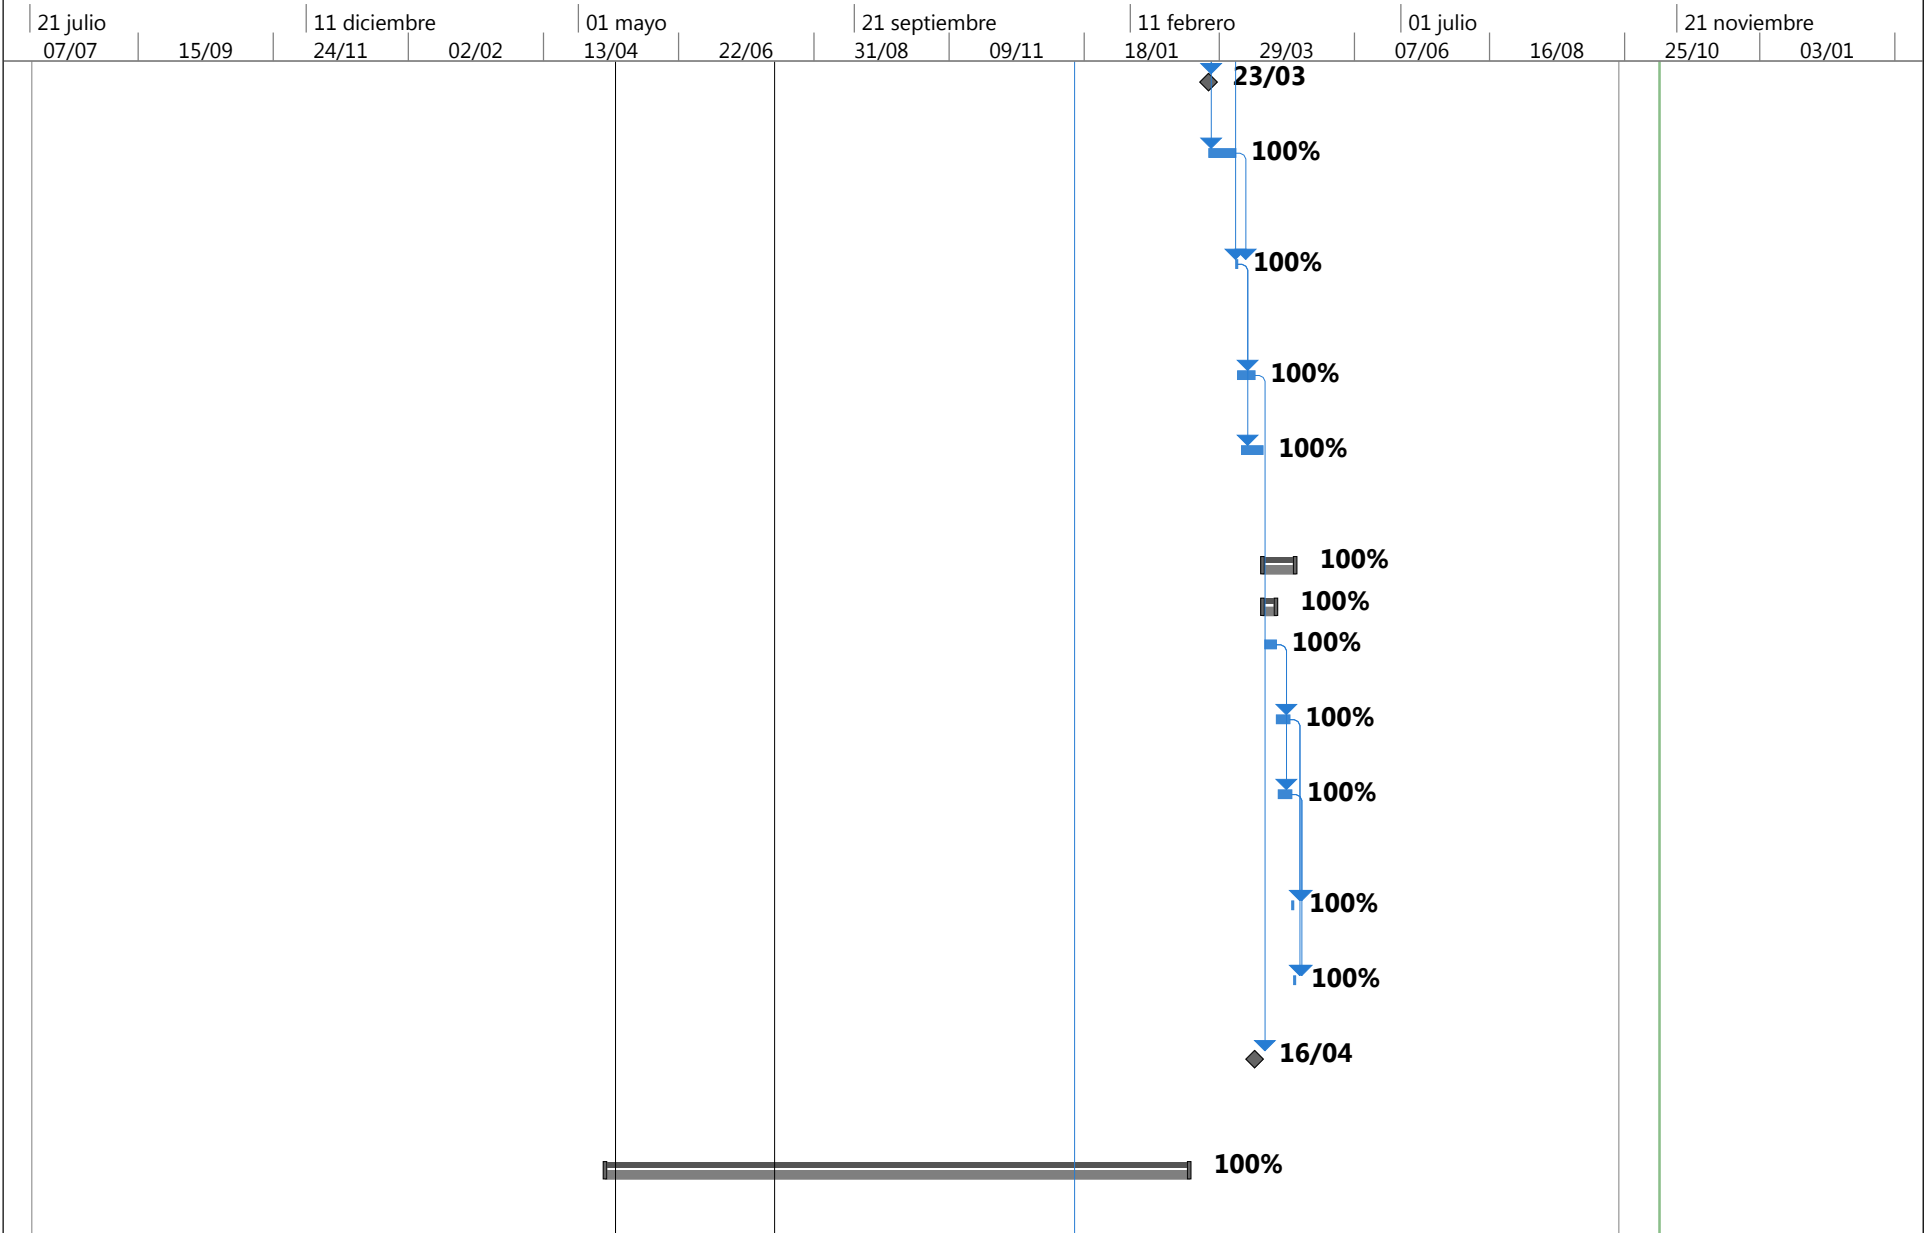


20151021 Declaraciones web

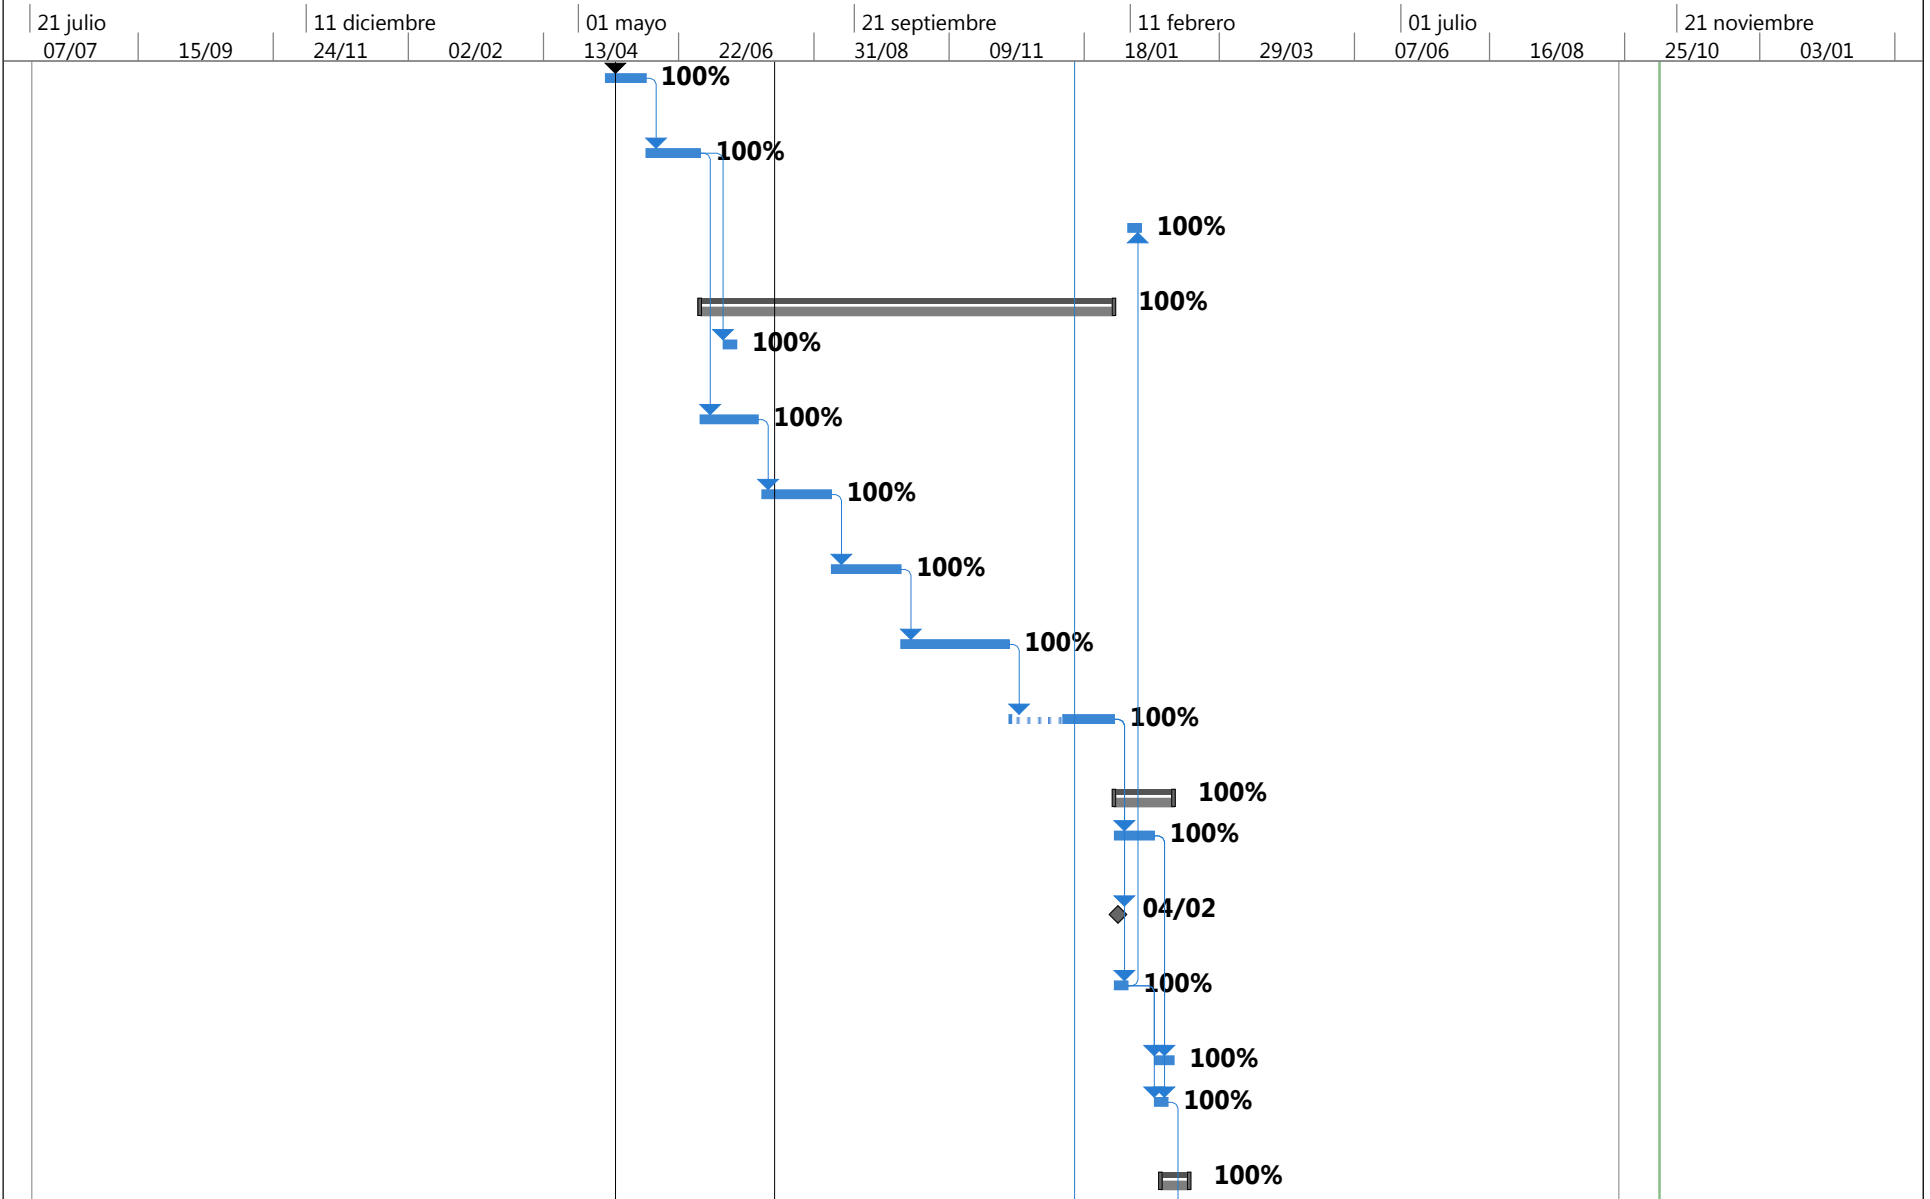

20151021 Declaraciones web

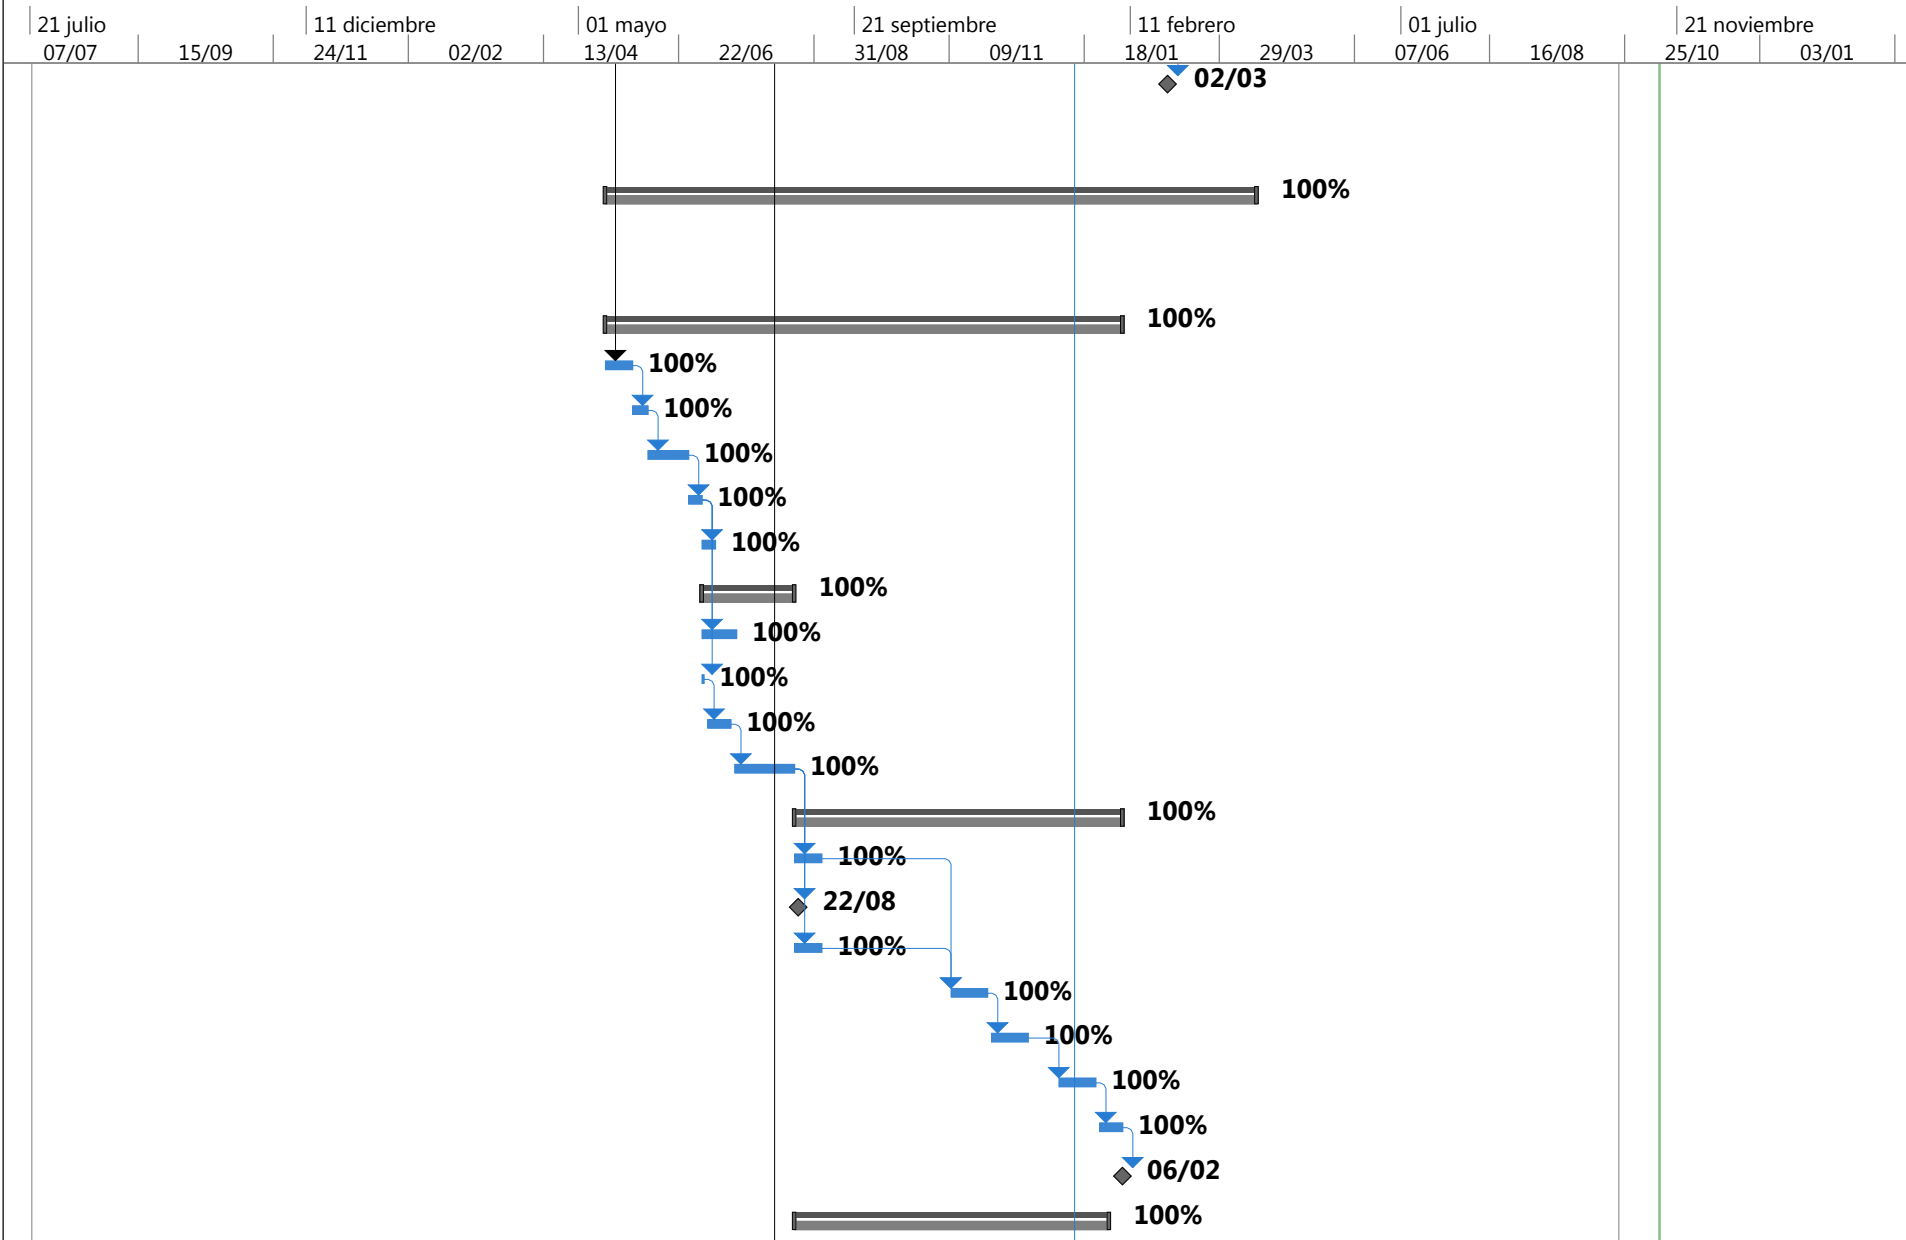

20151021 Declaraciones web

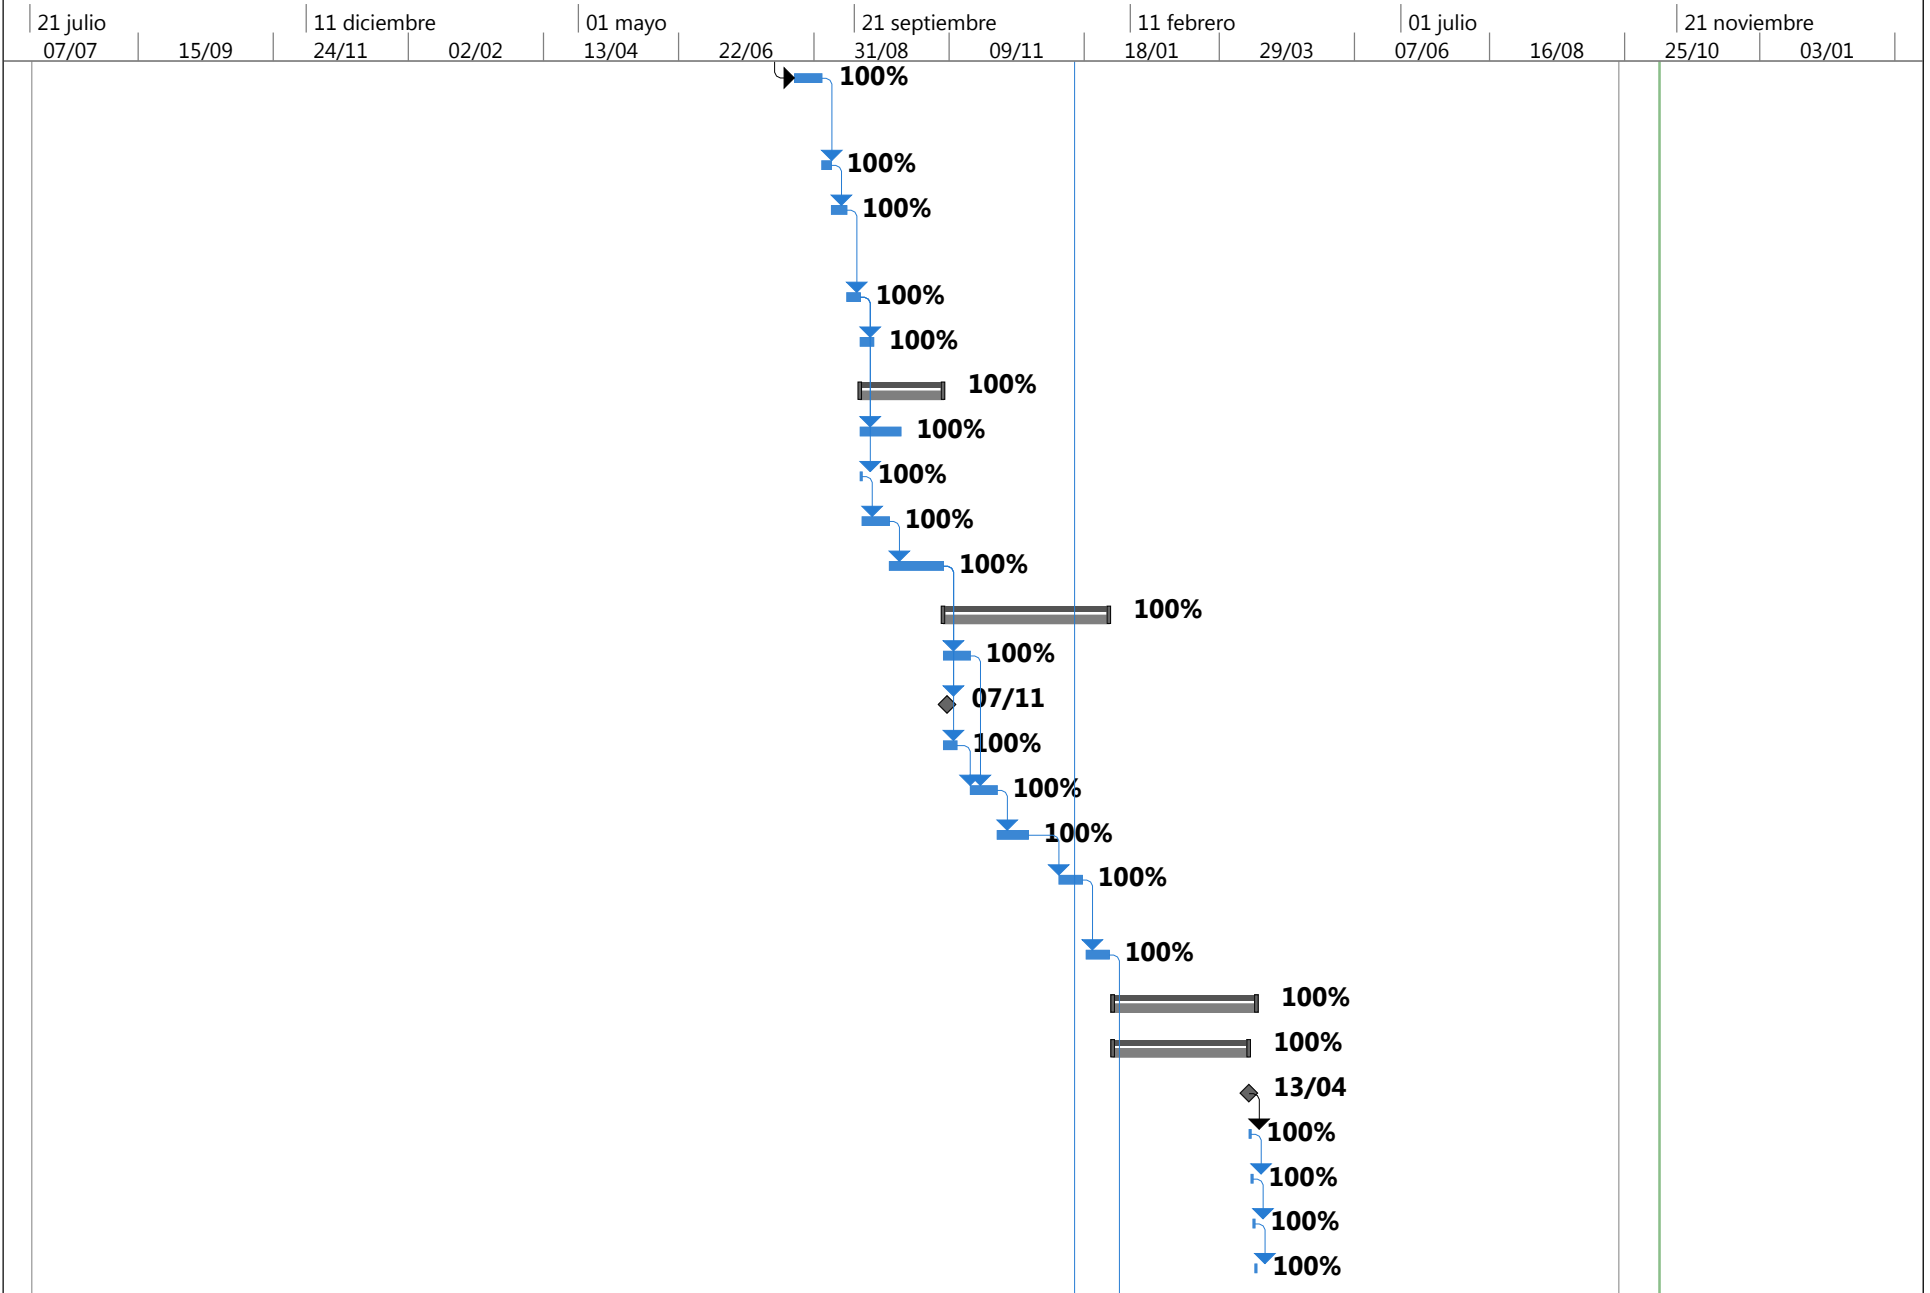

20151021 Declaraciones web

21 julio 07/07 | 15/09 | 11 diciembre 24/11 | 02/02 | 01 mayo 13/04 | 22/06 | 21 septiembre 31/08 | 09/11 | 11 febrero 18/01 | 29/03 | 01 julio 07/06 | 16/08 | 21 noviembre 25/10 | 03/01

30/01

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

05/12

100%

100%

100%

100%

100%


100%

18/12


100%

100%

20151021 Declaraciones web

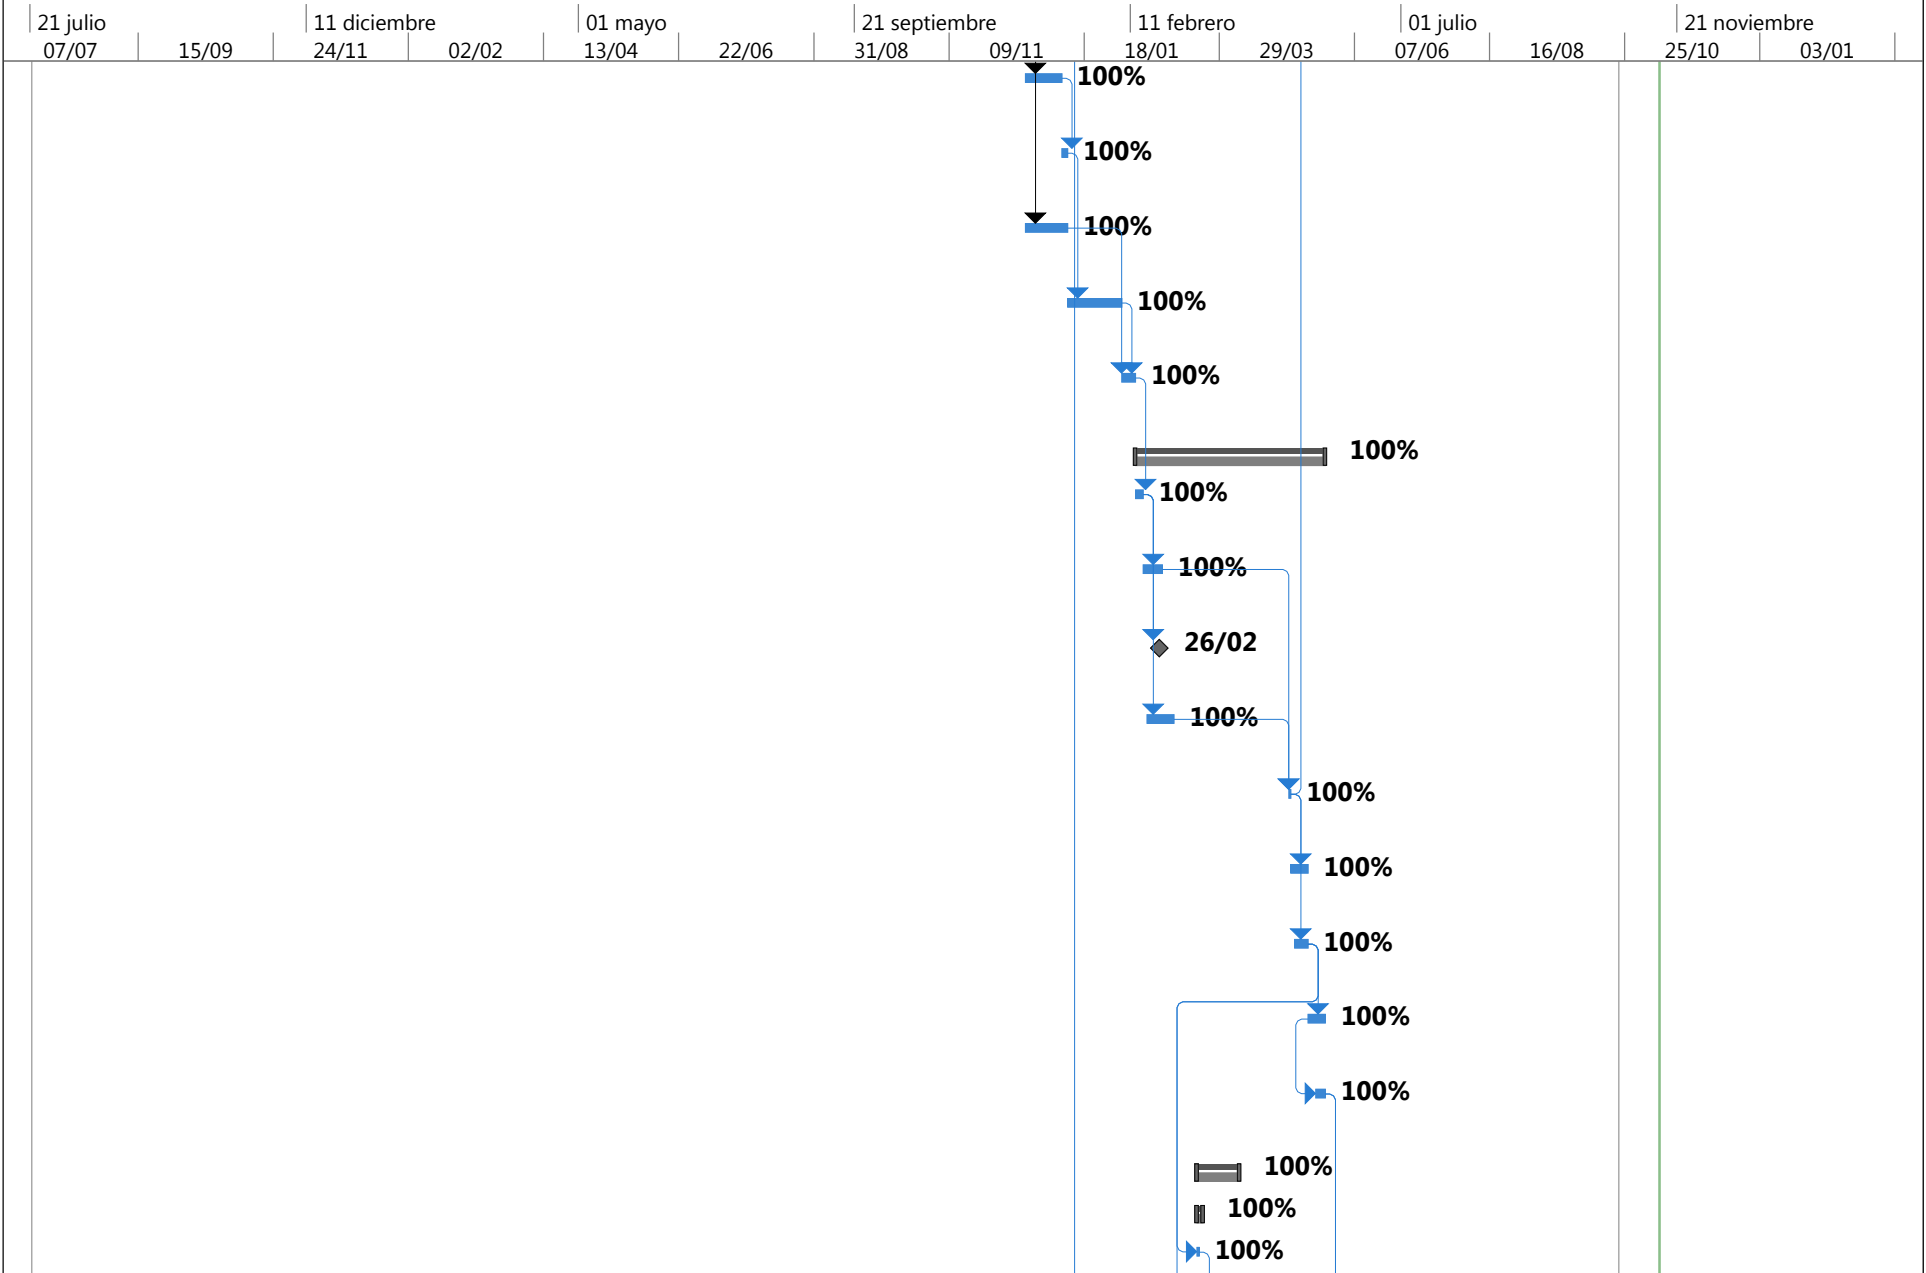


20151021 Declaraciones web

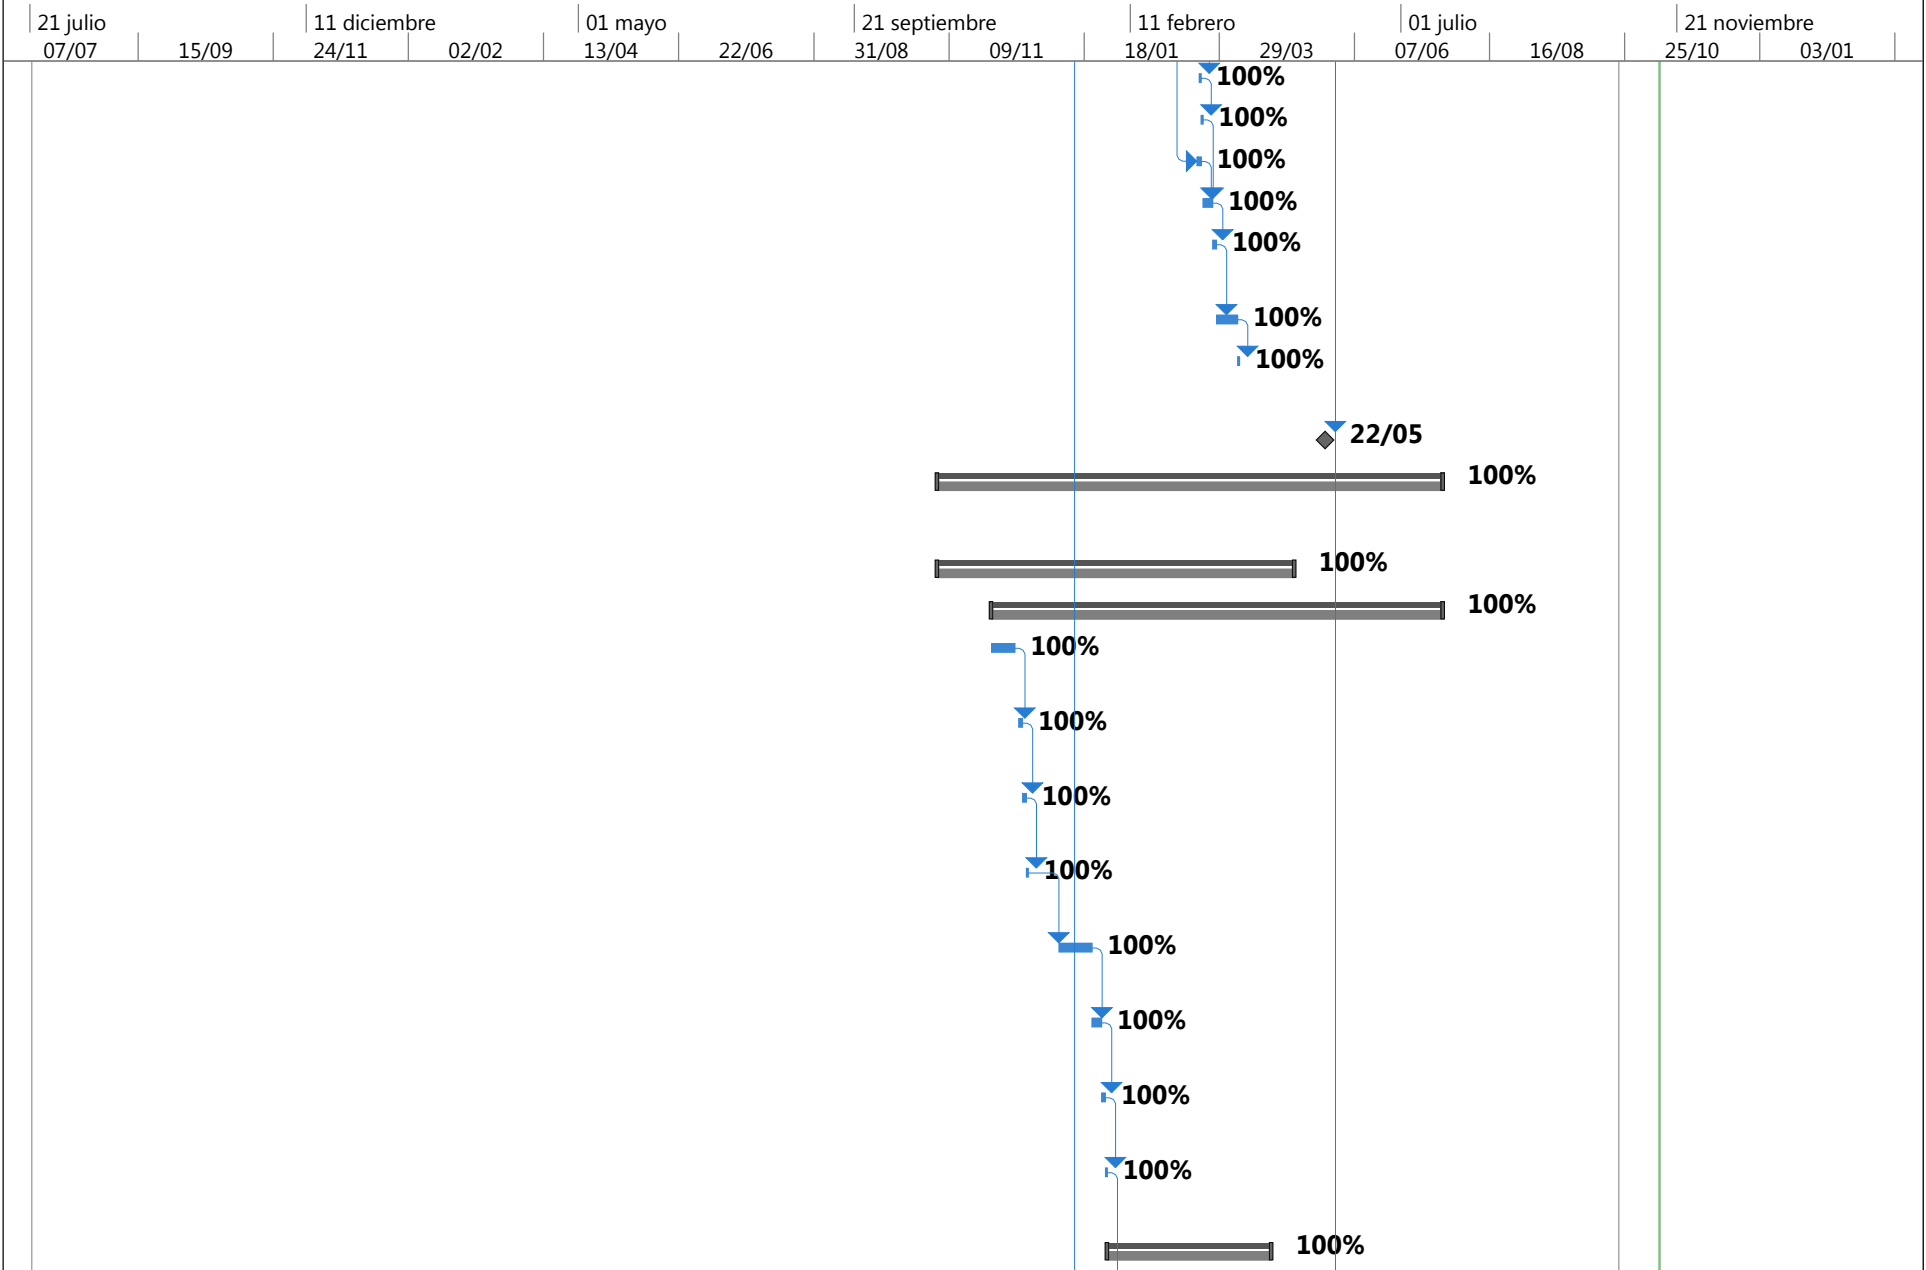


20151021 Declaraciones web


21 julio 07/07 15/09 11 diciembre 24/11 02/02 01 mayo 13/04 22/06 21 septiembre 31/08 09/11 11 febrero 18/01 29/03 01 julio 07/06 16/08 21 noviembre 25/10 03/01

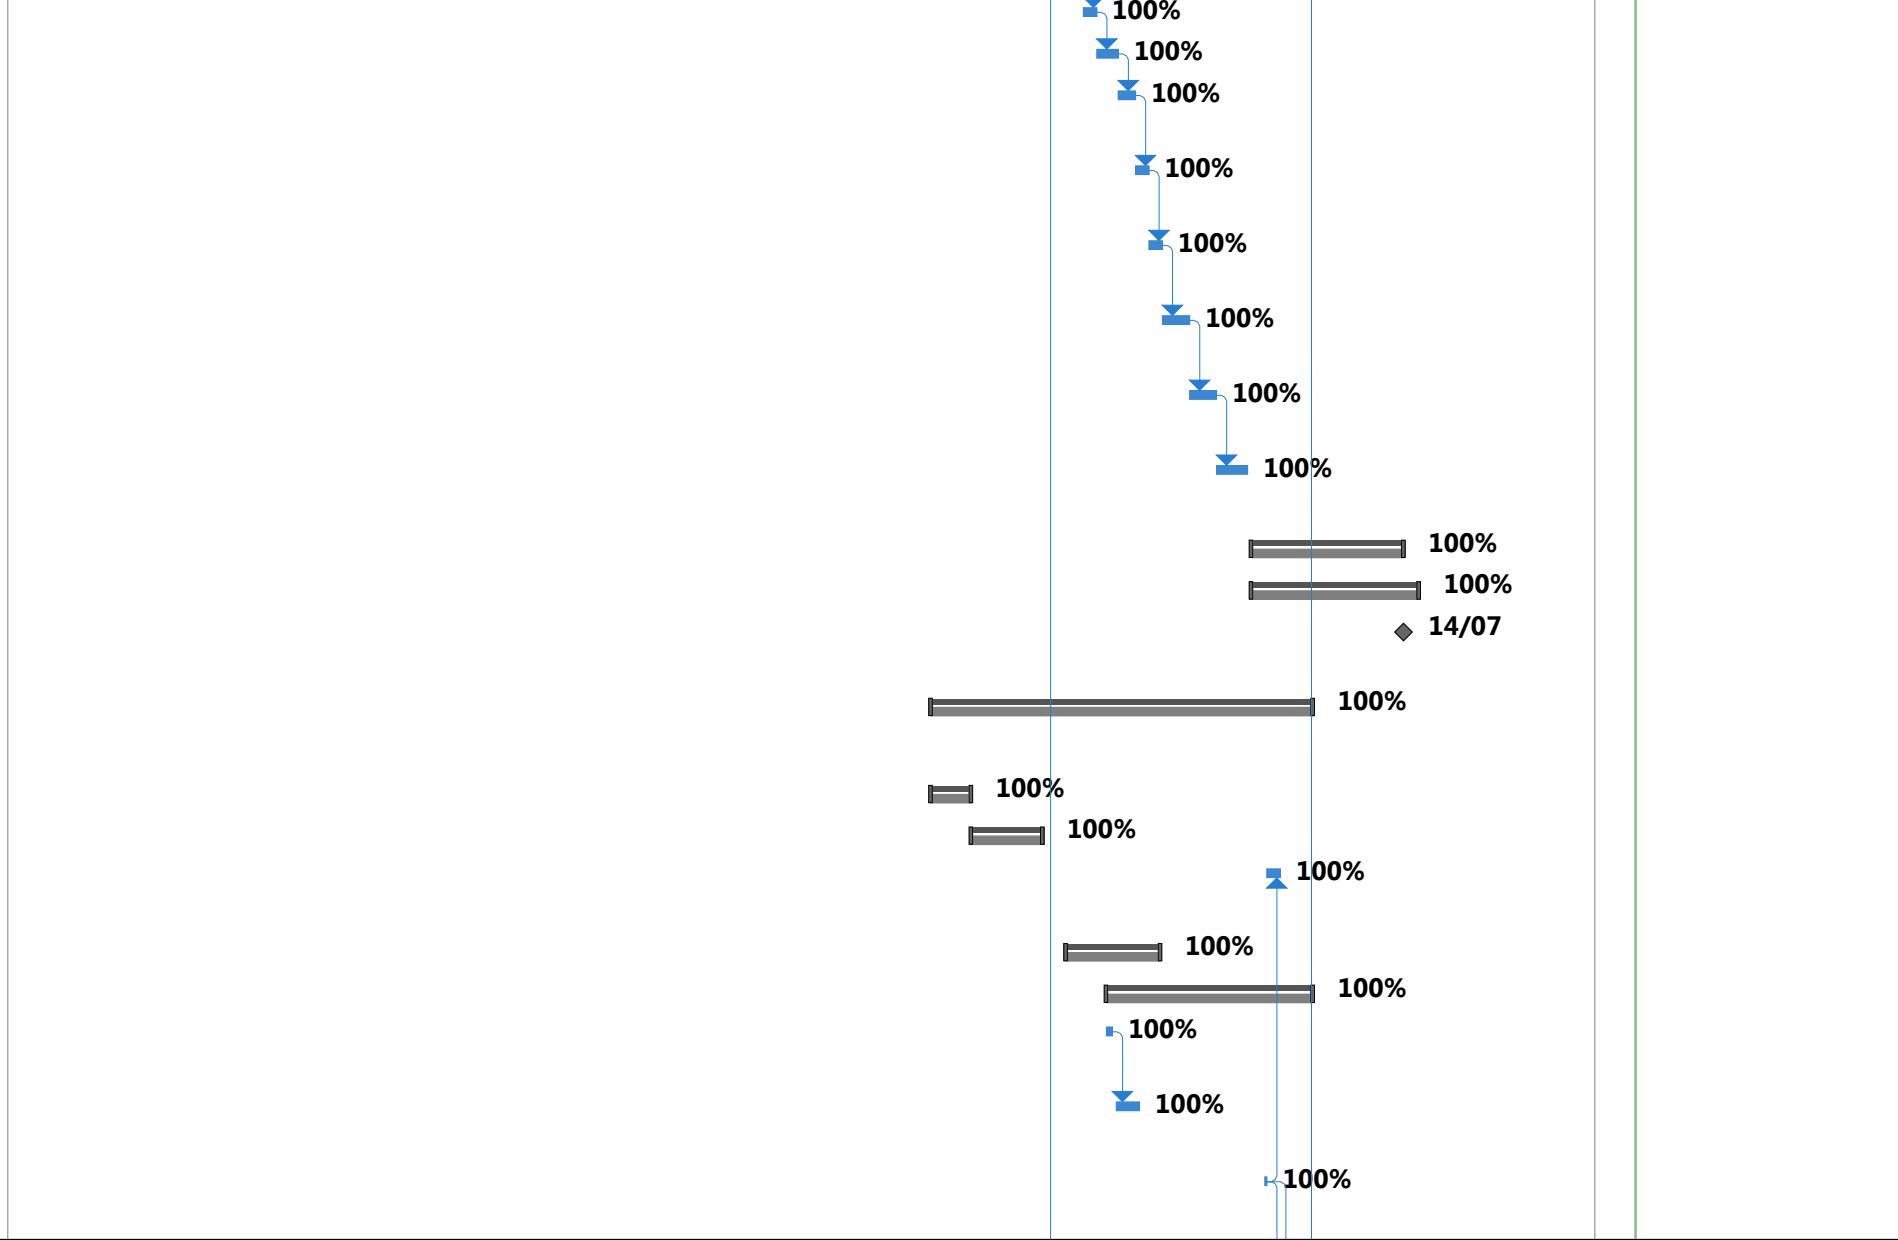


20151021 Declaraciones web

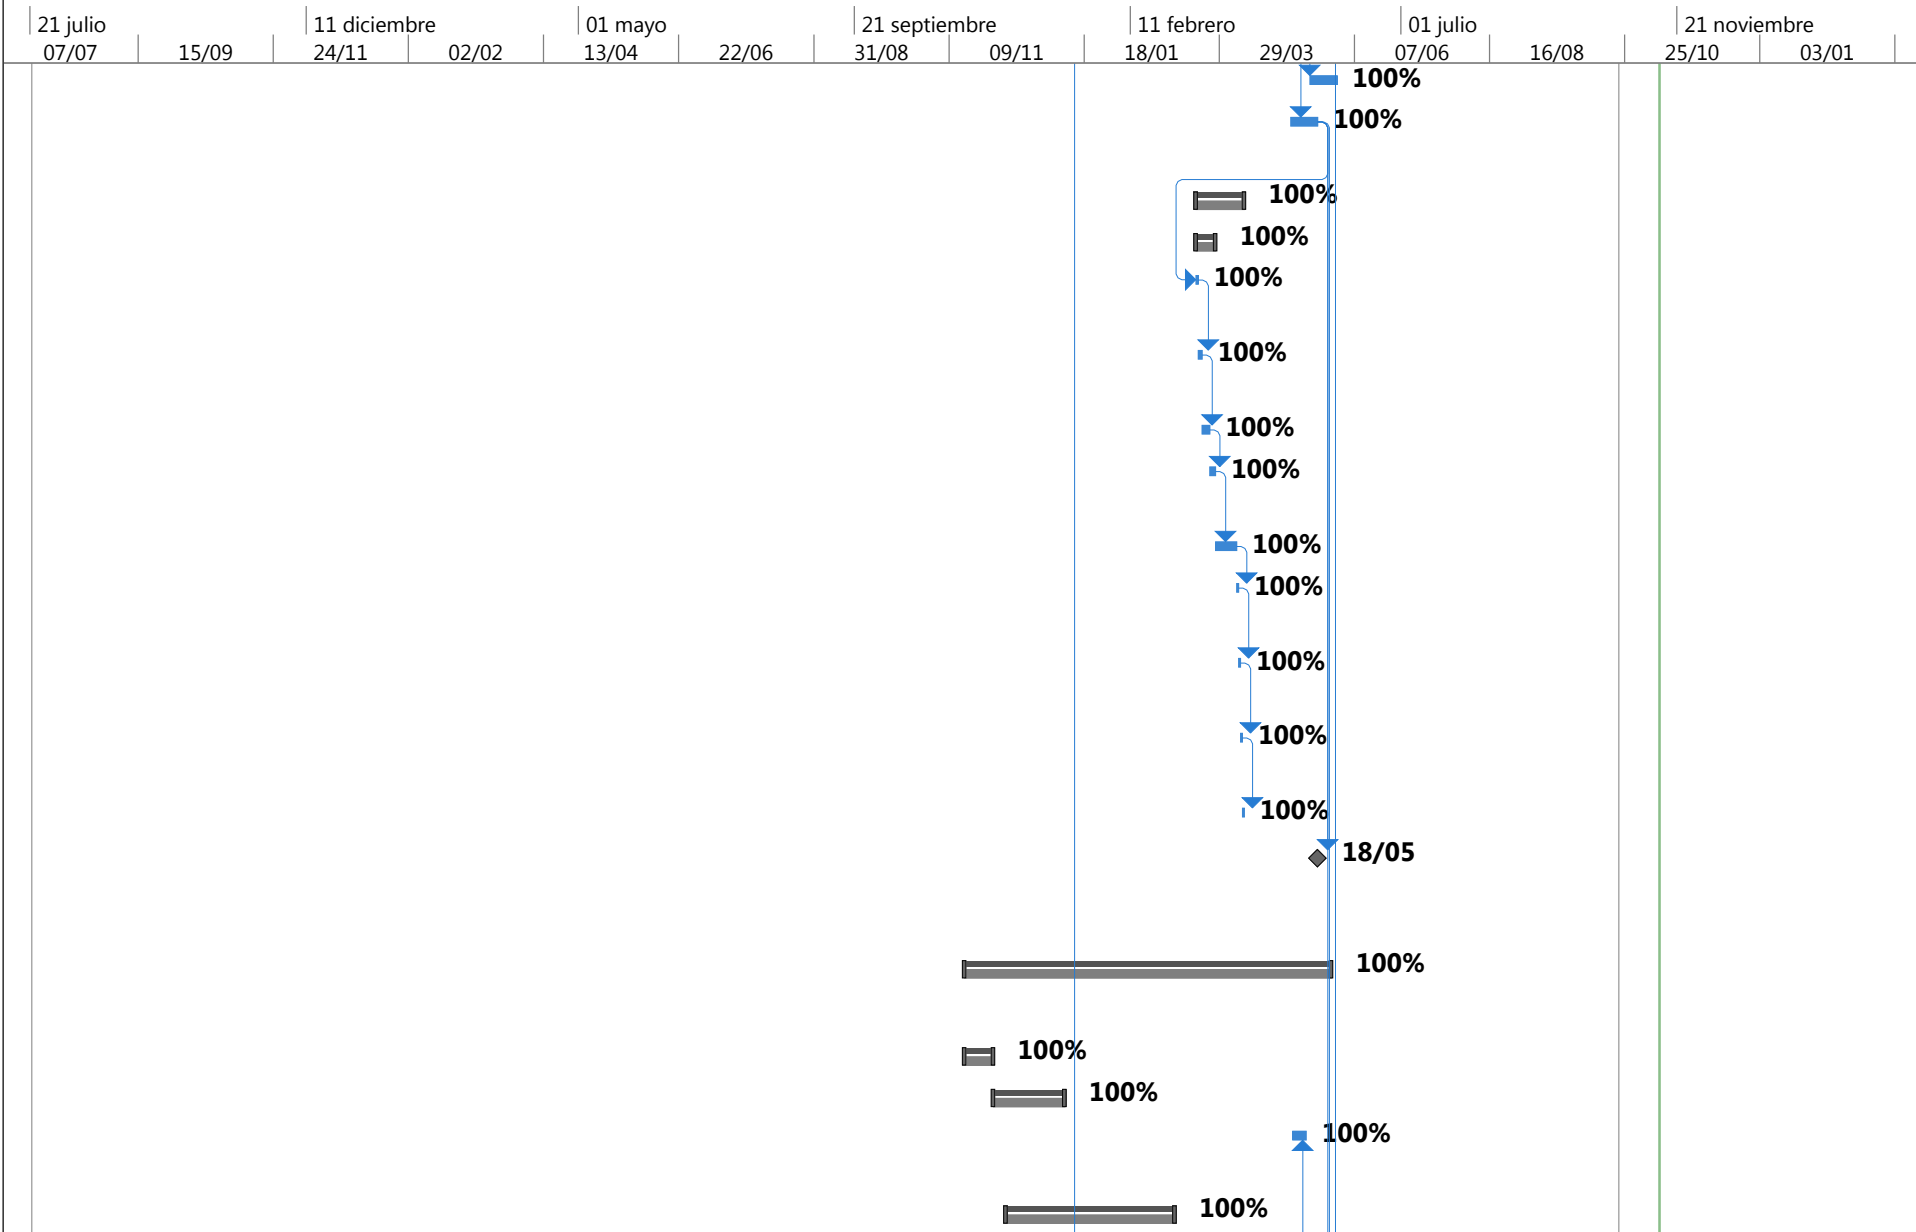

20151021 Declaraciones web

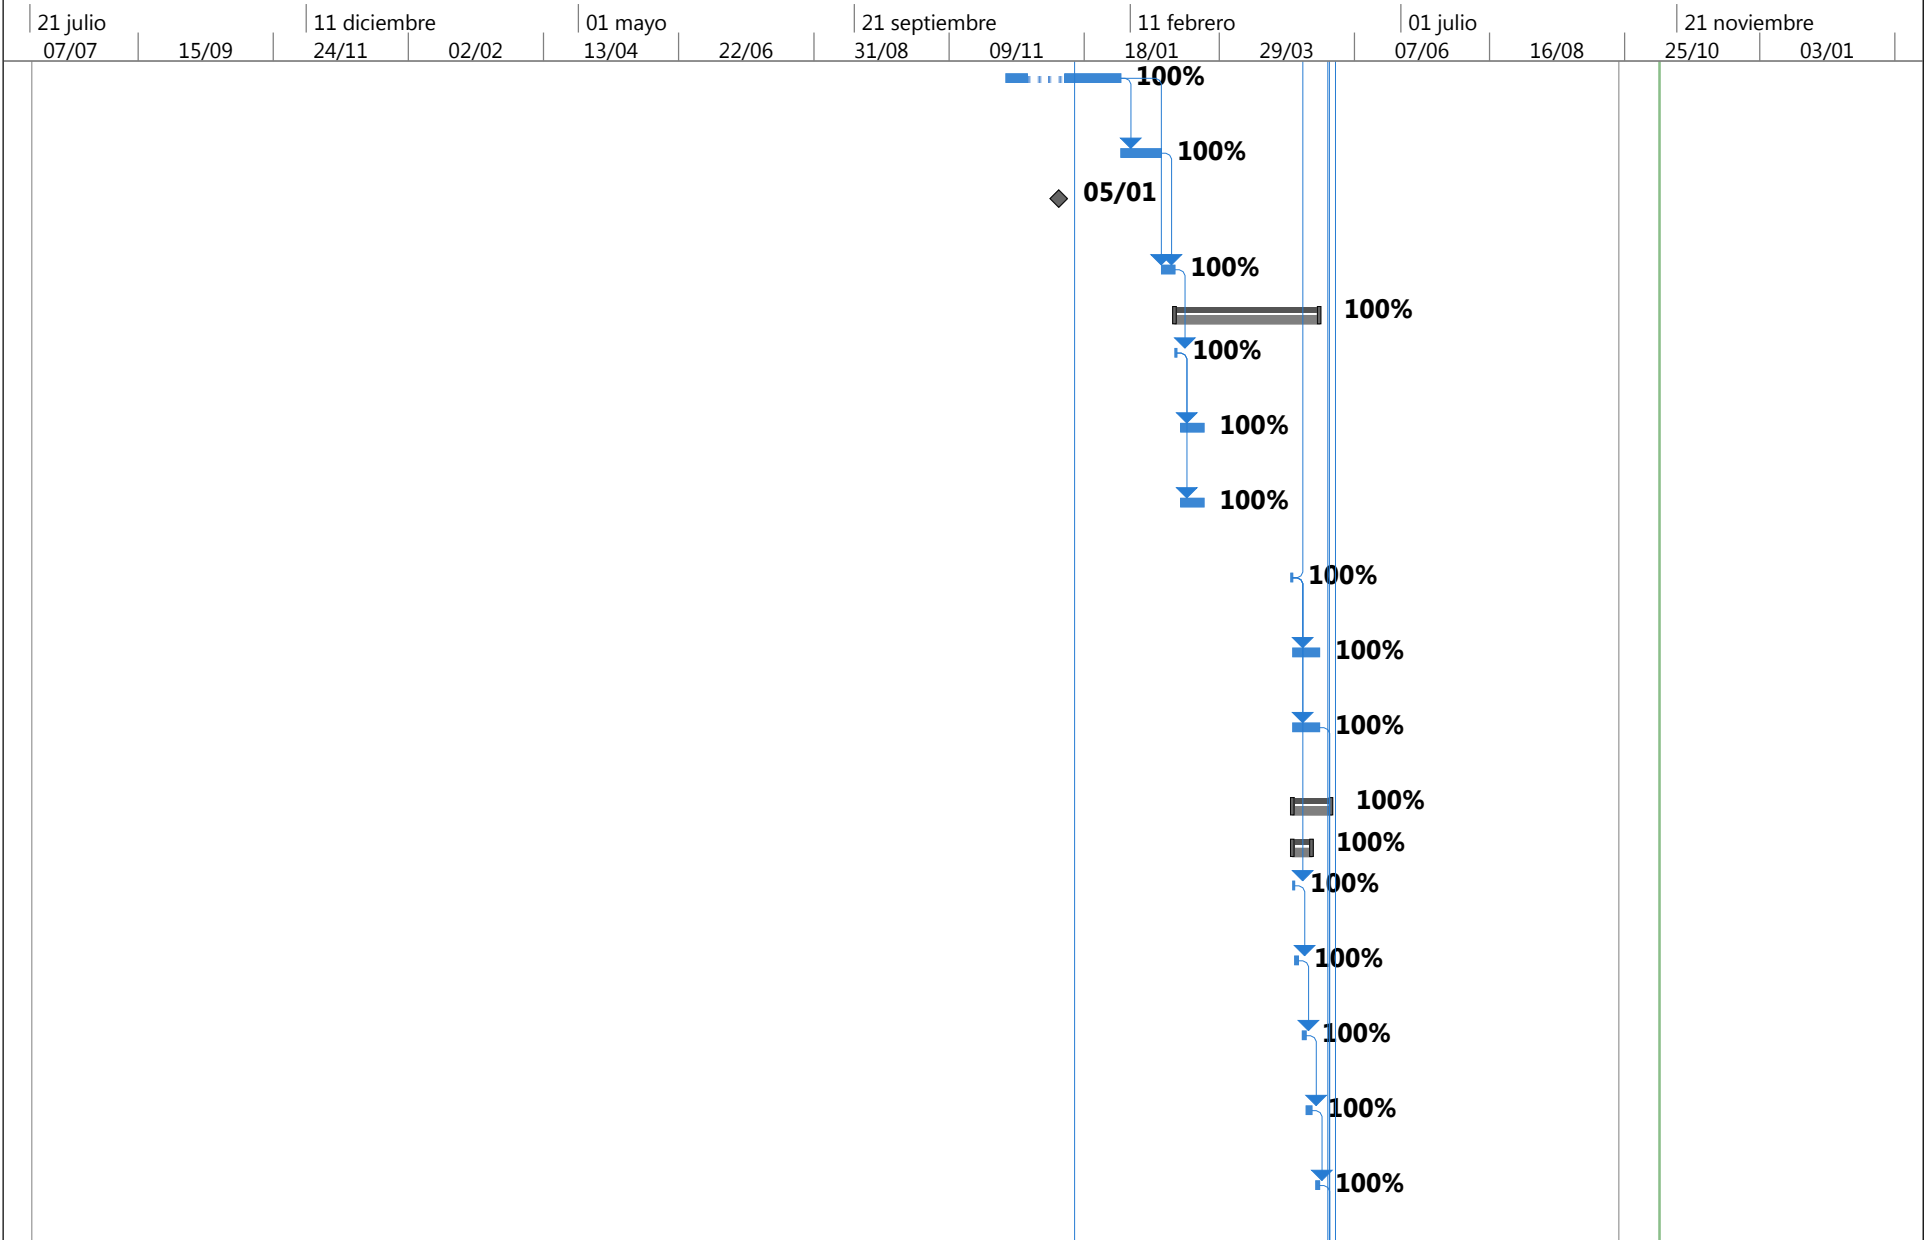

20151021 Declaraciones web

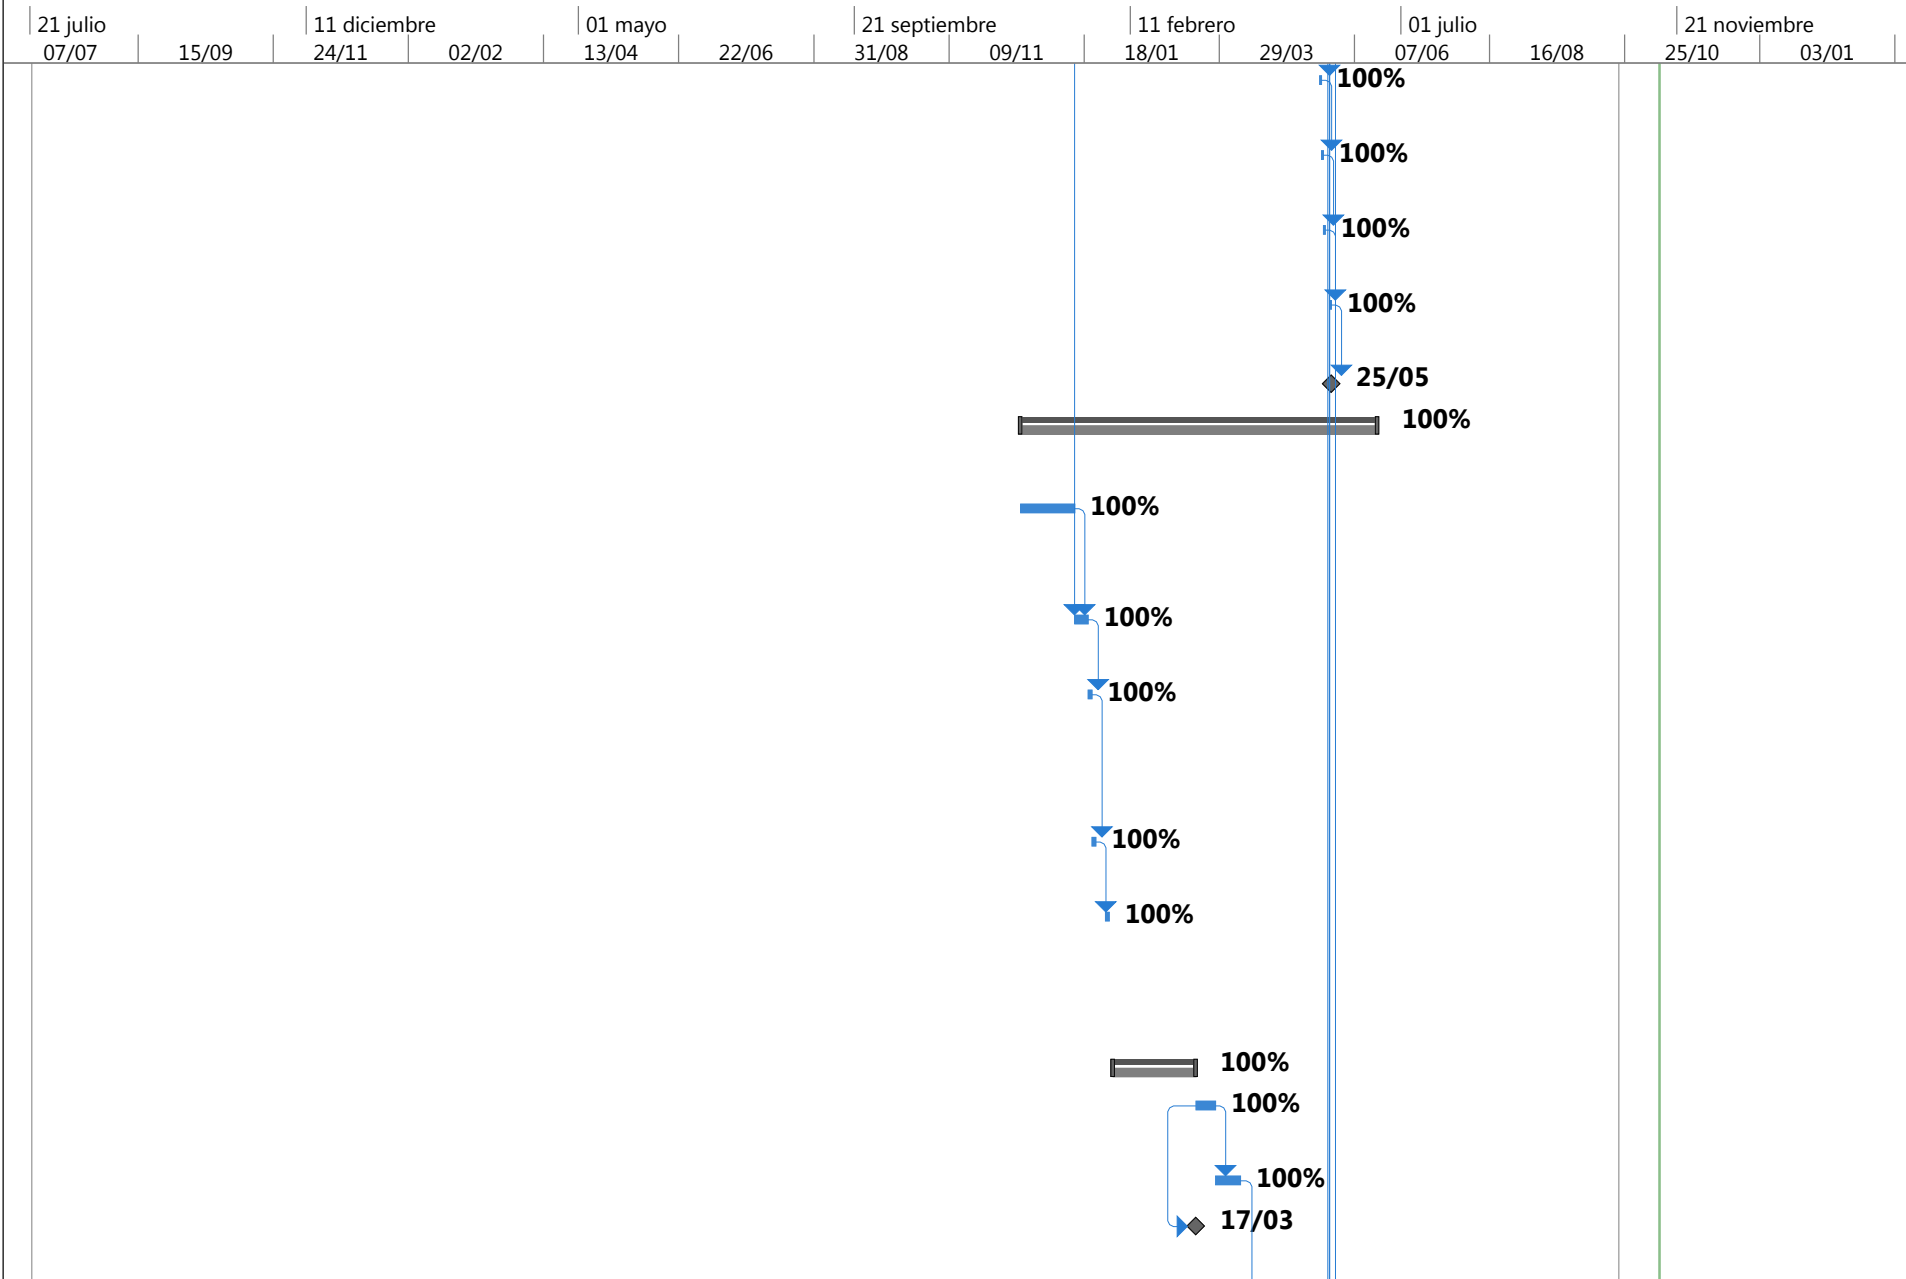

20151021 Declaraciones web

21 julio 07/07 15/09 11 diciembre 24/11 02/02 01 mayo 13/04 22/06 21 septiembre 31/08 09/11 11 febrero 18/01 29/03 01 julio 07/06 16/08 21 noviembre 25/10 03/01

■ 100%

▼ 100%

◆ 17/04

▬ 100%

▬ 100%

■ 100%

▼ 100%

▼ 100%

▼ 100%

▼ 100%

▼ 100%

▼ 100%

▼ 100%


▼ 100%

◆ 09/02

■ 100%

20151021 Declaraciones web

21 julio 07/07	15/09	11 diciembre 24/11	02/02	01 mayo 13/04	22/06	21 septiembre 31/08	09/11	11 febrero 18/01	29/03	01 julio 07/06	16/08	21 noviembre 25/10	03/01
-------------------	-------	-----------------------	-------	------------------	-------	------------------------	-------	---------------------	-------	-------------------	-------	-----------------------	-------




20151021 Declaraciones web


21 julio 07/07	15/09	11 diciembre 24/11	02/02	01 mayo 13/04	22/06	21 septiembre 31/08	09/11	11 febrero 18/01	29/03	01 julio 07/06	16/08	21 noviembre 25/10	03/01
								100%					
								100%					
								100%					
								100%					
								100%					
								100%					
								25/02					
								100%					
								100%					
								100%					
								25/02					
								25/02					
								25/02					
								100%					
								100%					
								100%					

20151021 Declaraciones web


21 julio 07/07 15/09 11 diciembre 24/11 02/02 01 mayo 13/04 22/06 21 septiembre 31/08 09/11 11 febrero 18/01 29/03 01 julio 07/06 16/08 21 noviembre 25/10 03/01

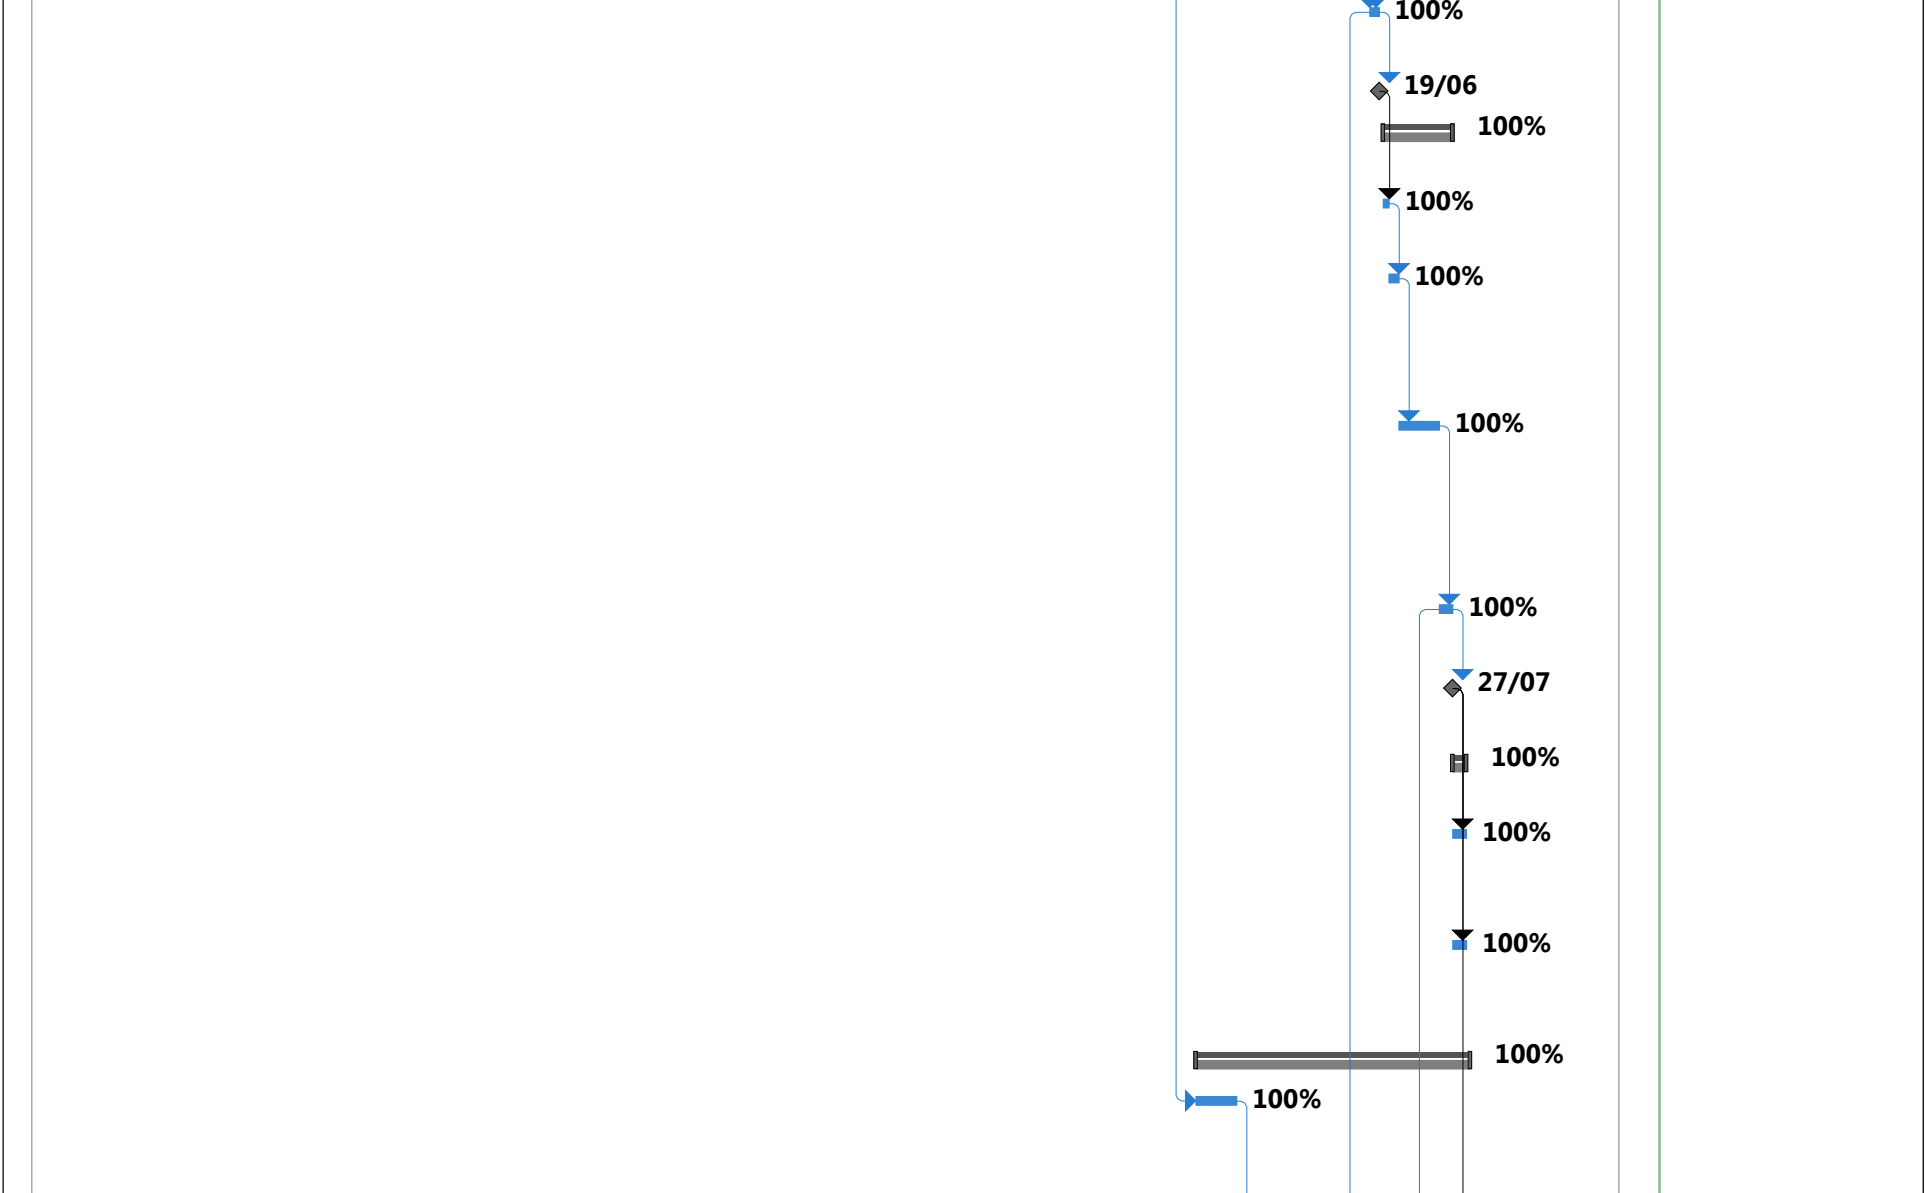

20151021 Declaraciones web




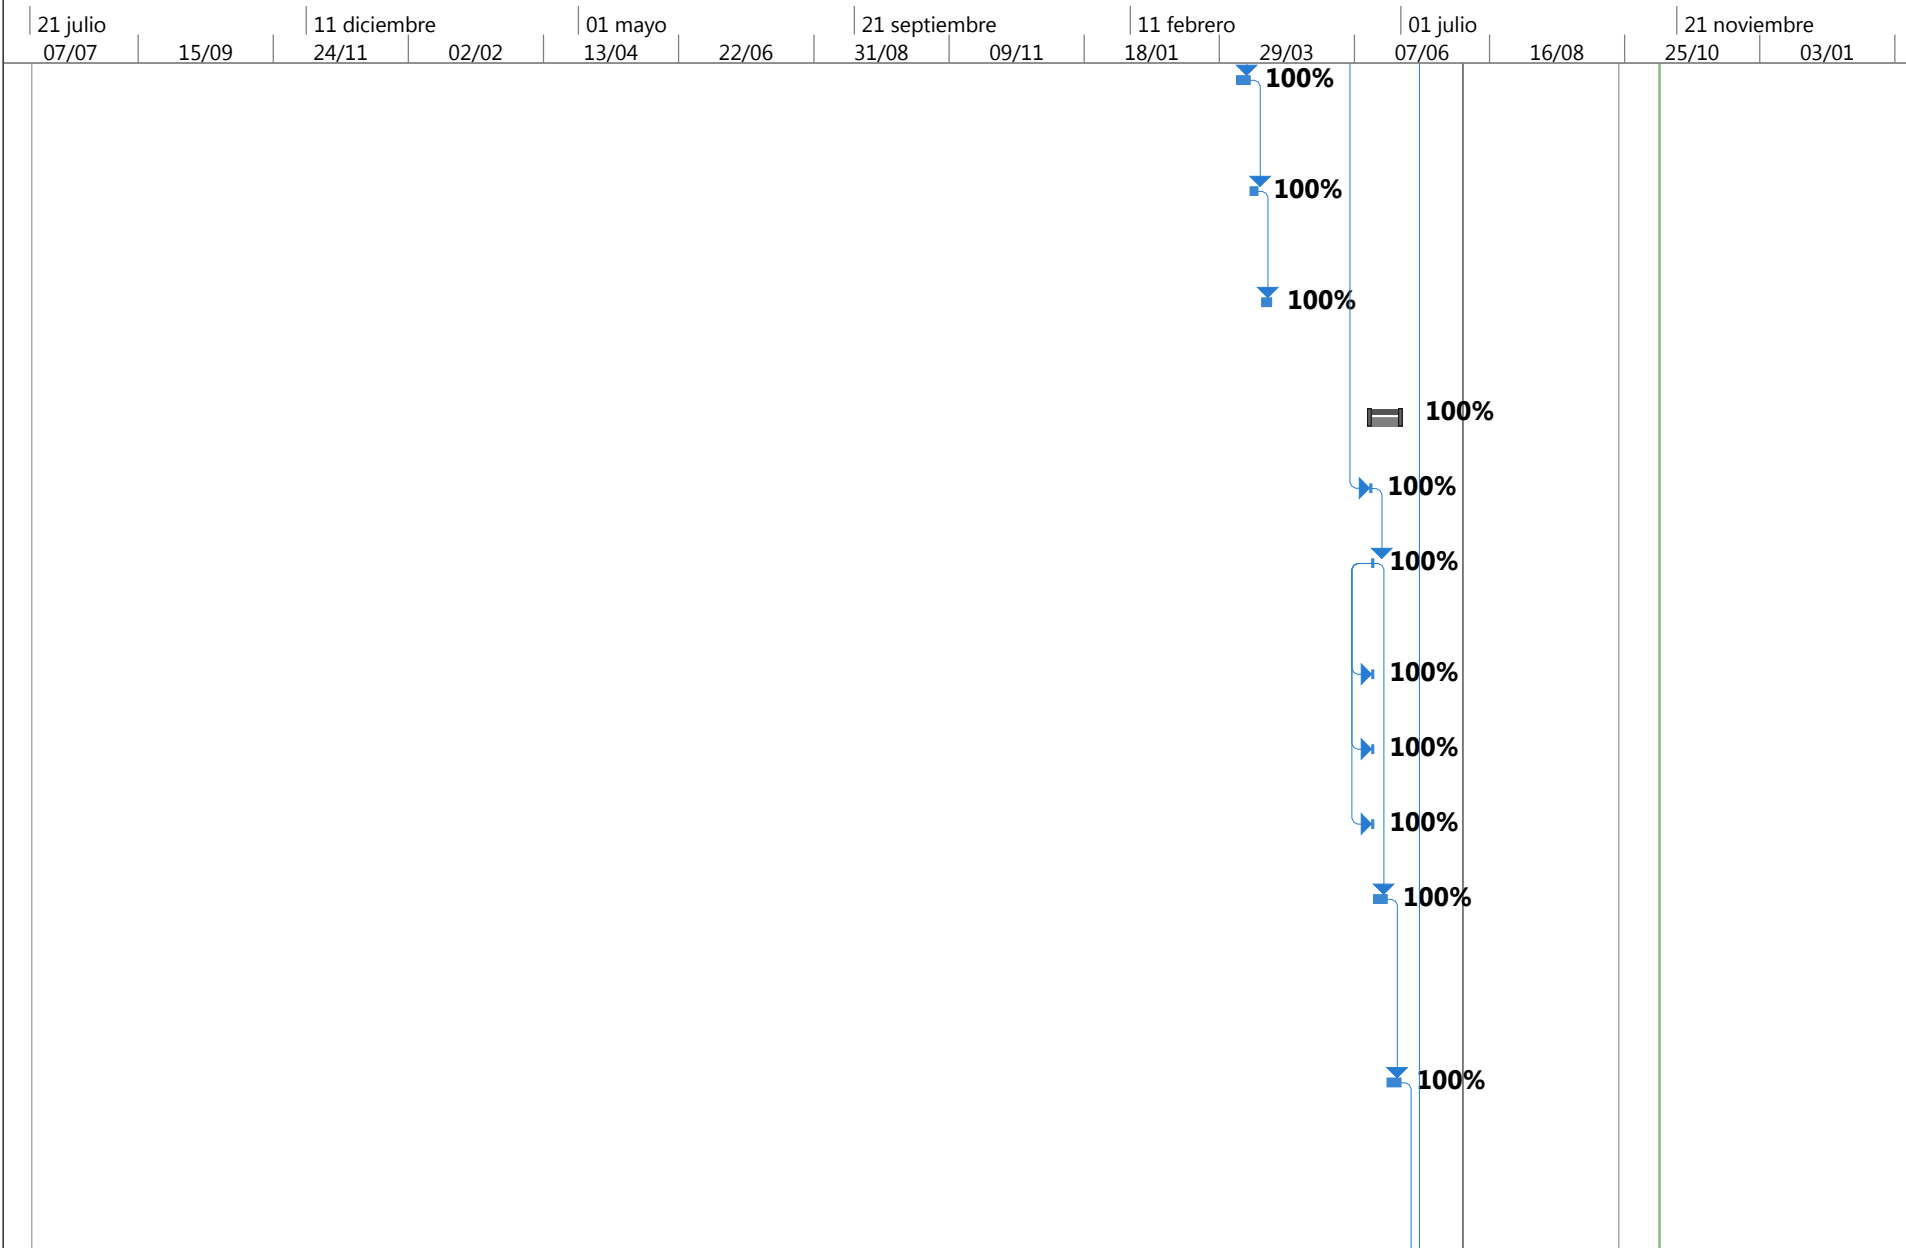


20151021 Declaraciones web

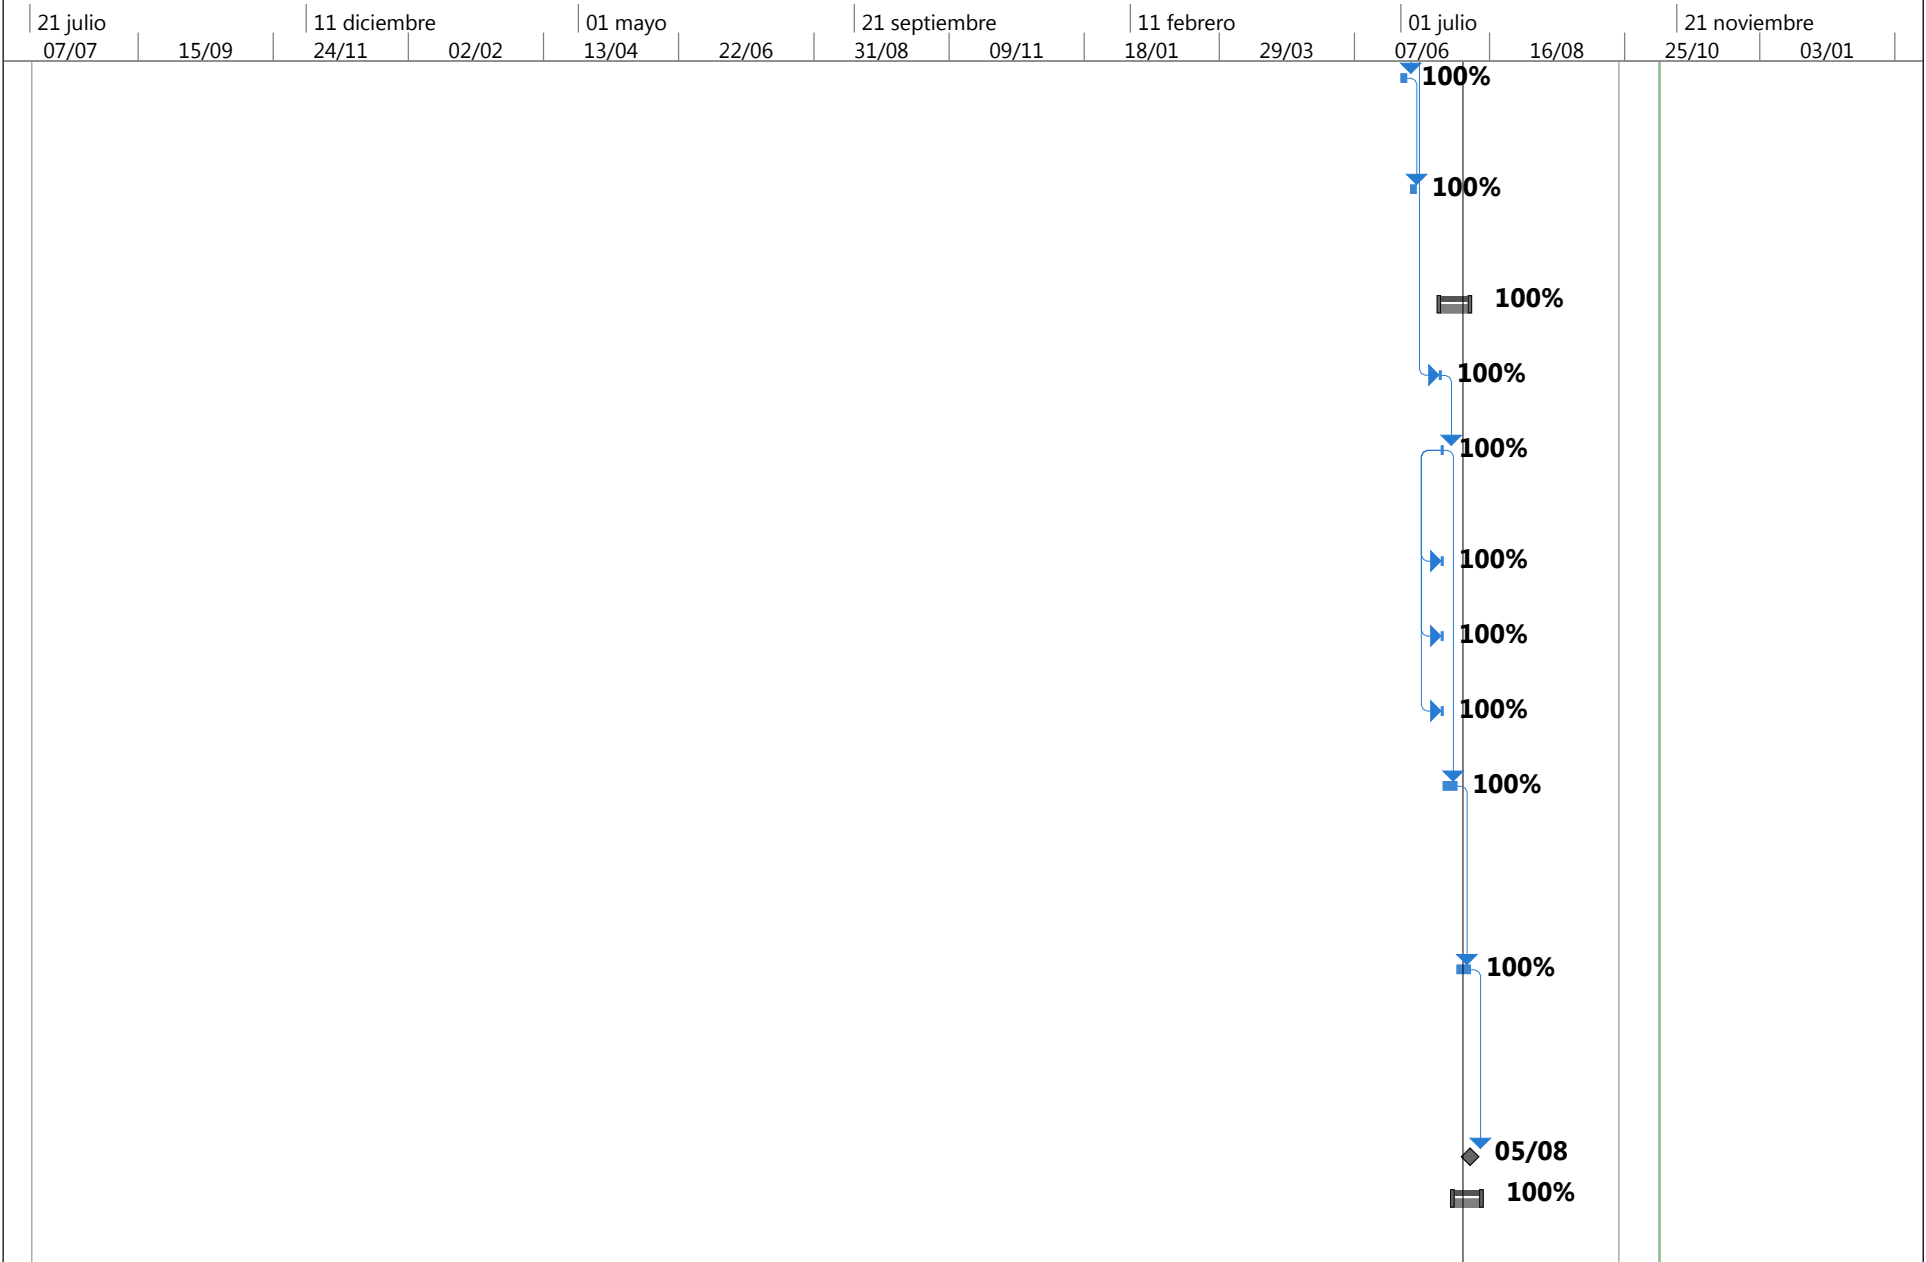


20151021 Declaraciones web

21 julio 07/07 15/09 11 diciembre 24/11 02/02 01 mayo 13/04 22/06 21 septiembre 31/08 09/11 11 febrero 18/01 29/03 01 julio 07/06 16/08 21 noviembre 25/10 03/01



20151021 Declaraciones web

21 julio 07/07	15/09	11 diciembre 24/11	02/02	01 mayo 13/04	22/06	21 septiembre 31/08	09/11	11 febrero 18/01	29/03	01 julio 07/06	16/08	21 noviembre 25/10	03/01
-------------------	-------	-----------------------	-------	------------------	-------	------------------------	-------	---------------------	-------	-------------------	-------	-----------------------	-------



20151021 Declaraciones web

21 julio 07/07	15/09	11 diciembre 24/11	02/02	01 mayo 13/04	22/06	21 septiembre 31/08	09/11	11 febrero 18/01	29/03	01 julio 07/06	16/08	21 noviembre 25/10	03/01
										100%			
										100%			
										100%			
										100%			
										100%			
										100%			
										100%			
										100%			

20151021 Declaraciones web

21 julio 07/07	15/09	11 diciembre 24/11	02/02	01 mayo 13/04	22/06	21 septiembre 31/08	09/11	11 febrero 18/01	29/03	01 julio 07/06	16/08	21 noviembre 25/10	03/01
-------------------	-------	-----------------------	-------	------------------	-------	------------------------	-------	---------------------	-------	-------------------	-------	-----------------------	-------

100%

23/07

100%

100%

100%

100%


100%

28/07

28/07


20151021 Declaraciones web

21 julio 07/07	15/09	11 diciembre 24/11	02/02	01 mayo 13/04	22/06	21 septiembre 31/08	09/11	11 febrero 18/01	29/03	01 julio 07/06	16/08	21 noviembre 25/10	03/01
-------------------	-------	-----------------------	-------	------------------	-------	------------------------	-------	---------------------	-------	-------------------	-------	-----------------------	-------



20151021 Declaraciones web

21 julio 07/07	15/09	11 diciembre 24/11	02/02	01 mayo 13/04	22/06	21 septiembre 31/08	09/11	11 febrero 18/01	29/03	01 julio 07/06	16/08	21 noviembre 25/10	03/01
-------------------	-------	-----------------------	-------	------------------	-------	------------------------	-------	---------------------	-------	-------------------	-------	-----------------------	-------




20151021 Declaraciones web

21 julio 07/07	15/09	11 diciembre 24/11	02/02	01 mayo 13/04	22/06	21 septiembre 31/08	09/11	11 febrero 18/01	29/03	01 julio 07/06	16/08	21 noviembre 25/10	03/01
											100%		
											100%		
											100%		
											27/08		
											100%		
											100%		
											100%		
											100%		
											100%		
											100%		
											100%		
											100%		
											100%		
											100%		
											100%		


20151021 Declaraciones web

21 julio 07/07 15/09 11 diciembre 24/11 02/02 01 mayo 13/04 22/06 21 septiembre 31/08 09/11 11 febrero 18/01 29/03 01 julio 07/06 16/08 21 noviembre 25/10 03/01



20151021 Declaraciones web

21 julio 07/07 | 15/09 | 11 diciembre 24/11 | 02/02 | 01 mayo 13/04 | 22/06 | 21 septiembre 31/08 | 09/11 | 11 febrero 18/01 | 29/03 | 01 julio 07/06 | 16/08 | 21 noviembre 25/10 | 03/01

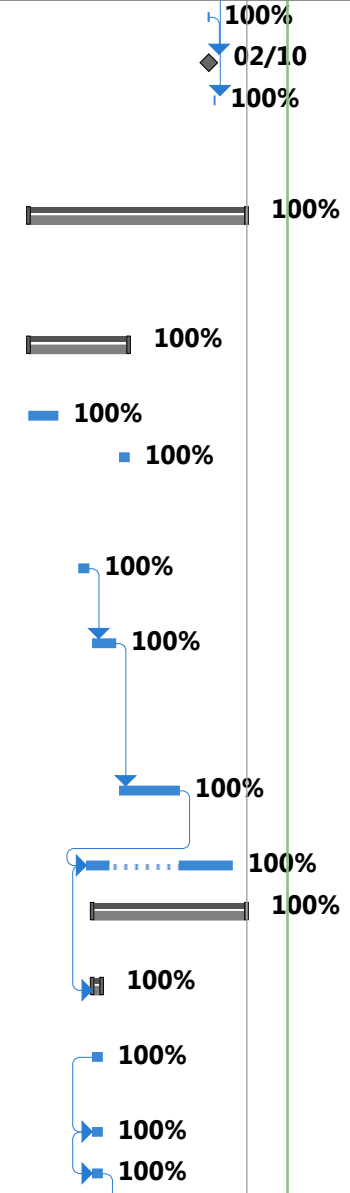

20151021 Declaraciones web

21 julio 07/07	15/09	11 diciembre 24/11	02/02	01 mayo 13/04	22/06	21 septiembre 31/08	09/11	11 febrero 18/01	29/03	01 julio 07/06	16/08	21 noviembre 25/10	03/01
-------------------	-------	-----------------------	-------	------------------	-------	------------------------	-------	---------------------	-------	-------------------	-------	-----------------------	-------

